



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 391,351.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-19-08
FECHA: 15 DE ENERO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)"
UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) 2019

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 15,087.42	\$ 15,087.42	
02	CIMENTACION	1	LOTE	\$ 105,882.48	\$ 105,882.48	
03	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$ 195,390.40	\$ 195,390.40	
	TABLEROS Y PINTURA	1	LOTE	\$ 74,990.69	\$ 74,990.69	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 391,351.00	
						FINIQUITO \$337,371.55
						IVA 16% \$53,979.45
						SUBTOTAL \$391,351.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 117,405.30	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 117,405.30	ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 391,351.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	SALDO POR EJERCER	\$ -

ABO. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JULIO ARMANDO BORIANO SOLIS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO

PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 391,351.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIS-19-08

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2020

HOJA 2 DE 6

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)"

UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) 2019

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	m2	660.00	660.00	0.00	660.00	\$ 11.60	\$ -	\$ 15,087.42
01-PRE-007	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	22.88	22.88	0.00	22.88	\$ 324.80	\$ -	\$ 7,431.42
02	CIMENTACION								
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.	m2	57.20	57.20	0.00	57.20	\$ 121.80	\$ -	\$ 6,966.96
02-CIM-016	MAMPOSTERÍA EN CIMENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.50 A 1.00 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYENDO PIEDRA DE CANTERA ROSTREADA DONDE LO REQUIERA.	m3	49.06	49.06	0.00	49.06	\$ 1,392.00	\$ -	\$ 68,291.52
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	165.00	165.00	0.00	165.00	\$ 185.60	\$ -	\$ 30,624.00
03	ALBAÑILERIA								
03-ALB-006	PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO DE 200MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSLDADA 6-11010, ACABADO PULIDO.	m2	660.00	660.00	0.00	660.00	\$ 272.60	\$ -	\$ 179,916.00
03-ALB-071	FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO F'C=200KGS/CM2 DE 0.10 CMS DE ESPESOR DE RAMPA, ESCALON DE 0.15 CMS DE PERALTE Y 0.30 CMS DE HUELLA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ml	46.00	46.00	0.00	46.00	\$ 336.40	\$ -	\$ 15,474.40
	TABLEROS Y PINTURA								
05-ACAB-024	PINTURA PARA MARCAR LINEAS REGLAMENTARIAS DE JUEGO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ml	414.19	414.19	0.00	414.19	\$ 40.60	\$ -	\$ 16,816.11
19-E-ACERO-024	TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" Y PORTERÍA PARA FUTBOL A BASE DE TUBO DE 3" PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 29,087.29	\$ -	\$ 58,174.58
							\$	-	\$ 391,351.00



ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



C. JULIO ARMANDITO SORIANO SOLÍS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

SUMA HOJA No. 01

\$ - \$ 391,351.00

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 6	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)" UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) 2019						
	PERÍODO:	23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020									
	MONTO CONTRATADO: \$		391,351.00								
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-19-08									
	FECHA:	15 DE ENERO DEL 2020									
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PREZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-4	A-D	TYN	30.00	22.00			660.00	660.00	m2
									TOTA	660.00	m2
01-PRE-007	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4	A-D	EXC	104.00	0.55	0.40		22.88	22.88	m3
									TOTA	22.88	m3
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA	1-4	A-D	PLAN	104.00	0.55			57.20	57.20	m2
									TOTA	57.20	m2
02-CIM-016	MAMPOSTERÍA EN CIMENTO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.50 A 1.00 M3/ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1-4, INCLUYENDO PIEDRA DE CANTERA ROSTREADA DONDE LO REQUIERA.	1-4	A-D	MAMP	104.00	0.55	0.86		49.06	49.06	m2
									TOTA	49.06	m2
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-4	A-D	RELLENO	30.00	22.00	0.25		165.00	165.00	m3
									TOTA	165.00	m3
03-ALB-006	PISO FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO DE 200MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSLDADA 6-1010, ACABADO PULIDO	1-4		PISO	30.00	22.00			660.00	660.00	m2
									TOTA	660.00	m2
03-ALB-071	FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO F'C=200KGS/CM2 DE 0.10 CMS DE ESPESOR DE RAMPA, ESCALON DE 0.15 CMS DE PERALTE Y 0.30 CMS DE HUELLA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-4		FORJADO	46.00				46.00	46.00	ml
									TOTA	46.00	ml
05-ACAB-024	PINTURA PARA MARCAR LÍNEAS REGLAMENTARIAS DE JUEGO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1-4	A-D	PINTURA	414.19				414.19	414.19	ml
									TOTA	414.19	ml
19-E-ACERO-024	TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" Y PORTERÍA PARA FUTBOL A BASE DE TUBO DE 3" PARA ESTRUCTURA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1-4	A-D	TABLERO				2.00	2.00	2.00	pza
									TOTA	2.00	pza


 L. C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 C. JULIO ARMANDO BORJANO SOLIS
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 391,351.00
No. DE CONTRATO: MSO-DD5-FIV-INF-BASIC-19-08
FECHA: 15 DE ENERO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)"
UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) 2019

CROQUIS DE OBRA

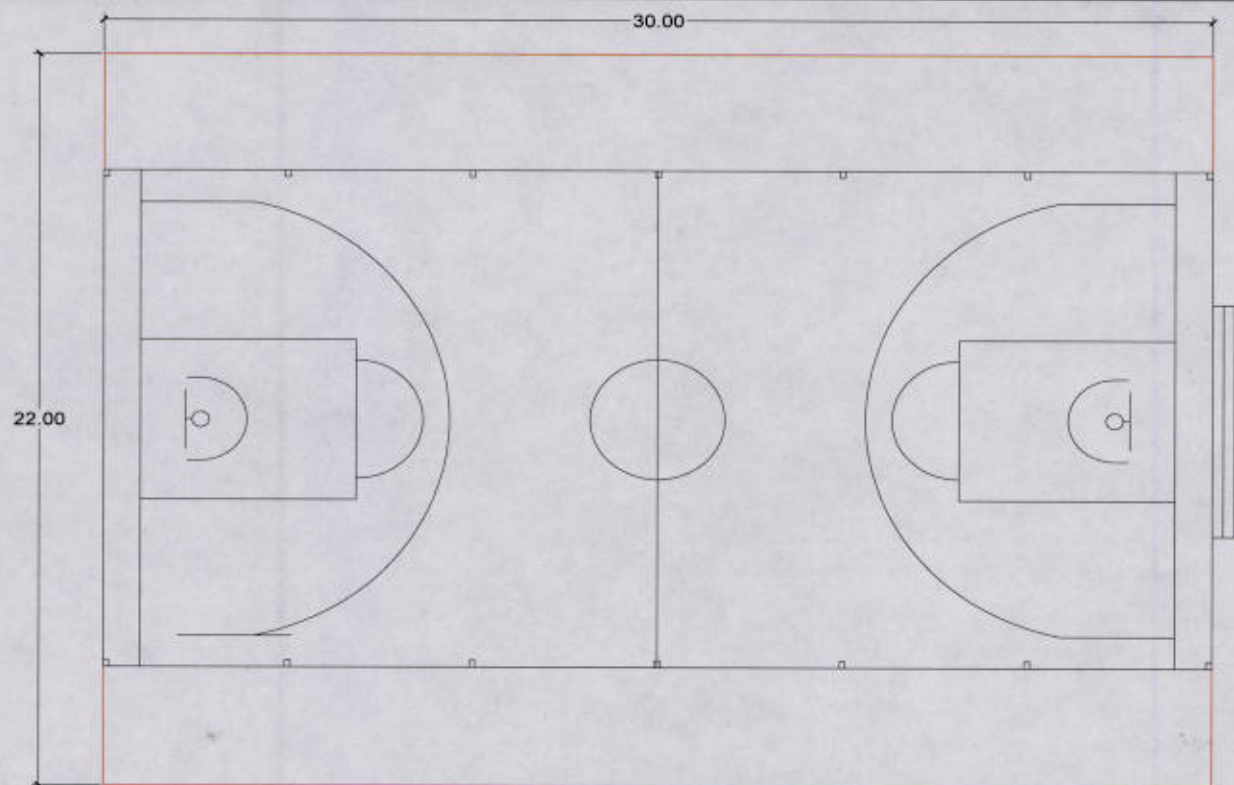

ARQ. JORGE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 6

PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 391,351.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-19-08

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)"

UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)
2019

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARCE J. RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION






ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 6
PERIODO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE ENERO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 391,351.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-19-08
FECHA: 15 DE ENERO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA)"
UBICACIÓN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

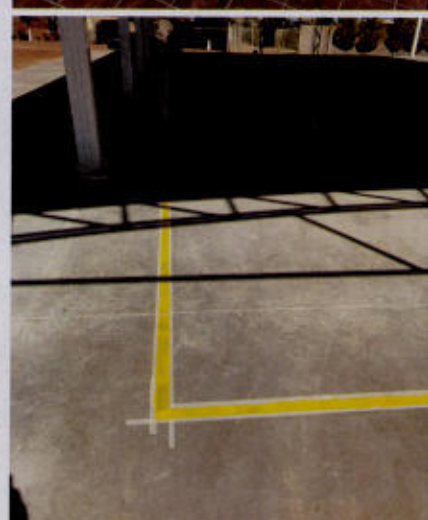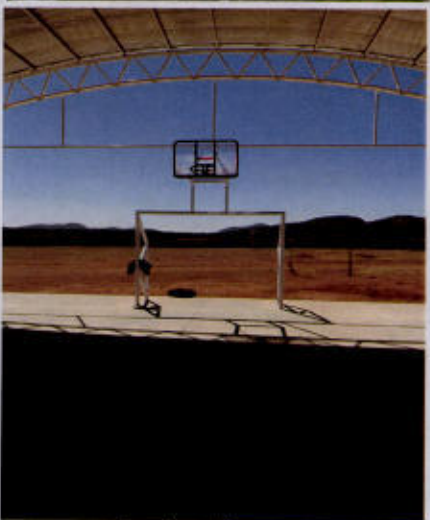


APC. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
