



 SOMBRERETE MUNICIPIO DE SAN CARLOS	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 1 DE 8	RESUMEN DE FINIQUITO			OBRA: "CONSTRUCCION DE 08 BAÑOS ECOLOGICOS"	
	PERIODO: 25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020						UBICACIÓN: SALAS PEREZ
	MONTO CONTRATADO: \$ 437,121.96						MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO: MSO-DOS-SOM-FAIS-26-VDIGNA-001						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2020							

CARATULA DE ESTIMACIÓN						
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$13,006.48	\$13,006.48	
02	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$134,817.06	\$134,817.06	
03	ACABADOS	1	LOTE	\$86,563.84	\$86,563.84	
04	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	1	LOTE	\$15,519.40	\$15,519.40	
05	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	\$6,032.00	\$6,032.00	
06	MUEBLES DE BAÑO Y EQUIPO	1	LOTE	\$11,638.40	\$11,638.40	
07	ALUMINIO	1	LOTE	\$12,962.00	\$12,962.00	
08	HERRERIA	1	LOTE	\$49,184.00	\$49,184.00	
09	OBRAS EXTERIORES	1	LOTE	\$6,369.79	\$6,369.79	
TOTAL DE FINIQUITO					\$437,121.96	

FINIQUITO		\$375,829.20
IVA 16%		\$60,292.00
SUBTOTAL		\$437,121.96
DEDUCCIONES		
AMORT. DE ANTICIPO		\$0.00
TOTAL		\$437,121.96
SUBTOTAL		\$0.00
IVA 16%		\$0.00
TOTAL		\$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$	181,136.59	N/A	N/A	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	181,136.59	AMORT. A LA FECHA		ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 437,121.96
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$		AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN		ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	-\$	0.00	POR AMORTIZAR		SALDO POR EJERCER	\$

 ARC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIDOMA CEDEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 DANIEL MANCILLAS DOZAL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
---	---	--

000143

		ESTIMACIÓN	FINIQUITO	HOJA 2 DE 2	RESUMEN DE FINIQUITO			OBRA					
PERIODO:		25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020						UBICACIÓN					
MONTO CONTRATADO:		\$ 437,121.96						MUNICIPIO					
NÚM. DE CONTRATO:		MSO-DOS-SOM-FAIS-20-VOIGNA-001						PROGRAMA					
FECHA:		17 DE AGOSTO DEL 2020						FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020					
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN													
CLAVE	CONCEPTO				UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	
01. PRELIMINARES													
01-PRE-002	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. INCLUYE ARPE DE MATERIAL.				m2	33.28	33.28	0.00	33.28	\$ 18.96	\$	\$ 617.88	
01-PRE-003	EXCAVACIÓN EN CADA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 415 D. DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE OPERADOR, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				m3	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 510.20	\$	\$ 12,382.80	
TOTAL DE PRELIMINARES											\$	-	\$ 13,000.68
03. ALBANILERIA													
03-ALB-001	CASTILLO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN SECCIÓN 15X15 CM Y ESPESOR 1/4 ARMEX. INCLUYE CUBRIR MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				m2	96.00	96.00	0.00	96.00	\$ 290.00	\$	\$ 27,840.00	
03-ALB-002	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X20 X40 CM. ASENTADO MEZCLA CON MORTERO ARENA DE 1:2. JUNTAS DE 1.50CM DE ESPESOR ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				m2	134.00	134.00	0.00	134.00	\$ 406.00	\$	\$ 54,404.00	
03-ALB-004	LONA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO H.D. FC-200 KG/CM2. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8-1010. INCLUYE VOLADO DE 10 CM CON GOTERO.				m2	33.28	33.28	0.00	33.28	\$ 988.00	\$	\$ 32,814.08	
03-ALB-005	CONSTRUCCIÓN DE PRETA A BASE DE TABIQUE CON MEDIDAS 12X14X28 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:2. JUNTAS DE 1.50 CMS DE ESPESOR. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.				m2	63.36	63.36	0.00	63.36	\$ 98.00	\$	\$ 6,247.30	
03-ALB-006	PISO FIRME DE CONCRETO FC-200 KG/CM2. AGREGADO DE 200MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8-1010. ACABADO PULIDO.				m2	33.28	33.28	0.00	33.28	\$ 438.00	\$	\$ 14,611.84	
TOTAL DE ALBANILERIA											\$	-	\$ 134,817.96
05. ACABADOS													
05-ACAB-001	APLANADO EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR). A PLOMBO Y REGLA. ACABADO FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR. HASTA UNA ALTURA DE 3 M.				m2	268.00	268.00	0.00	268.00	\$ 162.40	\$	\$ 43,523.20	
05-ACAB-002	PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR) Y PLAFON. A DOS MANOS MARCA BEREL O COMEX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.				m2	268.00	268.00	0.00	268.00	\$ 69.80	\$	\$ 18,682.80	
05-ACAB-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE SECCION 20X30 CMS. DE PRIMERA CALIDAD.				m2	52.56	52.56	0.00	52.56	\$ 464.00	\$	\$ 24,387.84	
TOTAL DE ACABADOS											\$	-	\$ 86,593.84
07. INSTALACIÓN SANITARIA E HIDRAULICA													
07-HID-SAN-001	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO PVC DE 4" PARA DESCARGA. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				sai	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 324.80	\$	\$ 2,598.40	
07-HID-SAN-002	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE 2" PARA DESCARGA. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				sai	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 232.00	\$	\$ 1,856.00	
07-HID-SAN-003	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBO DE 2" PARA DESCARGA. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				sai	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 290.00	\$	\$ 2,320.00	
07-HID-SAN-004	SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO PLUS DE 1/2". INCLUYE LLAVES ANGULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				sai	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 406.00	\$	\$ 3,248.00	
07-HID-SAN-005	SALIDA HIDRAULICA LAVABO Y/O REGADERA CON TUBO PLUS DE 1/2". INCLUYE LLAVES ANGULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				sai	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 406.00	\$	\$ 6,496.00	
INSTALACIÓN SANITARIA E HIDRAULICA											\$	-	\$ 16,518.40
SUMA HOJA No. 01											\$	-	\$ 250,905.77

0000144

ARQ. JUAN JOSÉ ANTONIO
RESIDENTE DE OBRA

L. S. C. J. A. VIEDMA DECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
DOCA
C. DANIEL MANCILLAS DOCA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

		ESTIMACIÓN	FINIQUITO	HOJA 3 DE 8	RESUMEN DE FINIQUITO			OBRA					
PERIODO:		25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020						"CONSTRUCCIÓN DE 08 BAÑOS ECOLOGICOS"					
MONTIO CONTRATADO:		\$ 437,121.96						UBICACIÓN: SALAS PEREZ					
NÚM. DE CONTRATO:		MSO-005-SOM-FAIS-20-VDRIANA-001						MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					
FECHA:		17 DE AGOSTO DEL 2020						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 2020					
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN													
CLAVE	CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO			
06	INSTALACION ELECTRICA												
06-ELE-002	SALIDA CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO. INCLUYE TAPA, CAJA REGISTRO, CABLE CAL 12, BOQUET DE PORCELANA		sal	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 154.00	\$	\$ 6,032.00			
TOTAL INSTALACION ELECTRICA								\$	-	\$ 6,032.00			
10	MUEBLES DE BAÑOS Y EQUIPO												
10-M-BAÑ-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.O. EN COLOR BLANCO		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 1,508.00	\$	\$ 12,064.00			
10-M-BAÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN COLOR BLANCO. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 1,136.80	\$	\$ 9,054.40			
10-M-BAÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA. INCLUYE BRAZO, CHAPETON, LLAVE MEZCLADORA		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 754.00	\$	\$ 6,032.00			
10-M-BAÑ-005	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE FINADO DE CAP. 450 LTS. INCLUYE ACCESORIOS		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 3,246.00	\$	\$ 25,984.00			
10-M-BAÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER SOLAR DE CAP. (120 LTS) 10 TUBOS		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 7,308.00	\$	\$ 58,464.00			
TOTAL MUEBLES DE BAÑOS Y EQUIPO								\$	-	\$ 113,638.40			
08	ALUMINIO												
08-ALU-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 60 X 40 CMS. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 1,624.00	\$	\$ 12,992.00			
TOTAL ALUMINIO								\$	-	\$ 12,992.00			
09	HERRERIA												
09-HERR-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FINADO A BASE DE PERFIL, PIR CAL. 14 DE 1-1/2" X 1-1/2" EN MEDIDA DE 1.00 X 1.20 X 1.20. INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS.		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 1,742.00	\$	\$ 13,936.00			
09-HERR-006	PLACA ALUSIVA POR BAÑO CONSTRUIDO		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 696.00	\$	\$ 5,568.00			
09-HERR-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA DE 80 CMS CON MARCO METALICO. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		228	8.00	8.00	8.00	8.00	\$ 3,712.00	\$	\$ 29,696.00			
TOTAL DE HERRERIA								\$	-	\$ 49,199.00			
11	CERAS EXTERIORES												
11-O-EXT-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRITON BLANCO 5 AÑOS DE GARANTIA EN 2 CAPAS Y MEMBRANA DE REFORZO		m2	33.28	33.2800	3.0000	33.28	\$ 191.40	\$	\$ 6,369.79			
TOTAL DE ALBANILERIA								\$	-	\$ 6,369.79			
SUMA HOJA No. 02								\$	-	\$ 186,216.19			
TOTAL DE FINIQUITO								\$	-	\$ 437,121.96			

000145

MR. ROBERTO RIVERA AGOSTA
RESPONSABLE DE OBRA

L.S.C. JAIMÉ ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniela Mancilla
Dozal
C. DANIEL MANCILLAS DOZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTADO DE SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: 01 DE MAYO DEL 2009 AL 30 DE JUNIO DEL 2009
MONTO CONTRATADO: \$ 1,171,121.96
NÚMERO DE LICITACIÓN: MSO-005-SOM-449-01-VI/09-003
FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2009

\$17,121.96

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 06 BAÑOS PÚBLICOS
UBICACIÓN: SALAS PEREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	Nº. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-002	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO INCLUYE APICE DE MATERIAL	1-2	A-B	TRAJO	2.60	1.60		8.00	33.28	33.28	m2
01-PRE-003	EXCAVACIÓN EN CADA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D1 DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE OPERADOR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B	EXCAV					24.00	24.00	m3
03-ALB-001	CASILLERO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN SECCION 15X15 CM Y ESPESOR 1M ARMEX INCLUYE CIMBRA MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	CASILLERO					96.00	96.00	m3
03-ALB-002	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X20 X40 CM ASENTADO MEZCLA CON MORTERO ARENA DE 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	MURO					134.00	134.00	m2
03-ALB-004	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO H-0 FC-200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 INCLUYE VOLADO DE 10 CM CON GOTEROL	1-2	A-B	LOSA	2.60	1.60		8.00	33.28	33.28	m2
03-ALB-005	CONSTRUCCIÓN DE PRETIL A BASE DE TAPIQUE CON MEDIDAS 12X14X28 CMS ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.50 CMS DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS	1-2	A-B	PRETIL	7.92			8.00	63.36	63.36	m3
03-ALB-006	PISO FIRME DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 AGREGADO DE 200MM ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 ACABADO PLUIDO	1-2	A-B	PISO	2.50	1.60		8.00	33.28	33.28	m2
05-ACA-001	APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3 M	1-2	A-B	APLANADO					268.00	268.00	m2
05-ACA-002	PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR Y PLAFON A DOS MANOS MARCA BEREL O COMEX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M	1-2	A-B	PINTURA					268.00	268.00	m2
05-ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE SECCION 20X30 CMS DE PRIMERA CALIDAD	1-2	A-B	AZULEJO					52.56	52.56	m2
07-HID-SAN-001	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO PVC DE 4" PARA DESCARGA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	SAN W.C.				8.00	8.00	8.00	sal
07-HID-SAN-002	SALIDA SANITARIA PARA COLUCCI A BASE DE TUBO DE 2" PARA DESCARGA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	SAN COLUCCI				8.00	8.00	8.00	sal
07-HID-SAN-003	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBO DE 2" PARA DESCARGA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	SAN LAVABO				8.00	8.00	8.00	sal
07-HID-SAN-004	SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO PLUS DE 1/2" INCLUYE LLAVES ANGULARES MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	HID W.C.				8.00	8.00	8.00	sal
07-HID-SAN-005	SALIDA HIDRAULICA LAVABO Y/O REGADERA CON TUBO PLUS DE 1/2" INCLUYE LLAVES ANGULARES MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	HID LAVABO				16.00	16.00	16.00	sal
				TOTAL					16.00	16.00	sal

[Firma]
JUAN CARLOS BARRERA
PRESIDENTE DE OBRA

[Firma]
JUAN CARLOS BARRERA
PRESIDENTE DE OBRA

[Firma]
DANIEL MARCILLAS
DORON
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000145

		ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 437,121.96 NO. DE CONTRATO: 17 DE AGOSTO DEL 2020		HOJA 5 DE 9 RESUMEN DE FINIQUITO			OBRA: CONSTRUCCION DE 08 BAÑOS ESCUELEROS UBICACIÓN: SALAS PEREZ MUNICIPIO: SAN MATEO P.T., CAL. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020				
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
06-ELE-002	SALIDA CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO. INCLUYE TAPA, CAJA REG-STRD, CABLE CAL 12, SOQUET DE PORCELANA.	1-2	A-B	5. CENT				8.00	8.00	8.00	sq
TOTA									8.00		sq
10-M-BAÑ-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN COLOR BLANCO.	1-2	A-B	W/C				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
10-M-BAÑ-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN COLOR BLANCO. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA.	1-2	A-B	LAVABO				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
10-M-BAÑ-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA. INCLUYE BRAZO, CHAPETON, LLAVE MEZCLADORA.	1-2	A-B	REGADERA				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
10-M-BAÑ-005	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TINACO DE CAP. 450 LIT. INCLUYE ACCESORIOS.	1-2	A-B	TINACO				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
10-M-BAÑ-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER SOLAR DE CAP. (120 LIT.) 10 TUBOS.	1-2	A-B	BOILER				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
06-ALU-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 60 X 45 CMS. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	VENTANA				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
09-HERR-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACO A BASE DE PERFIL PTR CAL. 14 DE 1 1/2" X 1 1/2" EN MEDIDA DE 1.00 X 1.20 X 1.20. INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS.	1-2	A-B	BASE TINACO				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
09-HERR-008	PLACA ALUSNA POR BAÑO CONSTRUIDO.	1-2	A-B	PLACA				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
09-HERR-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PREFABRICADA DE 80 CMS CON MARCO METALICO. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	PUERTA				8.00	8.00	8.00	pie
TOTA									8.00		pie
11-O-EXT-001	SUMINISTRO Y APLICACION 4 BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRITON BLANCO 5 AÑOS DE GARANTIA EN 2 CAPAS Y MEMBRANA DE REFUERZO.	1-2	A-B	IMPERMEABILIZANTE	2.80	1.60		8.00	33.28	33.28	m2
TOTA									33.28		m2


 C. DANIEL MANCILLAS
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. DANIEL MANCILLAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
 Daza
 C. DANIEL MANCILLAS DAZA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000147



ESTIMACIÓN FINIQUITO HOJA 6 DE 8
PERIODO 25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020
MONTO CONTRATADO \$ 437,121.96
No. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FAIS-20-VDHNA-001
FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: "CONSTRUCCION DE 08 BAÑOS ECOLOGICOS"

UBICACION: SALAS PEREZ

MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

CROQUIS DE OBRA

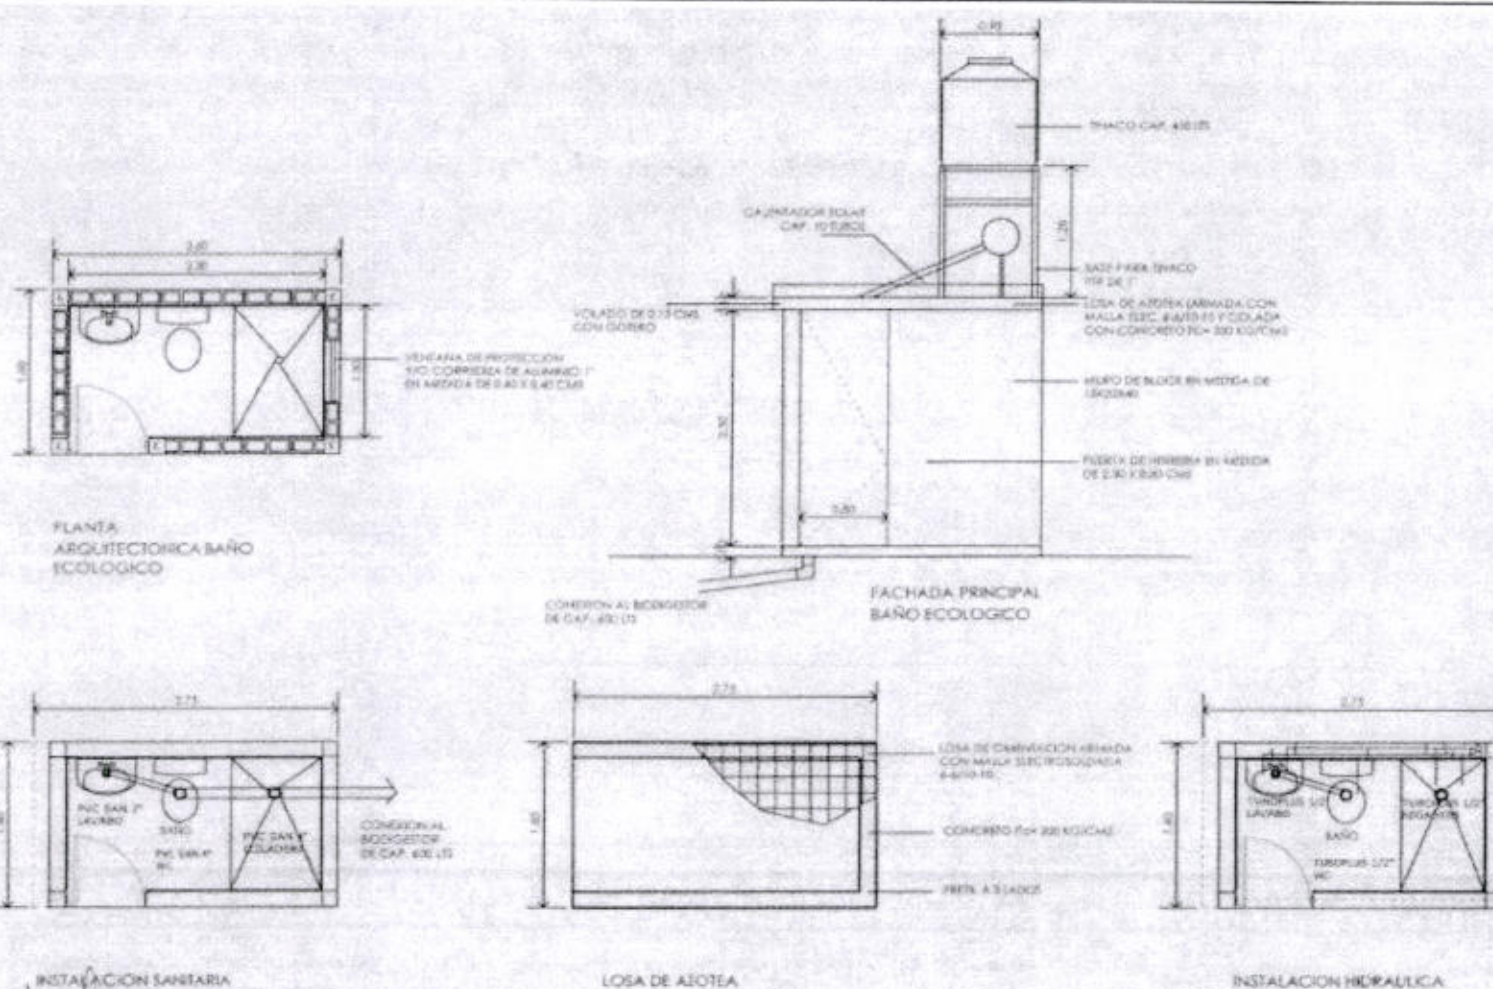

ANDRÉS JOSÉ RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DANIEL MANCILLAS
DOZAL
C. DANIEL MANCILLAS DOZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000148



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 8
PERIODO: 25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 437,121.96
NÚM. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-001
FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE 08 BAÑOS ECOLOGICOS
UBICACIÓN: SALAS PEREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



M.C. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. DANIEL MANCILLAS DOZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000138



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 8
PERIODO: 25 DE MAYO DEL 2020 AL 30 DE JULIO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 437,121.96
No. DE CONTRATO: MSD-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-001
FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: "CONSTRUCCION DE 08 BAÑOS ECOLOGICOS"
UBICACIÓN: SALAS PEREZ
MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



PRO. JUAN JOSE VILLALBA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
Dozal
C. DANIEL MANCILLAS DOZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000139
