




	ESTIMACIÓN:	FINQUITO	DE 5		FINQUITO	OBRA:	TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUZANO	
	PERIODO:	17 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				LOCALIDAD:	COL. HIDALGO	
	MONTO CONTRATADO:	\$149,786.50				MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAIS-20-EDUC-002				PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	FECHA:	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					FONDO III	
CARATULA DE ESTIMACIÓN								
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES		
01	ACABADOS	1.00	LOTE	\$ 53,899.40	\$ 53,899.40			
02	INSTALACION ELECTRICA	1.00	LOTE	\$ 24,474.10	\$ 24,474.10			
03	ALUMINIO	1.00	LOTE	\$ 33,950.00	\$ 33,950.00			
05	OBRA EXTERIOR	1.00	LOTE	\$ 22,113.00	\$ 22,113.00			
06	HERRERIA	1.00	LOTE	\$ 15,350.00	\$ 15,350.00			
		FINQUITO			\$ 149,786.50			
						FINQUITO \$129,126.29 IVA 16% \$20,660.21 SUBTOTAL \$149,786.50 DEDUCCIONES: \$0.00 AMORT. DE ANTICIPO \$44,935.95 TOTAL \$104,850.55 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00		
ANTICIPO OTORGADO:		\$	44,935.95			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	44,935.95			ESTIMADO A LA FECHA:	\$	149,786.50
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$	-			ESTA ESTIMACIÓN:	\$	-
SALDO POR AMORTIZAR		\$	-			SALDO POR EJERCER	\$	-
 ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ SUPERVISOR			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 ING. SAMARA CALDERA GARCIA CONTRATISTA		

ESTIMACIÓN:		PERIODO:		DE 5		FINIQUITO		CERRA:	
17 DE AGOSTO AL 28 DE		18 DEL 2020		140,786.50				TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO (CAMPUZANO)	
MONTRO CONTRATADO:		5						LOCALIDAD:	
No. DE CONTRATO:		MSO-006-FAIS-20-EJEC-002						MUNICIPIO:	
FECHA:		28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						PROGRAMA:	
								FONDO (S):	
RESUMEN DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
05 ACABADOS									
05-ACA-004	APLANADO DE YESO-CEMENTO-AGUA EN LOSA (PLAFOND) DE 3.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN REVENTON Y REGLA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	70.00	70.00	0.00	70.00	\$ 235.65	\$ -	\$ 16,495.50
TOTAL								\$ -	\$ 16,495.50
05-ACA-005	VITROPISO DE 33X33 CMS. CMS. MODELO GRECA RECTIFICADO, ASENTADO CON PEGA-AZULEJO	m2	48.00	48.00	0.00	48.00	\$ 470.10	\$ -	\$ 22,564.80
TOTAL								\$ -	\$ 22,564.80
05-ACA-006	PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO, PREVIAMENTE PREPARADAS.	m2	146.00	146.00	0.00	146.00	\$ 85.25	\$ -	\$ 12,446.50
TOTAL								\$ -	\$ 12,446.50
05-ACA-007	ZÓCLO CERAMICO DE TALAVERA DE 5 CM DE ESPESOR, COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE PEGADO CON PEGAPISO	ml	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 85.45	\$ -	\$ 2,392.60
TOTAL								\$ -	\$ 2,392.60
TOTAL DE ACABADOS							\$ -	\$ -	\$ 53,899.40
06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
06-ELE-001	LUMINARIA CUADRADA PARA SUSPENDER TIPO PANEL DE LED ULTRAPLANO DE 40 W, SECCIÓN 60X60 CMS CUERPO DE ACRILICO Y ALUMINIO, ACABADO SATINADO	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 2,214.30	\$ -	\$ 17,714.40
TOTAL								\$ -	\$ 17,714.40
06-ELE-004	SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO CONDUIT P.D. DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM INCLUYE MATERIAL THW CAL 12, CABLE DESNUDO CAL 10 TUBERIA, CODOS COPLES, CINTA DE AISLAR.	sal	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 525.80	\$ -	\$ 1,577.40
TOTAL								\$ -	\$ 1,577.40
06-ELE-005	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE PLASTICO TBICINO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	sal	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 525.80	\$ -	\$ 4,206.40
TOTAL								\$ -	\$ 4,206.40
06-ELE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 487.95	\$ -	\$ 975.90
TOTAL								\$ -	\$ 975.90
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$ -	\$ -	\$ 24,474.10
08 ALUMINIO									
08-ALU-002	VENTANA DE 3.85 X 1.50 M. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON MARCO Y BATIENTE, CON DUELA DE ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO Y CERRADURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,950.00	\$ -	\$ 12,950.00
TOTAL								\$ -	\$ 12,950.00
08-ALU-002	VENTANA DE 2.85 X 1.50 M. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON MARCO Y BATIENTE, CON DUELA DE ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO Y CERRADURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00
TOTAL								\$ -	\$ 11,500.00
08-ALU-002	PUERTA DE 1.00 X 2.40 MTS DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" ACABADO NATURAL INCLUYE: MATERIALES, CORTES, HERRAJES, VINILOS, PIJAS, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, CON SU HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00
TOTAL								\$ -	\$ 9,500.00
TOTAL DE ALUMINIO							\$ -	\$ -	\$ 33,950.00
11 OBRA EXTERIOR									
11-O-EXT-004	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE IMPERCOOL Y/O SIMILAR Y MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	70.00	70.00	0.00	70.00	\$ 315.90	\$ -	\$ 22,113.00
TOTAL								\$ -	\$ 22,113.00
TOTAL DE ACABADOS							\$ -	\$ -	\$ 22,113.00
09 HERRERIA									
09-HERR-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES EN SECCION DE 3.95 X 1.60 MTS. DISEÑO SEGUN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, INSTALACION, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,250.00	\$ -	\$ 8,250.00
TOTAL								\$ -	\$ 8,250.00
09-HERR-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES EN SECCION DE 2.95 X 1.60 MTS. DISEÑO SEGUN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, INSTALACION, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 7,100.00	\$ -	\$ 7,100.00
TOTAL								\$ -	\$ 7,100.00
TOTAL DE OBRA EXTERIOR							\$ -	\$ -	\$ 15,350.00
TOTAL DE TERA ESTIMACION							\$ 149,786.50		
								\$ -	\$ 149,786.50
								\$ -	\$ 149,786.50



ARG. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ
SUPERVISOR




I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ING. SAMARA CALDERA GARCIA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN		FIN		HOJA 3 DE 5		FINIQUITO			CERRA			
PERIODO		17 DE AL		17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUZANO			
MONTOS CONTRATADO \$		149,786.50					LOCALIDAD: COL. HIDALGO					
No. DE CONTRATO		MSO-005-FAS-20-EDUC-007					MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					
FECHA		28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
							FONDO III					
NÚMEROS GENERADORES												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD	
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL		
01-PRE-001	APLANADO DE YESO-CEMENTO-AGUA EN LOSA (PLAFOND) DE 3.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN REVENTÓN Y REGLA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.				10.00	7.00	0.00	1.00	70.00	70.00	m2	
									70.00		m2	
06-ELE-020	VITROPISO DE 33X33 CMS. CMS. MODELO GRECA RECTIFICADO, ASENTADO CON PEGA-AZULEJO.				6.00	8.00	0.03	1.00	48.00	48.00	m2	
									48.00		m2	
06-ELE-004	PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO. PREVIAMENTE PREPARADAS.				6.00	8.00	0.01	1.00	146.00	146.00	m2	
									146.00		m2	
02-CIM-003	ZOCLO CERAMICO DE TALAVERA DE 5 CM DE ESPESOR, COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE PEGADO CON PEGAPISO.				6.00	8.00	0.03	1.00	28.00	28.00	ml	
									28.00		ml	
08-ALU-002	LUMINARIA CUADRADE PARA SUSPENDER TIPO PANEL DE LED ULTRAPLANO DE 40 W, SECCION 60X60 CMS. CUERPO DE ACRILICO Y ALUMINIO, ACABADO SATINADO.				0.60	0.60	0.03	8.00	8.00	8.00	pza	
									8.00		pza	
03-ALB-002	SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO CONDUIT P.D. DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM. INCLUYE MATERIAL THW CAL. 12, CABLE DESNUDO, CAL. 10 TUBERIA, CODOS, COPLES, CINTA DE AISLAR.				1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	sal	
									3.00		sal	
08-ALU-002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA DE PLASTICO TBCINO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.				1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	8.00	sal	
									8.00		sal	
03-ALB-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.				1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	pza	
									2.00		pza	
#REF!	VENTANA DE 3.85 X 1.50 M. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON MARCO Y BATIENTE, CON DUELA DE ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO Y CERRADURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				3.85	0.05	1.50	1.00	1.00	1.00	pza	
									1.00		pza	
11-O-EXT-004	VENTANA DE 2.85 X 1.50 M. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON MARCO Y BATIENTE, CON DUELA DE ALUMINIO, PIVOTE DESCENTRADO Y CERRADURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				2.85	0.05	1.50	1.00	1.00	1.00	pza	
									1.00		pza	
#REF!	PUERTA DE 1.00 X 2.40 MTS DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" ACABADO NATURAL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, HERRAJES, VINILOS, PUAS, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, CON SU HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.				1.00	0.05	2.40	1.00	1.00	1.00	pza	
									1.00		pza	
09-HERR-029	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE IMPERCOOL Y/O SIMILAR Y MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.				10.00	7.00	0.03	70.00	70.00	70.00	m2	
									70.00		m2	
#REF!	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES EN SECCION DE 3.95 X 1.60 MTS, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA.				3.95	0.05	1.60	1.00	1.00	1.00	pza	
									1.00		pza	
#REF!	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES EN SECCION DE 2.95 X 1.60 MTS, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, ANTICORROSIVO Y PINTURA.				2.95	0.05	1.60	1.00	1.00	1.00	pza	
									1.00		pza	



SR. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ
SUPERVISOR



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ING. SAMARA CALDERA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINQUITO HOJA 4 DE
PERIODO: 17 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Monto CONTRATADO: \$ 149,786.50
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAIS-20-EDUC-002
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FINQUITO

OBRA: TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUZANO

LOCALIDAD: COL. HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO III

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ
SUPERVISOR

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. SAMARA CALDERA GARCIA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINQUITO 4 DE 5

PERIODO: 17 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 149,786.50

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAIS-20-EDUC-002

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FINQUITO

OBRA:

TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA
PINEDO CAMPUZANO


LOCALIDAD: COL. HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO III

CROQUIS DE OBRA

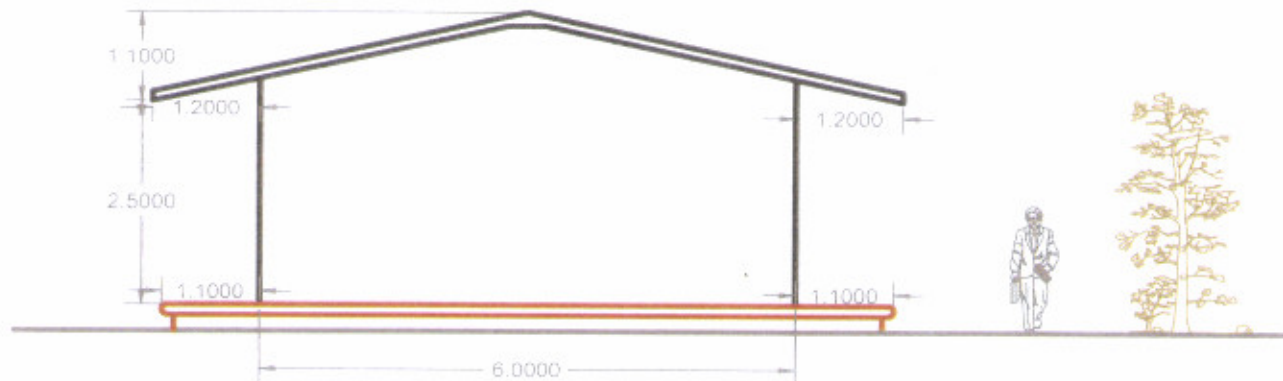

FACHADA LATERAL

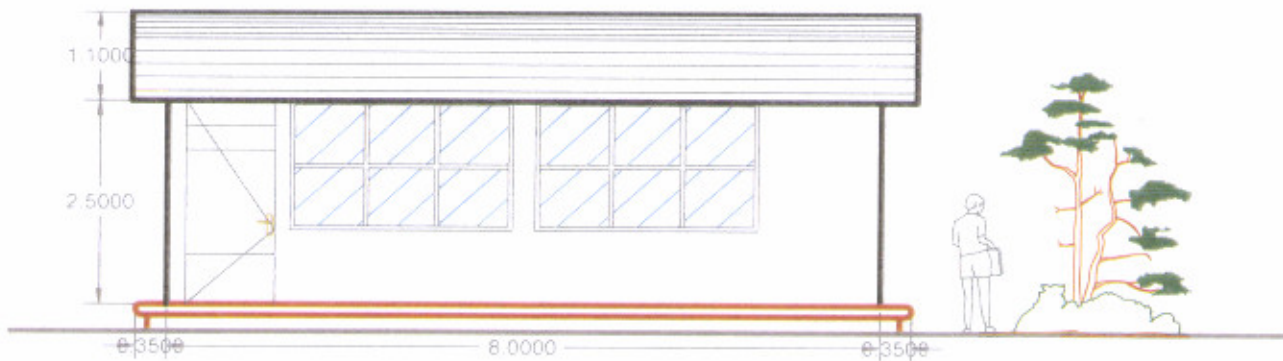

ARQ. SERGIO A. ARELLANO LOPEZ
SUPERVISOR

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. SAMARA CALDERA GARCIA
CONTRATISTA
