


	ESTIMACIÓN:	FINQUITO	HOGA 3 DE 9	 SOMBRERETE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL SOMBRERETILLO	
	PERIODO:	DEL 17 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023			UBICACIÓN:	COL SOMBRERETILLO	
	MONTO CONTRATADO:	\$	154,084.59		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-23-ELECT-004			PROGRAMA:	FISM 2023	
FECHA:	02 DE ABRIL DE 2023						
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL SOMBRERETILLO	1.00	accion		\$ 129,431.06	\$ 129,431.06	
		TOTAL DE FINQUITO				\$ 129,431.06	
							FINQUITO \$129,431.06 IVA 16% \$24,653.53 SUBTOTAL \$154,084.59 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$154,084.59 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:		\$	46,225.38				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA: ESTIMADO A LA FECHA \$ 154,084.59 ESTA ESTIMACIÓN: SALDO POR EJERCER \$
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$	46,225.38				
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$					
SALDO POR AMORTIZAR		\$					
 APO. MANABUEN REVISITA RESIDENTE DE OBRA		 LSC. JAIME ARTURO VIEGMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION		



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 5
 PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 154,684.59
 NO. DE CONTRATO: MSD-DDS-FSM-21-ELECT-004
 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021

FINIQUITO



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETILLO
 UBICACIÓN: COL. SOMBRERETILLO
 MUNICIPIO: SOMBRERETILLO, ZAC.
 PROGRAMA: FSM 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-32-750, INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENDO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 12,276.99	\$ -	\$ 24,563.98
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 275.22	\$ -	\$ 550.44
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHUFLA PY-200, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 2,164.14	\$ -	\$ 4,328.28
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 15P2, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	6	6.00	0.00	6.00	\$ 2,304.72	\$ -	\$ 13,828.32
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2B5, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 343.53	\$ -	\$ 687.06
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 1,069.26	\$ -	\$ 2,126.52
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	3	3.00	0.00	3.00	\$ 757.35	\$ -	\$ 2,272.05
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B2, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	3	3.00	0.00	3.00	\$ 309.87	\$ -	\$ 929.61
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	12	12.00	0.00	12.00	\$ 127.71	\$ -	\$ 1,632.52
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2B5, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	8	8.00	0.00	8.00	\$ 351.45	\$ -	\$ 2,811.60
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 627.95	\$ -	\$ 1,399.90
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	1	1.00	0.00	1.00	\$ 802.89	\$ -	\$ 802.89
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	2	2.00	0.00	2.00	\$ 563.41	\$ -	\$ 1,106.82
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	1	1.00	0.00	1.00	\$ 309.87	\$ -	\$ 909.87
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	1	1.00	0.00	1.00	\$ 135.63	\$ -	\$ 135.63
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	20	20.00	0.00	20.00	\$ 99.00	\$ -	\$ 1,980.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	1	1.00	0.00	1.00	\$ 1,406.79	\$ -	\$ 1,406.79
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	6	6.00	0.00	6.00	\$ 156.42	\$ -	\$ 936.52
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PICABLE AG 5/16, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	4	4.00	0.00	4.00	\$ 136.62	\$ -	\$ 546.48
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PVACSR-2, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	4	4.00	0.00	4.00	\$ 127.71	\$ -	\$ 510.84
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	15	15.00	0.00	15.00	\$ 126.72	\$ -	\$ 1,900.80
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)/0-2, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	80	80.00	0.00	80.00	\$ 249.48	\$ -	\$ 19,958.40
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)/0-6, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	140	140.00	0.00	140.00	\$ 60.49	\$ -	\$ 7,068.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	KG	1	1.00	0.00	1.00	\$ 351.45	\$ -	\$ 351.45
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PCS	3	3.00	0.00	3.00	\$ 1,187.01	\$ -	\$ 3,561.03
SUMA HOJA No. 02								\$ -	\$ 95,594.02

ABD. JUAN RIVERA ACOSTA
 RESIDENTE DE OBRA

LSC JAIME ARTURO VIEDMA ECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ESTIMACIÓN

PERIODO:

MONTO CONTRATADO: \$

No. DE CONTRATO:

FECHA:

FINQUITO

DEL 17 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

154,084.59

MSO-DOS-FISM-21-ELECT-004

02 DE ABRIL DE 2023

FINQUITO

SOMBRERETE

OBRA:

USICACIÓN:

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRERETILLO

COL. SOMBRERETILLO

SOMBRERETE, ZAC.

FISM 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					3.00		3.00	pza
			POSTE 2					3.00	3.00	pza	
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					6.00		6.00	pza
			POSTE 2					6.00	6.00	pza	
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					4.00		4.00	pza
			POSTE 2					4.00	4.00	pza	
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 1B; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2								
								TOTAL	1.00	pza	

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA

RESIDENTE DE OBRA.

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.


 SOMBRETERE	ESTIMACIÓN PERIODO DEL 17 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59 No. DE CONTRATO: MSO-DOS-FISM-23-ELECT-004 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2023	FINIQUITO  SOMBRETERE	OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRETERILLO UBICACIÓN: COL. SOMBRETERILLO MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC. PROGRAMA: FISM 2023									
NÚMEROS GENERADORES												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO	UNIDAD	
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					10.00	10.00	pza	
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					1.00	1.00	pza	
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					3.00	3.00	pza	
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					2.00	2.00	pza	
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					2.00	2.00	pza	
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					7.00	7.00	pza	
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2*1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					40.00	40.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1					70.00	70.00	ml	
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS		POSTE 1								

 SOMBRERETE	ESTIMACIÓN: FINIQUITO PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-004 FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021	FINIQUITO  SOMBRERETE	OSBA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN CDL. SOMBRERETILLO UBICACIÓN: COL. SOMBRERETILLO MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FSM 2021
---	--	---	--

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		1.00	kg
			POSTE 2								
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		1.00	kg
			POSTE 2					1.00		2.00	pza
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					7.00		1.00	pza
			POSTE 2					8.00		3.00	kg
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		7.00	kg
			POSTE 2					1.00		8.00	pza
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		15.00	kg
			POSTE 2					1.00		2.00	pza
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		3.00	pza
			POSTE 2					1.00		1.00	pza
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2					2.00		2.00	pza
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE FLOR DE CORPUS	POSTE 1					1.00		4.00	pza
			POSTE 2							1.00	pza
										1.00	pza


ARO. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. KEVIN JESÚS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 9
PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59
No. DE CONTRATO: MSO-005-FISM-23-ELECT-004
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN COL. SOMBRETEILLO
UBICACIÓN: COL. SOMBRETEILLO
MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
PROGRAMA: FISM 2021

CROQUIS DE OBRA

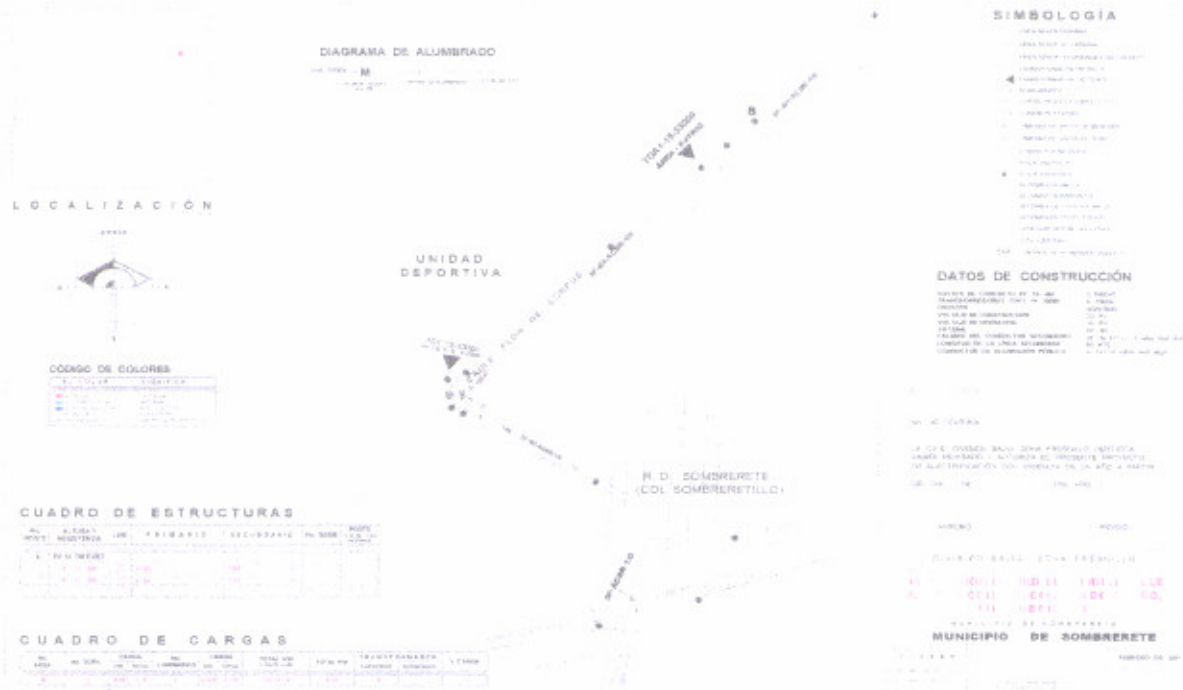

ARACELI RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA.

L. SC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KEVIN JESÚS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 9
PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59
No. DE CONTRATO: MSO-D05-FISM-21-ELECT-004
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021

FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN
COL. SOMBRERETILLO
UBICACIÓN: COL. SOMBRERETILLO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FISM 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA.

L. SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 9
PERIODO: DEL 17 DE FEBRERO 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 154,084.59
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-004
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2021

FINIQUITO

OTRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FLOR DE CORPUS EN
COL SOMBRERETILLO
UBICACIÓN: COL SOMBRERETILLO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FISM 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA,
RESIDENTE DE OBRA.


L.SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.


ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
