

		ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 24 PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 06 DE ABRIL DE 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 1,583,038.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003 FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021		RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS E HACIENDO DIFERENTE		OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO: FISCAL 2021	
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 1,583,038.00	\$ 1,583,038.00		
TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO					\$ 1,583,038.00		
						FINIQUITO \$1,364,687.93 IVA 16% \$218,350.07 SUBTOTAL \$1,583,038.00 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00	
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 474,911.40					
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 474,911.40					
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:		\$ -					
SALDO POR AMORTIZAR		-\$ 0.00					
						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA: ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,583,038.00 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00 SALDO POR ESTIMAR \$ -	
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA		 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA			

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-532	RETIRO DE RETENIDA EXISTENTE CON ESTACA ANCLA	lote	1.00	1.00	-	1.00	6,010.00	-	6,010.00
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	18.00	18.00	-	18.00	12,390.00	-	223,020.00
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K; INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	5,080.00	-	30,480.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	275.00	-	5,500.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	2,180.00	-	43,600.00
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	18.00	18.00	-	18.00	2,320.00	-	41,760.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	345.00	-	4,140.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	1,074.00	-	17,184.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	668.00	-	1,336.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	22.00	22.00	-	22.00	129.00	-	2,838.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	42.00	42.00	-	42.00	140.00	-	5,880.00
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	345.00	-	1,380.00

SUMA HOJA No. 1

383,128.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ÁNGELICA MARQUEZ FABELA

CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	ESTANCIA DE GUADALUPE
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	14.00	14.00	-	14.00	160.00	-	2,240.00
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	150.00	-	600.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	14.00	14.00	-	14.00	1,070.00	-	14,980.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	760.00	-	15,200.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	30.00	30.00	-	30.00	300.00	-	9,000.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	90.00	90.00	-	90.00	130.00	-	11,700.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	100.00	100.00	-	100.00	350.00	-	35,000.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	15.00	15.00	-	15.00	700.00	-	10,500.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	400.00	-	1,600.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	800.00	-	12,800.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	600.00	-	12,000.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	13.00	13.00	-	13.00	300.00	-	3,900.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	350.00	-	3,500.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	490.00	-	1,960.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	34.00	34.00	-	34.00	135.00	-	4,590.00

SUMA HOJA No. 2

139,570.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ÁNGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 4 DE 24		OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	PERIODO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	460.00	460.00	-	460.00	100.00	-	46,000.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	1,400.00	-	22,400.00
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	12.00	12.00	-	12.00	160.00	-	1,920.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	85.00	85.00	-	85.00	135.00	-	11,475.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	26.00	26.00	-	26.00	130.00	-	3,380.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	131.00	131.00	-	131.00	135.00	-	17,685.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	220.00	220.00	-	220.00	270.00	-	59,400.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	680.00	680.00	-	680.00	260.00	-	176,800.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	800.00	800.00	-	800.00	50.00	-	40,000.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	8.00	8.00	-	8.00	350.00	-	2,800.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	790.00	-	4,740.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	390.00	-	2,340.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	30.00	30.00	-	30.00	1,200.00	-	36,000.00

SUMA HOJA No. 3

424,940.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 5 DE 24		OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	80.00	80.00	-	80.00	750.00	-	60,000.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	40.00	40.00	-	40.00	600.00	-	24,000.00
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	6.00	6.00	-	6.00	750.00	-	4,500.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRAMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	2.00	2.00	-	2.00	110,200.00	-	220,400.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mi	25.00	25.00	-	25.00	300.00	-	7,500.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	16,950.00	-	271,200.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	850.00	-	13,600.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	50.00	50.00	-	50.00	80.00	-	4,000.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA ACOMETIDA MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	lote	2.00	2.00	-	2.00	7,600.00	-	15,200.00
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	servicio	1.00	1.00	-	1.00	3,500.00	-	3,500.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	11,500.00	-	11,500.00

SUMA HOJA No. 4

\$

635,400.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

\$

1,583,038.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA

CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 6 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO: \$		1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:		M50-DDS-FISM-21-ELECT-003		EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:		07 DE ABRIL DE 2021				

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-532	RETIRO DE RETENIDA EXISTENTE CON ESTACA ANCLA							1.00	1.00		
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-18					TOTAL		1.00	lote
								18.00	18.00		
								TOTAL		18.00	pza
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-18					6.00	6.00		
								TOTAL		6.00	pza
								TOTAL		6.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 7 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 Tercer Turno de Gobierno	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	ESTANCIA DE GUADALUPE
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO: \$	1,583,038.00			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					20.00	20.00		
TOTAL									20.00		pza
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-18					20.00	20.00		
TOTAL									20.00		pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-18					18.00	18.00		
TOTAL									18.00		pza
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					12.00	12.00		
TOTAL									12.00		pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					16.00	16.00		

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA
--	--	---

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 9 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 UNIDAD EN SUS DIVERSOS					OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO				
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021	AL 06 DE ABRIL DE 2021						UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE				
MONTO CONTRATADO: \$ 1,583,038.00			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO: FISCAL 2021									
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021												
NÚMEROS GENERADORES												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD	
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL		
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					14.00	14.00			
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					4.00	4.00			
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					14.00	14.00			
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					20.00	20.00			
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					30.00	30.00			
								TOTAL	14.00	pza		
								TOTAL	4.00	pza		
								TOTAL	14.00	pza		
								TOTAL	20.00	pza		
								TOTAL	20.00	pza		


ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
 SUPERVISOR DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 10 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ¡Juntos y Haciendo Diferencia!				OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO				
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 06 DE ABRIL DE 2021						UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE				
Monto Contratado: \$ 1,583,038.00		No. de Contrato: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003		FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					
						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
						EJERCICIO FISCAL 2021					
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18								
TOTAL									30.00		pza
							90.00	90.00			
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18								
TOTAL									90.00		pza
							100.00	100.00			
TOTAL									100.00		pza
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA AÇOSTA SUPERVISOR DE OBRA  LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA											


	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 11 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TERCER EDIFICIO DE GOBIERNO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	ESTANCIA DE GUADALUPE
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO: \$		1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003		EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:		07 DE ABRIL DE 2021				

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					15.00	15.00		
TOTAL									15.00		pza
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					4.00	4.00		
TOTAL									4.00		pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					16.00	16.00		
TOTAL									16.00		pza

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA
--	--	---

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 15 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ENTONCES EL MUNDO DIFERENTE					OBRA:				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO			
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021						AL	06 DE ABRIL DE 2021	UBICACIÓN:				ESTANCIA DE GUADALUPE	
MONTO CONTRATADO:		\$	1,583,038.00		MUNICIPIO:				SOMBRERETE, ZAC.							
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003		PROGRAMA:				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
FECHA:		07 DE ABRIL DE 2021		EJERCICIO				FISCAL 2021								
NÚMEROS GENERADORES																
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD					
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL						
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18		680.00											
TOTAL								220.00		kg						
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18		800.00											
TOTAL								680.00		ml						
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18													
TOTAL								800.00		ml						
								8.00								
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA  LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA																

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 17 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021 UNION DE HUMANOS DESARROLLANTES	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	ESTANCIA DE GUADALUPE
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18						80.00		
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18					40.00	40.00		kg
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18						6.00		pza



 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA
--	--	---

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 20 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 CONOCIENDO NUESTRO MUNICIPIO	OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
	PERIODO:	DEL	01 DE MARZO DE 2021		UBICACIÓN:	ESTANCIA DE GUADALUPE
		AL	06 DE ABRIL DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,583,038.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003			EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2021					

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-18								
						TOTAL			1.00		servicio
								1.00	1.00		
						TOTAL			1.00		pza

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA CONTRATISTA
--	--	---



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 21 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021
AL 06 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,583,038.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADO
UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

NO. POSTE	ALTIMETRIA RELATIVA	LUM.	PRIMARIO	SECUNDARIO	NO. POSTE	COORDENADAS
11	15.1276	2000	75	80	1	15.1276 1000000
12	15.1276	1500	75	80	2	15.1276 1000000
13	15.1276	1000	75	80	3	15.1276 1000000
14	15.1276	500	75	80	4	15.1276 1000000
15	15.1276	0	75	80	5	15.1276 1000000
16	15.1276	500	75	80	6	15.1276 1000000
17	15.1276	1000	75	80	7	15.1276 1000000
18	15.1276	1500	75	80	8	15.1276 1000000
19	15.1276	2000	75	80	9	15.1276 1000000
20	15.1276	2500	75	80	10	15.1276 1000000
21	15.1276	3000	75	80	11	15.1276 1000000
22	15.1276	3500	75	80	12	15.1276 1000000
23	15.1276	4000	75	80	13	15.1276 1000000
24	15.1276	4500	75	80	14	15.1276 1000000
25	15.1276	5000	75	80	15	15.1276 1000000
26	15.1276	5500	75	80	16	15.1276 1000000
27	15.1276	6000	75	80	17	15.1276 1000000
28	15.1276	6500	75	80	18	15.1276 1000000
29	15.1276	7000	75	80	19	15.1276 1000000
30	15.1276	7500	75	80	20	15.1276 1000000
31	15.1276	8000	75	80	21	15.1276 1000000
32	15.1276	8500	75	80	22	15.1276 1000000
33	15.1276	9000	75	80	23	15.1276 1000000
34	15.1276	9500	75	80	24	15.1276 1000000
35	15.1276	10000	75	80	25	15.1276 1000000

LEGENDA
LINEA DE MEDIA TENSION DE 15 KVA
LINEA DE BAJA TENSION DE 480V
TRANSFORMADOR EXISTENTE
TRANSFORMADOR PROYECTADO
POSTE EXISTENTE
POSTE PROYECTADO

DIAGRAMA UNIFILAR

LINEA DE MEDIA TENSION DE 15 KVA



DIAGRAMA UNIFILAR

LINEA DE MEDIA TENSION DE 15 KVA



CORPORATIVO COMERCIAL REMATE S DE RL DE CV
AV. LAS CUMBRES NUM 148 C.R. SEDES
COLONIA DEL PUERTO, ZACATECAS, ZAC.
TEL 482 130 24 91 AND 111 12 11
agente_construccion@outlook.com
proyectos@construccion@outlook.com

PLANO REVISION

No. DE CONTR. PD-56721. ESCRITOR: EPS000000156/2021

LA CPE DIVISION BAJO ZONA FRESCILLA CERTIFICA
HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO
DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR
DE DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021

ING. JESUS RAMON CHAVEZ
JEFE REGIONAL DE SOMBRETERE

ING. ALFREDO RAMON RAMIREZ
JEFE DE DPTO. DE PLANEACION

ING. HECTOR LUIS GARCIA BARRIL
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

ING. ALFREDO RAMON RAMIREZ
JEFE ZONA FRESCILLA

DIVISION BAJO ZONA FRESCILLA
AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN LA
COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE
EN CALLE CORREGIDORA Y CALLE
FRANCISCO VILLA
PARA USOS DOMESTICOS
MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS

FECHA: 22 DE FEBRERO 2021	REVISION: 1-1
FECHA: 22 DE FEBRERO 2021	REVISION: 1-1
FECHA: 22 DE FEBRERO 2021	REVISION: 1-1

NO. POSTE	ALTIMETRIA RELATIVA	LUM.	PRIMARIO	SECUNDARIO	NO. POSTE	COORDENADAS
11	15.1276	2000	75	80	1	15.1276 1000000
12	15.1276	1500	75	80	2	15.1276 1000000
13	15.1276	1000	75	80	3	15.1276 1000000
14	15.1276	500	75	80	4	15.1276 1000000
15	15.1276	0	75	80	5	15.1276 1000000
16	15.1276	500	75	80	6	15.1276 1000000
17	15.1276	1000	75	80	7	15.1276 1000000
18	15.1276	1500	75	80	8	15.1276 1000000
19	15.1276	2000	75	80	9	15.1276 1000000
20	15.1276	2500	75	80	10	15.1276 1000000
21	15.1276	3000	75	80	11	15.1276 1000000
22	15.1276	3500	75	80	12	15.1276 1000000
23	15.1276	4000	75	80	13	15.1276 1000000
24	15.1276	4500	75	80	14	15.1276 1000000
25	15.1276	5000	75	80	15	15.1276 1000000
26	15.1276	5500	75	80	16	15.1276 1000000
27	15.1276	6000	75	80	17	15.1276 1000000
28	15.1276	6500	75	80	18	15.1276 1000000
29	15.1276	7000	75	80	19	15.1276 1000000
30	15.1276	7500	75	80	20	15.1276 1000000
31	15.1276	8000	75	80	21	15.1276 1000000
32	15.1276	8500	75	80	22	15.1276 1000000
33	15.1276	9000	75	80	23	15.1276 1000000
34	15.1276	9500	75	80	24	15.1276 1000000
35	15.1276	10000	75	80	25	15.1276 1000000

Ver los controles PDF

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 22 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021
AL 06 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,583,038.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021




RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
¡CONJUNTAMENTE SOMOS DIFERENTE!

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES
CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL
MIRADO
UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

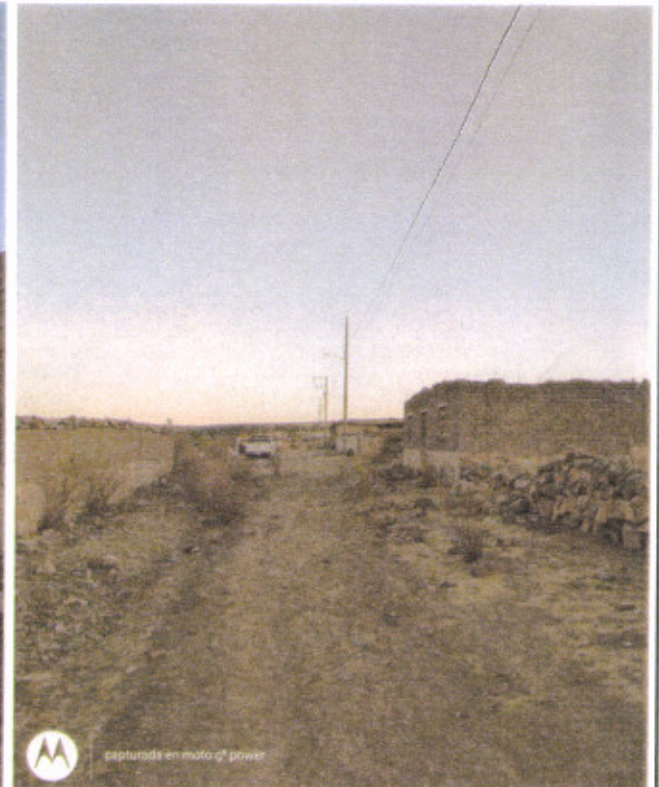

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 23 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021
AL 06 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,583,038.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021




RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
Juntos Lo Hacemos Diferente

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES
CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL
MIRADO
UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA





ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 24 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE MARZO DE 2021
AL 06 DE ABRIL DE 2021
MONTA CONTRATADO: \$ 1,583,038.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003
FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021



OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES
CORREGIDORA, FRANCISCO VILLA, LA PIEDRA, EL
MIRADO
UBICACIÓN: ESTANCIA DE GUADALUPE
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTA FOTOGRÁFICO DE OBRA

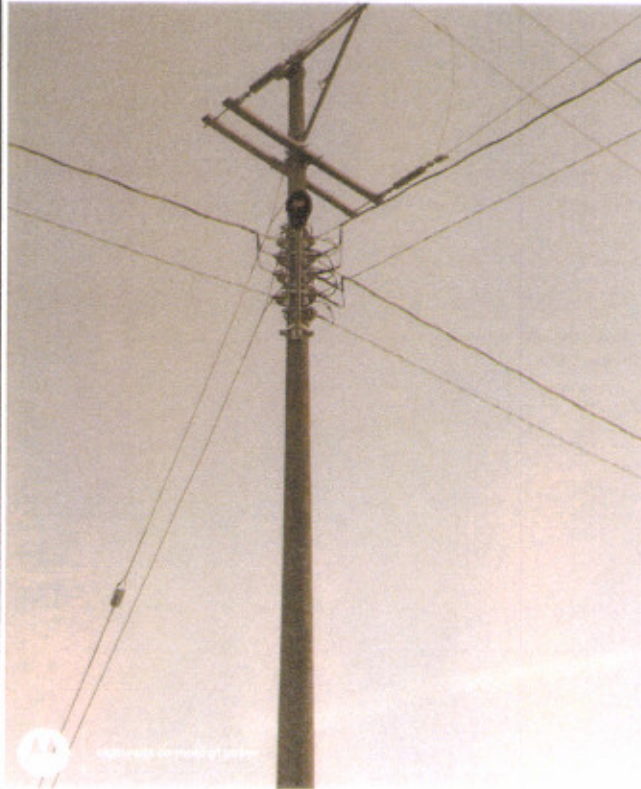


ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA
