



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 8
PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 572,219.10
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION
UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 83,624.10	\$ 83,624.10	
02	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 481,575.00	\$ 481,575.00	
03	AGUA POTABLE	1	LOTE	\$ 7,020.00	\$ 7,020.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 572,219.10	
						FINIQUITO \$493,292.33
						IVA 16% \$78,926.77
						SUBTOTAL \$572,219.10
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00
						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
						ESTIMADO A LA FECHA: \$ 572,219.10
						ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
						SALDO POR EJERCER \$ -

ANTICIPO OTORGADO: \$ 171,665.73
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 171,665.73
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR -\$ 0.00

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
Doza
C. DANIEL MANCILLAS DORZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 8

PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 572,219.10

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION


UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021


DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	m2	753.00	753.00	0.00	753.00	\$ 12.00	\$ -	\$ 9,036.00
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD,	m3	150.60	150.60	0.00	150.60	\$ 335.00	\$ -	\$ 50,451.00
01-PRE-017	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO	m2	5.85	5.85	0.00	5.85	\$ 110.00	\$ -	\$ 643.50
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	195.78	195.78	0.00	195.78	\$ 120.00	\$ -	\$ 23,493.60
TOTAL DE PRELIMINARES								\$ -	\$ 83,624.10
PAVIMENTACIÓN									
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	195.78	195.78	0.00	195.78	\$ 250.00	\$ -	\$ 48,945.00
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ml	140.00	140.00	0.00	140.00	\$ 380.00	\$ -	\$ 53,200.00
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	m2	154.00	154.00	0.00	154.00	\$ 340.00	\$ -	\$ 52,360.00
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	591.00	591.00	0.00	591.00	\$ 530.00	\$ -	\$ 313,230.00
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ml	9.00	9.00	0.00	9.00	\$ 260.00	\$ -	\$ 2,340.00
09-HERR-022	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00
TOTAL DE PAVIMENTACION								\$ -	\$ 481,575.00
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 565,199.10



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



C. DANIEL MANCILLAS DORZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3
PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 572,219.10
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION
UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	AGUA POTABLE								
14-ACCES-003	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	pza	9.00	9.00	0.00	9.00	\$ 780.00	\$ -	\$ 7,020.00
TOTAL DE AGUA POTABLE								\$ -	\$ 7,020.00
SUMA HOJA No. 02								\$ -	\$ 7,020.00
TOTAL DE FINIQUITO								\$ -	\$ 572,219.10



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 8
PERÍODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 572,219.10
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE GORRION
UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

EJERCICIO FISCAL 2021													
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD		
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL			
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-4	A-B	LIMP	80.00	9.4125			753.00	753.00	m2		
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	1-4	A-B	EXCAV	80.00	TOTAL		753.00		m2			
						9.4125	0.20	150.60	150.60	m3			
						TOTAL		150.60		m3			
01-PRE-017	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	1-4	A-B	DEMOLI	9.75	0.6000		5.85	5.85	m2			
						TOTAL		5.85		m2			
						9.4125	0.25611	753.00	192.85	m3			
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4	A-B	ACARREO	80.00	0.60	0.50	2.93	2.93	m3			
						TOTAL		195.78		m3			
						0.00	0.00	0.00	0.00	m3			
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-4	A-B	RELLENO	0.00	TOTAL		0.00		m2			
						TOTAL		0.00		m3			
						TOTAL		0.00		m3			
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1	A-B	GUARN	70.00			70.00	70.00	ml			
						2	A-B	GUARN	70.00	70.00	ml		
						TOTAL		140.00		ml			
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO DE 100 MTS. INLCUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	1	A-B	BANQ	80.00	0.9625		77.00	77.00	m2			
						2	A-B	BANQ	80.00	0.9625	77.00	77.00	m2
						TOTAL		154.00		m2			
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-B	PAVIMENTO	80.00	7.3875		591.00	591.00	m2			
						TOTAL		591.00		m2			
						TOTAL		591.00		m2			

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
Dorcal
C. DANIEL MANCILLAS DORCAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO FOLIO 6 DE 8
PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021
MONTA CONTRATADO: \$ 572,219.10
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION


UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

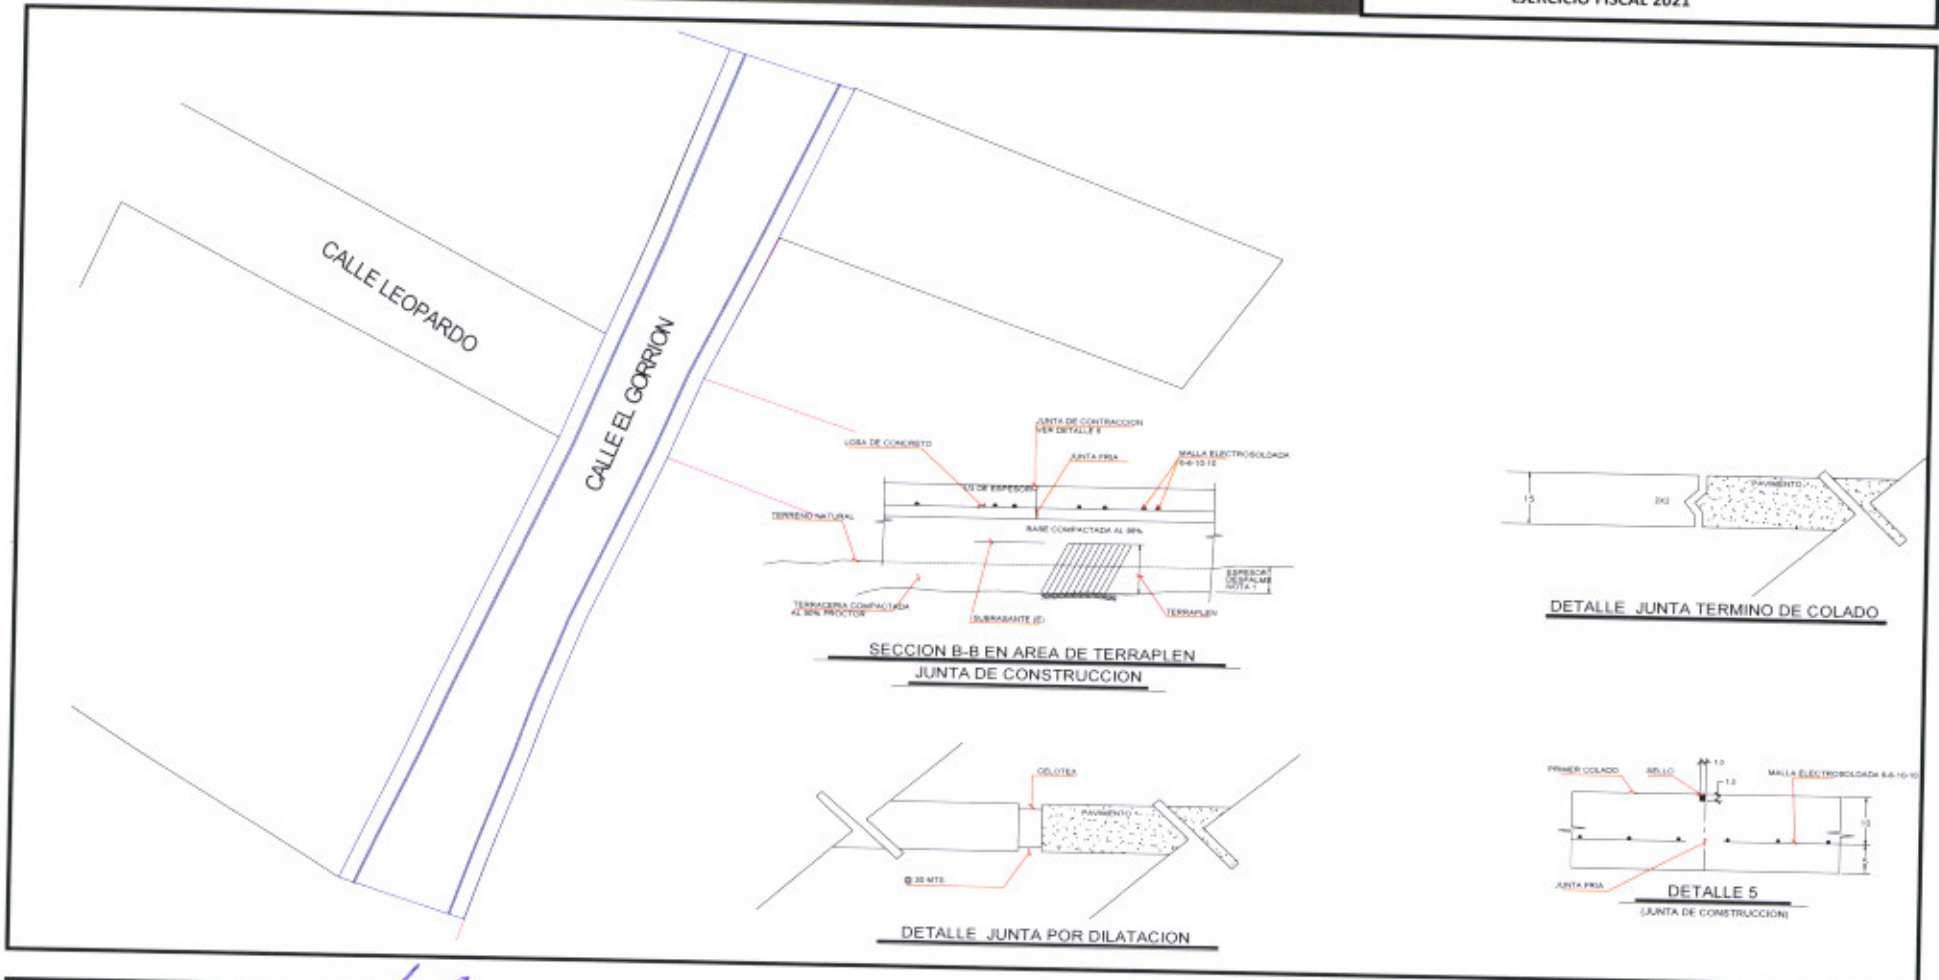

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
Dozal
C. DANIEL MANCILLAS DORZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 8

PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 572,219.10

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION

UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
DOZAL
C. DANIEL MANCILLAS DORZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 8
PERIODO: DEL 22 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2021

MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-007
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRION

UBICACIÓN: COLONIA EL VALLE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Daniel Mancillas
Dozal
C. DANIEL MANCILLAS DORZAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
