


	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 1 DE 24		RESUMEN DE FINIQUITO 		OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021				UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021				MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	621,777.00				PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008					EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021							

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO, CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 621,777.00	\$ 621,777.00	
TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO					\$ 621,777.00	
						FINIQUITO \$536,014.66
						IVA 16% \$85,762.34
						SUBTOTAL \$621,777.00
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$	186,533.10			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	186,533.10			ESTIMADO A LA FECHA: \$ 621,777.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$	-			ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-			SALDO POR ESTIMAR \$ -

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN CONTRATISTA
--	--	---

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO			
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECA			
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.			
	MONTO CONTRATADO:	\$	621,777.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO:	FISCAL 2021			
	FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021							
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	12,300.00	-	36,900.00
04-ELECT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	12,300.00	-	12,300.00
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	5,100.00	-	10,200.00
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	280.00	-	280.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	2,200.00	-	11,000.00
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	2,300.00	-	4,600.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	350.00	-	700.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,080.00	-	4,320.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	670.00	-	670.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	130.00	-	910.00
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	300.00	-	2,400.00
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	160.00	-	320.00
SUMA HOJA No. 1									84,600.00
 ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA  LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN CONTRATISTA									

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECA
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	621,777.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021					

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	480.00	-	1,920.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,080.00	-	4,320.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	770.00	-	8,470.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	300.00	-	3,300.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	44.00	44.00	-	44.00	130.00	-	5,720.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	24.00	24.00	-	24.00	350.00	-	8,400.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	700.00	-	4,200.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	400.00	-	800.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	800.00	-	3,200.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	560.00	-	5,600.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	300.00	-	1,200.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	360.00	-	720.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	480.00	-	1,920.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	140.00	-	1,540.00
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	195.00	195.00	-	195.00	95.00	-	18,525.00

SUMA HOJA No. 2

- 69,835.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN

CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 4 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECA
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	PERIODO:	\$	621,777.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008				EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021					


DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	1,420.00	-	5,680.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	34.00	34.00	-	34.00	140.00	-	4,760.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	9.00	9.00	-	9.00	130.00	-	1,170.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	50.00	50.00	-	50.00	130.00	-	6,500.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	25.00	25.00	-	25.00	270.00	-	6,750.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	200.00	200.00	-	200.00	250.00	-	50,000.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	400.00	400.00	-	400.00	52.00	-	20,800.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	356.00	-	712.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	790.00	-	1,580.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	390.00	-	780.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	1,200.00	-	7,200.00
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	30.00	30.00	-	30.00	760.00	-	22,800.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	560.00	-	3,360.00

SUMA HOJA No. 3

132,092.00

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN CONTRATISTA
--	--	---

	ESTIMACIÓN:	FINQUITO	HOJA 5 DE 24	 RESUMEN DE FINQUITO 	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO			
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECA			
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021	MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.				
	MONTO CONTRATADO:	\$	621,777.00	PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO:	FISCAL 2021			
	FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021							
DESGLASE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	750.00	-	1,500.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	pza	1.00	1.00	-	1.00	107,500.00	-	107,500.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	8.00	8.00	-	8.00	300.00	-	2,400.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	16,800.00	-	84,000.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	760.00	-	3,800.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	20.00	20.00	-	20.00	75.00	-	1,500.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	lote	1.00	1.00	-	1.00	7,500.00	-	7,500.00
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	servicio	1.00	1.00	-	1.00	3,400.00	-	3,400.00
04-ELECT-138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRECILLA ARMADA DE ACERO SENC. 12MT	pza	2.00	2.00	-	2.00	55,500.00	-	111,000.00
04-ELECT-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,150.00	-	1,150.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pieza	1.00	1.00	-	1.00	11,500.00	-	11,500.00
SUMA HOJA No. 4							\$	-	335,250.00
TOTAL DE RESUMEN DE FINQUITO							\$		621,777.00
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA			 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN CONTRATISTA			

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 6 DE 24	 RESUMEN DE FINIQUITO SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACIMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT
	MONTO CONTRATADO: \$		621,777.00		PROGRAMA:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA:		10 DE AGOSTO DE 2021		EJERCICIO	FISCAL 2021	

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-3					3.00	3.00		
04-ELECT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 4					1.00	1.00		
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					2.00	2.00		
TOTAL									3.00		pza
TOTAL									1.00		pza
TOTAL									2.00		pza




ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACIMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATÁN
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					1.00	1.00		
								TOTAL	1.00		pza
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-3					5.00	5.00		
								TOTAL	5.00		pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-3					2.00	2.00		
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					2.00	2.00		
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					4.00	4.00		
								TOTAL	4.00		pza

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 8 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACIMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO: \$	621,777.00			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO	FISCAL 2021
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021					

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					1.00	1.00		pza
								TOTAL	4.00		
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					7.00	7.00		pza
								TOTAL	1.00		
04-ELECT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLADR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					8.00	8.00		pza
								TOTAL	7.00		
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					2.00	2.00		pza
								TOTAL	8.00		
								TOTAL	2.00		
								TOTAL	2.00		


ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA


	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 9 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE					OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO			
	PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021	AL 09 DE AGOSTO DE 2021						UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT			
MONTO CONTRATADO: \$ 621,777.00			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO: FISCAL 2021								
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021											
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					4.00	4.00		
								TOTAL	4.00		pza
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					4.00	4.00		
								TOTAL	4.00		pza
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					11.00	11.00		
								TOTAL	11.00		pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					11.00	11.00		
								TOTAL	11.00		pza
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					44.00	44.00		
								TOTAL	11.00		pza



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 10 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACIMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO	
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT	
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.	
	MONTO CONTRATADO: \$	621,777.00			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			EJERCICIO	FISCAL 2021	
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021						

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
TOTAL									44.00		pza
								24.00	24.00		
04-ELECT-023	SUMIMISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
TOTAL									24.00		pza
								6.00	6.00		
TOTAL									6.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 13 DE 24	RESUMEN DE FINIQUITO  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
	PERIODO:	DEL	01 DE JULIO DE 2021		AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL	
		AL	09 DE AGOSTO DE 2021		PEÑASCO	
	MONTO CONTRATADO:	\$	621,777.00		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2021		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					4.00	4.00		
								TOTAL	4.00		pza
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					34.00	34.00		
								TOTAL	34.00		pza
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					9.00	9.00		
								TOTAL	9.00		pza
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					50.00	50.00		
								TOTAL	50.00		pza

 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN CONTRATISTA
--	--	--

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 15 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
AL 09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 621,777.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZACAT
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
										400.00	mL
									2.00		
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
										2.00	kg
								2.00	2.00		
										2.00	pza
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
								2.00	2.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 16 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
AL 09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 621,777.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
Juntos Lo Hacemos Diferente

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3								
TOTAL									2.00		pza
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3					6.00	6.00		
TOTAL									6.00		pza
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3						30.00		
TOTAL									30.00		kg
								6.00	6.00		
TOTAL									6.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 17 DE 24
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
AL 09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 621,777.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACAT
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3						2.00		
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS		POSTE 1-3								
								TOTAL	2.00		kg
								1.00	1.00		
								TOTAL	1.00		pza
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-3		8.00				8.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA

NG. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURÓN
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 21 DE
PERIODO: DEL 01 DE JULIO DE 2021
AL 09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 621,777.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-008
FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2021

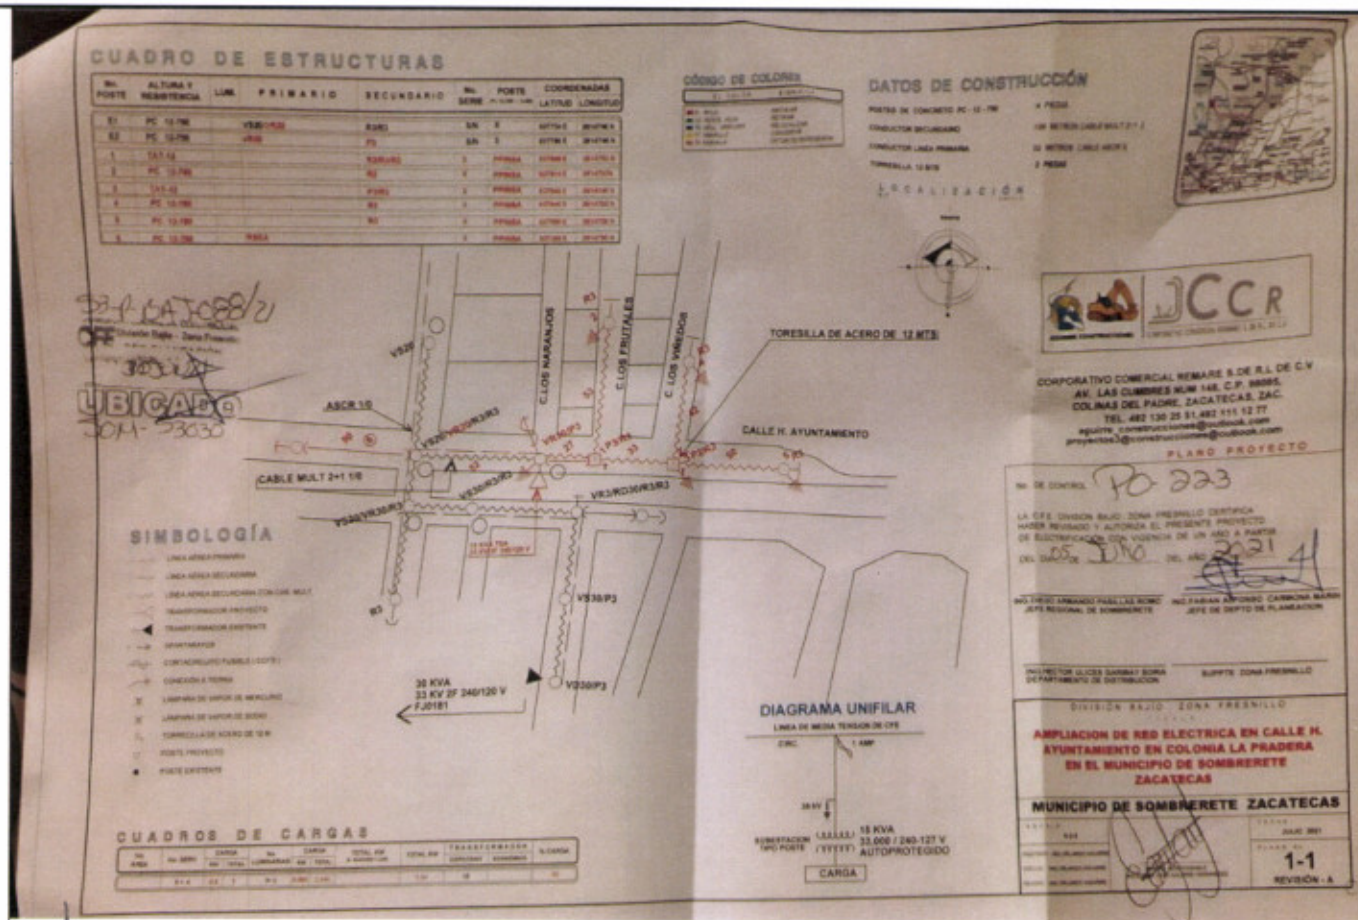
RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PEÑASCO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZACATECAS
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA



ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON
CONTRATISTA
