



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

### RESUMEN DE FINIQUITO



**SOMBRERETE**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: FISCAL 2021

### CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE EL ALAMO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	\$ 559,242.00	\$ 559,242.00	
<b>TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO</b>					<b>\$ 559,242.00</b>	
						FINIQUITO \$482,105.17
						IVA 16% \$77,136.83
						<b>SUBTOTAL \$559,242.00</b>
						<b>DEDUCCIONES:</b>
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						<b>TOTAL \$0.00</b>
						<b>SUBTOTAL \$0.00</b>
						IVA 16% \$0.00
						<b>TOTAL \$0.00</b>

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 167,772.60					<b>RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:</b>
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 167,772.60					ESTIMADO A LA FECHA: \$ 559,242.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$ -					ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -					SALDO POR ESTIMAR \$ -

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 24	 <b>RESUMEN DE FINIQUITO</b> <b>SOMBRERETE</b> M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
	PERIODO:	DEL	03 DE MAYO DE 2021		UBICACIÓN:	EL ALAMO
		AL	11 DE MAYO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	559,242.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	14 DE MAYO DE 2021					

**DESGLOSE DE ESTIMACIÓN**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	lote	6.00	6.00	-	6.00	12,408.10	-	74,448.60
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	5,074.00	-	5,074.00
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	2,190.00	-	13,140.00
04-ELECT-542	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 18"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	139.00	-	556.00
04-ELECT-543	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 16"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	120.40	-	963.20
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	275.00	-	825.00
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 34.5KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	1,073.20	-	6,439.20
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	2,330.00	-	6,990.00
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	340.00	-	3,740.00
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	5.00	5.00	-	5.00	1,073.20	-	5,366.00
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	660.00	-	660.00
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	130.00	-	780.00




SUMA HOJA No. 1 - 118,982.00

 <b>ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA</b> SUPERVISOR DE OBRA	 <b>LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS</b> DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 <b>ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ</b> CONTRATISTA
--	--	--

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 3 DE 24	<b>RESUMEN DE FINIQUITO</b>  <b>SOMBRERETE</b> H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS SOMOS DIFERENTE	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
	PERIODO:	DEL	03 DE MAYO DE 2021		UBICACIÓN:	EL ALAMO
		AL	11 DE MAYO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	559,242.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007		EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:		14 DE MAYO DE 2021	<b>DESGLOSE DE ESTIMACIÓN</b>			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	350.00	-	700.00
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	160.00	-	640.00
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	160.00	-	320.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	7.00	7.00	-	7.00	770.00	-	5,390.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	8.00	8.00	-	8.00	315.00	-	2,520.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	29.00	29.00	-	29.00	130.00	-	3,770.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	36.00	36.00	-	36.00	360.00	-	12,960.00
04-ELECT-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	700.00	-	4,200.00
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	415.00	-	830.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	810.00	-	1,620.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	560.00	-	2,240.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	315.00	-	630.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	360.00	-	720.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	480.00	-	960.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	140.00	-	560.00

<b>SUMA HOJA No. 2</b>	38,060.00
------------------------	-----------

 <b>ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA</b> SUPERVISOR DE OBRA	 <b>LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS</b> DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 <b>ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ</b> CONTRATISTA
--	--	--



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 PERIODO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: FISCAL 2021


**DESGLOSE DE ESTIMACIÓN**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	140.00	140.00	-	140.00	98.00	-	13,720.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	1,430.00	-	2,860.00
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	160.00	-	960.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	140.00	-	2,240.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	130.00	-	780.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	36.00	36.00	-	36.00	130.00	-	4,680.00
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	30.00	30.00	-	30.00	260.00	-	7,800.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	280.00	280.00	-	280.00	250.00	-	70,000.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	330.00	330.00	-	330.00	50.00	-	16,500.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	2.00	2.00	-	2.00	360.00	-	720.00
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	790.00	-	1,580.00
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	400.00	-	800.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	1,200.00	-	7,200.00

SUMA HOJA No. 3 - 129,840.00

  
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 5 DE 24	 <b>RESUMEN DE FINIQUITO</b> <b>SOMBRERETE</b> <small>M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021</small> <small>JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE</small>	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
	PERIODO:	DEL	03 DE MAYO DE 2021		UBICACIÓN:	EL ALAMO
		AL	11 DE MAYO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$	559,242.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007			EJERCICIO:	FISCAL 2021
FECHA:	14 DE MAYO DE 2021					

**DESGLOSE DE ESTIMACIÓN**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	30.00	30.00	-	30.00	760.00	-	22,800.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	11.00	11.00	-	11.00	560.00	-	6,160.00
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	4.00	4.00	-	4.00	750.00	-	3,000.00
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRAMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	1.00	1.00	-	1.00	107,500.00	-	107,500.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	12.00	12.00	-	12.00	300.00	-	3,600.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	16,800.00	-	100,800.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	6.00	6.00	-	6.00	760.00	-	4,560.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	30.00	30.00	-	30.00	75.00	-	2,250.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	pza	1.00	1.00	-	1.00	7,540.00	-	7,540.00
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	pza	1.00	1.00	-	1.00	3,350.00	-	3,350.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	10,800.00	-	10,800.00

SUMA HOJA No. 4 \$ - 272,360.00

**TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO \$ - 559,242.00**

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ  
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJAS DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NUMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 POSTE 4 POSTE 5 POSTE 6				1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00			
<b>TOTAL</b>								<b>6.00</b>		<b>lote</b>	
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-6				1.00	1.00			
<b>TOTAL</b>								<b>1.00</b>		<b>pza</b>	
04-ELECT-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				6.00	6.00			
<b>TOTAL</b>								<b>6.00</b>		<b>pza</b>	

  
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-542	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 18"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				4.00	4.00			
								TOTAL		4.00	pza
04-ELECT-543	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 16"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				8.00	8.00			
								TOTAL		8.00	pza
04-ELECT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				3.00	3.00			
								TOTAL		3.00	pza
04-ELECT-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 34.5KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				6.00	6.00			
								TOTAL		6.00	pza
04-ELECT-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				3.00	3.00			

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6								
<b>TOTAL</b>									3.00		pza
04-ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				11.00	11.00			
<b>TOTAL</b>									11.00		pza
04-ELECT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				5.00	5.00			
<b>TOTAL</b>									5.00		pza
04-ELECT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				1.00	1.00			
<b>TOTAL</b>									1.00		pza
							6.00	6.00			
<b>TOTAL</b>									6.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA





ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



**SOMBRERETE**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-448	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
<b>TOTAL</b>								<b>2.00</b>		<b>pza</b>	
04-ELECT-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				4.00	4.00			
<b>TOTAL</b>								<b>4.00</b>		<b>pza</b>	
04-ELECT-016	SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
<b>TOTAL</b>								<b>2.00</b>		<b>pza</b>	
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				7.00	7.00			
<b>TOTAL</b>								<b>7.00</b>		<b>pza</b>	
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				8.00	8.00			
<b>TOTAL</b>								<b>8.00</b>		<b>pza</b>	

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 10 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6								
<b>TOTAL</b>									8.00		pza
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6								
<b>TOTAL</b>									29.00		pza
<b>TOTAL</b>									36.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 11 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021




OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-023	SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				6.00	6.00			
								TOTAL		6.00	pza
04-ELECT-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza

  
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 12 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NUMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-6				4.00	4.00			
								TOTAL	4.00		pza
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL	2.00		pza
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				4.00	4.00			
								TOTAL	4.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 13 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

### RESUMEN DE FINIQUITO



**SOMBRERETE**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

### NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6		140.00			140.00	140.00		
								<b>TOTAL</b>	<b>140.00</b>		<b>ml</b>
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					2.00	2.00		
								<b>TOTAL</b>	<b>2.00</b>		<b>pza</b>
04-ELECT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					6.00	6.00		
								<b>TOTAL</b>	<b>6.00</b>		<b>pza</b>
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					16.00	16.00		
								<b>TOTAL</b>	<b>16.00</b>		<b>pza</b>

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 14 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				6.00	6.00			
<b>TOTAL</b>									6.00		pza
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				36.00	36.00			
<b>TOTAL</b>									36.00		pza
04-ELECT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					30.00			

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 15 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6		280.00						
<b>TOTAL</b>									30.00		kg
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6		330.00				280.00	280.00	
<b>TOTAL</b>									280.00		ml
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					2.00	2.00	2.00	
<b>TOTAL</b>									330.00		ml

  
 ARG. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 16 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



**SOMBRERETE**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6								
								TOTAL		2.00	kg
04-ELECT-042	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				2.00	2.00			
								TOTAL		2.00	pza
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				6.00	6.00			
								TOTAL		6.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA





ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 17 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NUMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6						30.00		
								<b>TOTAL</b>		<b>30.00</b>	<b>kg</b>
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6				11.00	11.00			
								<b>TOTAL</b>		<b>11.00</b>	<b>pza</b>
04-ELECT-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					4.00			

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 18 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-048	SUMINISTRO E INALACIONE DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS		POSTE 1-6								
									TOTAL	4.00	kg
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6		12.00			1.00		1.00	
									TOTAL	1.00	pza
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6							12.00	
									TOTAL	12.00	ml
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					6.00		6.00	
									TOTAL	6.00	pza
								6.00		6.00	

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA





ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 20 DE 24  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

**RESUMEN DE FINIQUITO**



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD				
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL					
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1-6					1.00	1.00		pza				
												TOTAL		1.00	
												TOTAL		1.00	
												TOTAL		1.00	

  
 ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 21 DE  
 PERIODO: DEL 03 DE MAYO DE 2021  
 AL 11 DE MAYO DE 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$ 559,242.00  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007  
 FECHA: 14 DE MAYO DE 2021

# RESUMEN DE FINIQUITO

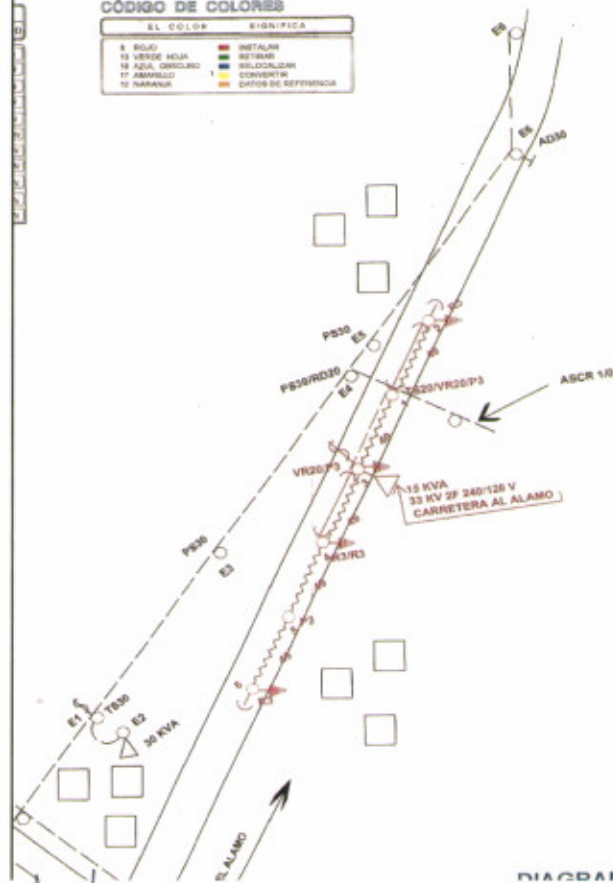


OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL  
 UBICACIÓN: EL ALAMO  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO FISCAL 2021

## CROQUIS DE OBRA

### CÓDIGO DE COLORES

EL COLOR	SIGNIFICA
ROJO	INSTALAR
VERDE OSCURO	RETIRAR
AZUL OSCURO	SELECCIONAR
AMARILLO	CONVERTIR
NARANJA	DATOS DE REFERENCIA



### DATOS DE CONSTRUCCIÓN

FUENTES DE CONCRETO PC-12-70  
 TRANSFORMADORES T01-15-3000  
 CIRCUNTO  
 VOLTAJE DE OPERACIÓN  
 SISTEMA  
 CALIBRE DEL CONDUCTOR PRIMARIO  
 CALIBRE DEL CONDUCTOR SECUNDARIO  
 LONGITUD DE LÍNEA PRIMARIA  
 LONGITUD DE LA LÍNEA SECUNDARIA  
 CONDUCTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

4 PIEDAS  
 1 PIEDAS  
 33 KV  
 27-24  
 27-24-AC95-10  
 27-40-2+1.25-2 cables cada uno  
 48 MTS  
 285 MTS  
 42 (1) 1.5 cables cada uno



### LOCALIZACIÓN



CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S.DE RL DE C.V  
 AV. LAS CUMBRES NUM 148, C.P. 98085,  
 COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC.  
 TEL. 492 130 25 51,492 111 12 77  
 aguirre\_construcciones@outlook.com  
 proyectos3@construcciones@outlook.com



### PLANO PROYECTO

No. DE CONTROL PO-128 DISPROTER

LA C.F.E. DIVISION BAJO : ZONA FRESNILLO CERTIFICA  
 HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO  
 DE ELECTRIFICACIÓN CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR:

DEL DÍA 21 DE Abril DEL AÑO 2021

ING. FERNANDO TORRES CHAIREZ  
 JEFE REGIONAL DE SOMBRERETE

ING. FERNAN ALFONSO CARMONA MARRIN  
 JEFE DE DEPTO DE PLANEACION

ING. HECTOR ULIDES GARIBAY SORIA  
 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

ING. ALFREDO SALMERON MAGANA  
 SUPPTE ZONA FRESNILLO

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA  
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ  
 CONTRATISTA
