



ESTIMACIÓN: FIN HOJA 1 DE 11
 PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-03
 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021

FINIQUITO

DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
 UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA
 MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021


CARATULA DE ESTIMACIÓN



RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA								
CLAVE	CONCEPTO		CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
01	PRELIMINARES		1	LOTE	\$ 19,412.65	\$ 22,518.67		
02	CIMENTACION		1	LOTE	\$ 81,641.70	\$ 94,704.37		
03	ESTRUCTURA METALICA		1	LOTE	\$ 908,032.14	\$1,053,317.28		
04	ACABADOS		1	LOTE	\$ 25,555.00	\$ 29,643.80		
05	INSTALACION ELECTRICA		1	LOTE	\$ 47,223.00	\$ 54,778.68		
06	TABLERO MULTIUSOS		1	LOTE	\$ 59,140.00	\$ 68,602.40		
07	PISOS		1	LOTE	\$ 229,685.16	\$ 266,434.79		
			TOTAL DE FINIQUITO		\$1,590,000.00		FINIQUITO \$1,370,689.65	
							IVA 16% \$219,310.34	
							SUBTOTAL \$1,590,000.00	
							AMORT. DE ANTICIPO	
							TOTAL	
							SUBTOTAL	
							IVA 16%	
							TOTAL	
ANTICIPO OTORGADO:		\$ 477,000.00					RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 477,000.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,590,000.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER \$ -

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
 ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
 CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN: FIN	HOJA 2 DE 11	FINIQUITO DESARROLLO SOCIAL				OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES			
	PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020						UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA			
	MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00						MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-03						PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021			
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021							EJERCICIO FISCAL 2021			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
01	PRELIMINARES									
01-PRE-023	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA	M2	724.50	724.50	0.00	724.50	\$ 15.00	\$ -	\$ 10,867.50	
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	55.13	55.13	0.00	55.13	\$ 155.00	\$ -	\$ 8,545.15	
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$ 19,412.65	
02	CIMENTACION									
01-PRE-024	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	39.38	39.38	0.00	39.38	\$ 270.00	\$ -	\$ 10,631.25	
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO,	M2	26.25	26.25	0.00	26.25	\$ 190.00	\$ -	\$ 4,987.50	
02-CIM-013	ZAPATA DE 1.75X1.25 MTS., DE 0.15 MTS DE PERALTE CON 0.12 MTS. DE BOMBEO CON VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") @ 15 CMS. EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CMS. EN EL LADO CORTO Y CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 21,600.00	
03-ALB-048	COLUMNA DADO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 MTS. A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIÁMETRO Y 2 VARILLAS # 4 (1/2") DE DIÁMETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS. Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS	ML	15.60	15.60	0.00	15.60	\$ 2,650.00	\$ -	\$ 41,340.00	
02-CIM-014	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	M3	30.23	30.23	0.00	30.23	\$ 102.00	\$ -	\$ 3,082.95	
	TOTAL DE CIMENTACION							\$ -	\$ 81,641.70	
	ESTRUCTURA METALICA									
E-ACERO-0	ANCLA DE 3/4", A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS., EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO.	PZA	72.00	72.00	0.00	72.00	\$ 265.00	\$ -	\$ 19,080.00	
E-ACERO-0	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 722.00	\$ -	\$ 8,664.00	
E-ACERO-0	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,725.25	\$ -	\$ 20,703.00	
	TOTAL DE ESTRUCTURA METALICA							\$ -	\$ 48,447.00	
SUMA HOJA No. 01							\$	-	\$ 149,501.35	
										
ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA		L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		ING. GABRIEL HIDALGO SILVA CONTRATISTA						

	ESTIMACIÓN: FIN	HOJA 3 DE 11	FINIQUITO 				OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES			
	PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020						UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA			
	MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00						MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-03						PROGRAMA: MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021			
	FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021						EJERCICIO FISCAL 2021			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
03	ESTRUCTURA METALICA									
19-E-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 KG/M) INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LUJADO.	KG	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	\$ 68.53	\$ -	\$ 139,801.20	
19-E-ACERO-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" X 28.50 MTS. CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	KG	3,102.42	3,102.42	0.00	3,102.42	\$ 70.25	\$ -	\$ 217,945.01	
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL. 14., CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" @ 1.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	KG	3,087.18	3,087.18	0.00	3,087.18	\$ 69.35	\$ -	\$ 214,095.93	
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PUJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO.	M2	845.00	845.00	0.00	845.00	\$ 315.00	\$ -	\$ 266,175.00	
19-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PUJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	64.00	64.00	0.00	64.00	\$ 337.00	\$ -	\$ 21,568.00	
	TOTAL DE ESTRUCTURA METALICA						\$ -	\$ -	\$ 859,585.14	
	ACABADOS									
05-ACAB-016	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN SEGÚN INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 25,555.00	\$ -	\$ 25,555.00	
	TOTAL DE ACABADOS						\$ -	\$ -	\$ 25,555.00	
	INSTALACION ELECTRICA									
06-LELE-009	SALIDA PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12, CON TRES CAJAS CONDUIT T-19, T-29 SERIE 9, Y UNA FS-1 DE 13 MM; INCLUYE: CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS DE UÑA, APAGADOR Y CAJA DE REGISTRO DE 1/2"	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,755.25	\$ -	\$ 21,063.00	
06-LELE-010	LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL, MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA, DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40, INCLUYE LAMPARA TIPO HEL-80W/65-120/PH DE 80 W Y 100-127 VOLTS.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 2,180.00	\$ -	\$ 26,160.00	
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$ -	\$ -	\$ 47,223.00	
SUMA HOJA No. 02							\$ -	\$ -	\$ 932,363.14	
ACUMULADO							\$ -	\$ -	\$ 1,081,864.49	
 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 ING. GABRIEL HIDALGO SILVA CONTRATISTA				

GABRIEL HIDALGO S.
ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA



	ESTIMACIÓN: FIN HOJA 5 DE 11 PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-03 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021	FINIQUITO DESARROLLO SOCIAL			OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2021						
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-023	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA	1-2	A-B	TRAZO	18.00	40.25			724.50	724.50	M2

	ESTIMACIÓN: FIN HOJA 6 DE 11	FINIQUITO DESARROLLO SOCIAL				OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES					
	PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020					UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA					
	MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00					MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.					
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-03						PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021						EJERCICIO FISCAL 2021					
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-ALB-048	COLUMNA DADO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 MTS., A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIÁMETRO Y 2 VARILLAS # 4 (1/2") DE DIÁMETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS., Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS	1-2	A-B	PLANT	15.60				15.60	15.60	ML
						TOTAL			15.60		ML
02-CIM-014	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	1-2	A-B	RELLENO	18.00	1.68			30.23	30.23	M3
						TOTAL			30.23		M3
19-E-ACERO-001	ANCLA DE 3/4", A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS., EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO.	1-2	A-B	ANCLA				72.00	72.00	72.00	PZA
						TOTAL			72.00		PZA
19-E-ACERO-002	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	1-2	A-B	RELLENO				12.00	12.00	12.00	PZA
						TOTAL			12.00		PZA
19-E-ACERO-003	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	1-2	A-B	ANCLA				12.00	12.00	12.00	PZA
						TOTAL			12.00		PZA
19-E-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 KG/M) INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO.	1-2	A-B	PLACA				2,040.00	2,040.00	2,040.00	KG
						TOTAL			2,040.00		KG

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA

	ESTIMACIÓN: FIN	HOJA 7 DE 11	FINIQUITO 					OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021 EJERCICIO FISCAL 2021			
	PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020								MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFRA-2021-03 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021		
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
19-E-ACERO-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" X 28.50 MTS. CAL. 14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES INCLUYE: MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	1-2	A-B	ARM				3,102.42	3,102.42	3,102.42	KG
								TOTAL	3,102.42		KG
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL. 14, CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"x1/4" @ 1.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, TRAZO, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	1-2	A-B	LARG				3,087.18	3,087.18	3,087.18	KG
								TOTAL	3,087.18		KG
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO	1-2	A-B	LAMINA	18.00	46.94			845.00	845.00	M2
								TOTAL	845.00		M2
19-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	1-2	A-B	CANALON		64.00			64.00	64.00	ML
								TOTAL	64.00		ML
05-ACAB-016	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN SEGÚN INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.	1-2	A-B	PINTURA				1.00	1.00	1.00	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
06-IELE-009	SALIDA PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL. 12, CON TRES CAJAS CONDULET T-19, T-29 SERIE 9, Y UNA FS-1 DE 13 MM; INCLUYE: CONECTORES, COPLES, ABRAZADERAS DE UÑA, APAGADOR Y CAJA DE REGISTRO DE 1/2".	1-2	A-B	ALUMBR				0.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL	0.00		PZA
 ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. GABRIEL HIDALGO SILVA CONTRATISTA											

GABRIEL HIDALGO S.
ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FIN HOJA 09 DE 11

PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-03

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021

FINIQUITO

DESARROLLO SOCIAL

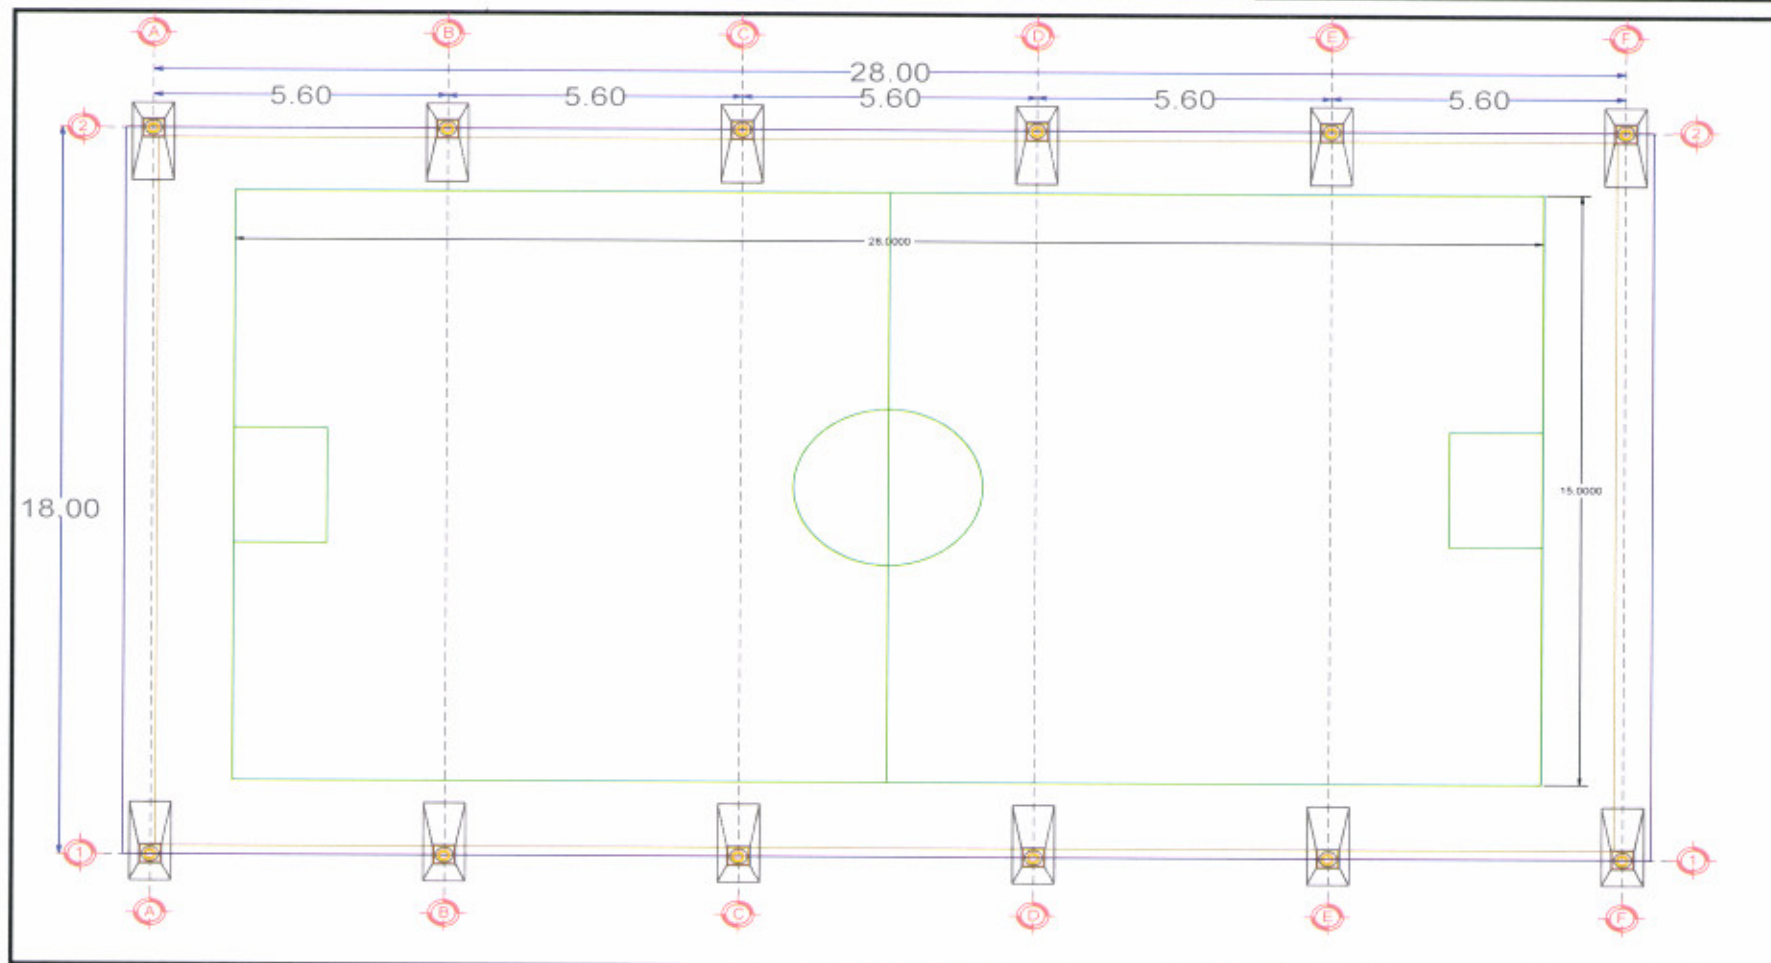
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FIN HOJA 10 DE 11
PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-03
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021

FINIQUITO



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS. C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FIN HOJA 11 DE 11
PERIODO: DEL 05 DE ABRIL 2020 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 1,590,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-03
FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2021

FINIQUITO



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

UBICACIÓN: COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV) 2021
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

GABRIEL HIDALGO S.
ING. GABRIEL HIDALGO SILVA
CONTRATISTA
