


	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 1 DE 8	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO
	PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021			UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL.
	MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009			PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021			EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN						
------------------------	--	--	--	--	--	--

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	
	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 686,083.80	\$ 686,083.80	
	DRENAJE/AGUA POTABLE	1	LOTE	\$ 39,550.00	\$ 39,550.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 893,633.80	
						FINIQUITO \$770,373.97
						IVA 16% \$123,259.83
						SUBTOTAL \$893,633.80
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 268,090.14				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 268,090.14				ESTIMADO A LA FECHA: \$ 893,633.80
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -				ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -				SALDO POR EJERCER \$ -

 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 C. JUAN MANCILLAS HAROS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
---	---	---

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 2 DE 8	RESUMEN DE FINIQUITO				OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO			
	PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021						UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA			
	MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80						MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009						PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021						EJERCICIO FISCAL 2021			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
01	PRELIMINARES									
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	m2	1,036.00	1,036.00	0.00	1,036.00	\$ 7.00	\$ -	\$ 7,252.00	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	m3	311.00	311.00	0.00	311.00	\$ 348.00	\$ -	\$ 108,228.00	
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	404.00	404.00	0.00	404.00	\$ 130.00	\$ -	\$ 52,520.00	
	TOTAL DE PRELIMINARES						\$ -	\$ -	\$ 168,000.00	
	PAVIMENTACIÓN									
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	m3	310.80	310.80	0.00	310.80	\$ 246.00	\$ -	\$ 76,456.80	
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	ml	175.00	175.00	0.00	175.00	\$ 380.00	\$ -	\$ 66,500.00	
11-O-EXT-003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	285.00	285.00	0.00	285.00	\$ 360.00	\$ -	\$ 102,600.00	
11-O-EXT-006	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m2	751.00	751.00	0.00	751.00	\$ 565.00	\$ -	\$ 424,315.00	
11-O-EXT-007	LETREDO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ml	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 232.00	\$ -	\$ 3,712.00	
09-HERR-022		pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	
	TOTAL DE PAVIMENTACIÓN						\$ -	\$ -	\$ 686,083.80	
SUMA HOJA No. 01							\$ -	\$ -	\$ 854,083.80	
 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  C. JUAN MANCILLAS HAROS SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION										



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 8
PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO
UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
DRENAJE/AGUA POTABLE									
01-PRE-003	CONEXIÓN PARA VIVIENDA MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANGUERA KITEC A BASE DE ALUMINIO.	pza	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 775.00	\$ -	\$ 7,750.00
03-ALB-019	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE , CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SILLETAS CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 3,180.00	\$ -	\$ 31,800.00
TOTAL DE DRENAJE/AGUA POTABLE								\$ -	\$ 39,550.00
SUMA HOJA No. 02								\$ -	\$ 39,550.00
TOTAL DE FINIQUITO								\$ -	\$ 893,633.80

ARQ. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 4 DE 8	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO							
	PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021			UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNI							
	MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.							
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009			PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021				EJERCICIO FISCAL 2021							
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-4	A-B	LIMP	96.91	10.6900			1036.00	1036.00	m2
TOTAL									1,036.00		m2
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.	1-4	A-B	EXCAV	96.90	10.6900	0.30022		311.00	311.00	m3
TOTAL									311.00		m3
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4	A-B	ACARREO	96.90	10.6900	0.390000		404.00	404.00	m3
TOTAL									404.00		m3
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	2-3	A-B	RELLENO	96.90	10.69	0.30		310.80	310.80	m3
TOTAL									310.80		m3
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS. INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2	A-B	GUARNICION	87.50				87.50	87.50	ml
		3	A-B	GUARNICION	87.50				87.50	87.50	ml
TOTAL									175.00		ml
11-O-EXT-003	BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	1-2	A-B	BANQUET	106.00	1.454080			154.13	154.13	m2
		3-4	A-B	BANQUET	90.00	1.454080			130.87	130.87	m2
TOTAL									285.00		m2
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-B	PAVIMEN	107.285714	7.00			751.00	751.00	m2
TOTAL									751.00		m2
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	1-4	A-B	TOPE	16.00				16.00	16.00	ml
TOTAL									16.00		ml
09-HERR-022	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-4	A-B	LETRERO			1.00		1.00	1.00	pza
							TOTAL		1.00		pza



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 8
PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO
UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA M
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

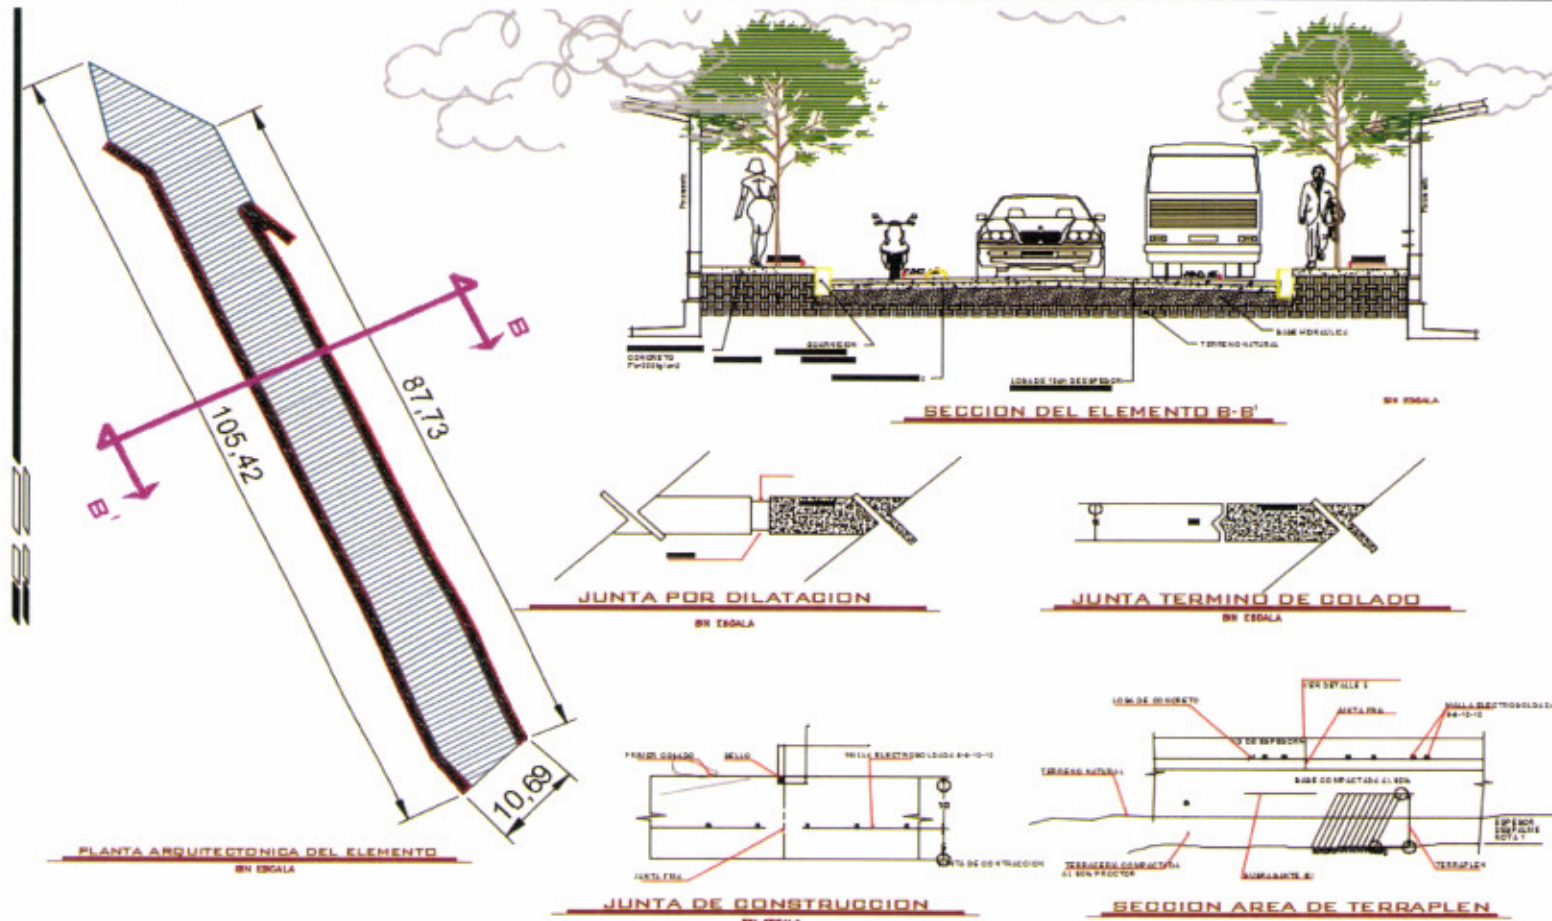

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 8

PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 893,633.80

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO

UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA M

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 8
PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021
MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-009
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PATRIOTISMO
UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACIÓN LÓPEZ MATEOS, CABECERA M
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
