



ESTIMACIÓN: 03 HOJA 1 DE 10
 PERIODO: DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,500,000.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-05
 FECHA: 04 DE OCTUBRE 2021

FINIQUITO



OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)
 EJERCICIO FISCAL 2021



CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 213,643.90	\$ 213,643.90	
02	CIMENTACION	1	LOTE	\$ 243,065.00	\$ 243,065.00	
03	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$ 8,707.30	\$ 8,707.30	
04	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 731,917.00	\$ 731,917.00	
05	ACABADOS	1	LOTE	\$ 2,644.80	\$ 2,644.80	
06	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	
07	OBRA EXTERIOR	1	LOTE	\$ 180,022.00	\$ 180,022.00	
		TOTAL DE FINIQUITO			\$1,500,000.00	FINIQUITO \$1,293,103.45
						IVA 16% \$206,896.55
						SUBTOTAL \$1,500,000.00
						AMORT. DE ANTICIPO
						TOTAL
						SUBTOTAL
						IVA 16%
						TOTAL
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 450,000.00					RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 450,000.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,500,000.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER \$ -

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

	ESTIMACIÓN: 03	HOJA 2 DE 10	FINIQUITO 				OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"			
	PERIODO: DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021						UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL			
	MONTO CONTRATADO: \$ 1,500,000.00						MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-05						PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)			
	FECHA: 04 DE OCTUBRE 2021						EJERCICIO FISCAL 2021			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
01	PRELIMINARES									
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	\$ 14.00	\$ -	\$ 19,110.00	
01-PRE-007	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	156.73	156.73	0.00	156.73	\$ 150.00	\$ -	\$ 23,509.50	
01-PRE-017	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	M2	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 102,000.00	
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	306.87	306.87	0.00	306.87	\$ 120.00	\$ -	\$ 36,824.40	
04-ELECT-53	RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE CFE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: TRASLADO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,300.00	\$ -	\$ 6,300.00	
03-ALB-122	CORTE DE PISO CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE DISCO	ML	740.00	740.00	0.00	740.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 25,900.00	
	TOTAL DE PRELIMINARES							\$ -	\$ 213,643.90	
02	CIMENTACION									
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.	M2	27.00	27.00	0.00	27.00	\$ 135.00	\$ -	\$ 3,645.00	
03-ALB-118	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	86.00	86.00	0.00	86.00	\$ 820.00	\$ -	\$ 70,520.00	
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.	M3	650.00	650.00	0.00	650.00	\$ 225.00	\$ -	\$ 146,250.00	
02-CIM-020	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE 1.20X1.20 CMS, 0.25 CMS ESPESOR, CON VARILLAS DEL No 4 (1/2") @ 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS, REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No 3 (3/8") @ 0.20 CMS, CONCRETO DE F'C=250KG/CM2, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 5,850.00	
03-ALB-049	COLUMNA DADO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 MTS, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIÁMETRO Y 2 VARILLAS # 4 (1/2") DE DIÁMETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS, Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBO DEL # 2 @ 0.20 MTS	ML	3.20	3.20	0.00	3.20	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 12,480.00	
03-ALB-016	LOSA DE CONCRETO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL NO 3, (3/8" DE Ø), F'C= 250 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO 38MM, CURADO CON AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.20	1.20	0.00	1.20	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,440.00	
03-ALB-072	FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO F'C=200KGS/CM2 DE 0.10 CMS DE ESPESOR DE RAMPA, ESCALON DE 0.15 CMS DE PERALTE Y 0.30 CMS DE HUELLA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	7.20	7.20	0.00	7.20	\$ 400.00	\$ -	\$ 2,880.00	
	TOTAL DE CIMENTACION							\$ -	\$ 243,065.00	
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 456,708.90	
 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS										



ESTIMACIÓN: 03 HOJA 3 DE 10
PERIODO: DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,500,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-05
FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2021

FINIQUITO

DESARROLLO SOCIAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)
EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
03	ALBAÑILERIA								
19-E-ACERO-003	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,548.90	\$ -	\$ 2,548.90
03-ALB-008	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 14X21 CMS ARMADA C/4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15 CMS INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 2,100.00
03-ALB-002	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.	M2	9.12	9.20	0.00	9.12	\$ 445.00	\$ -	\$ 4,058.40
	TOTAL DE ALBAÑILERIA						\$ -	\$ -	\$ 8,707.30
04	PAVIMENTACION								
11-O-EXT-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	424.00	424.00	0.00	424.00	\$ 420.00	\$ -	\$ 178,080.00
11-O-EXT-016	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN COLOR TABIQUE (014) MODELO DE ESTAMPADO TIPO ABANICO M-011 INCLUYE: PAVIMENTO, ESTAMPADO, COLOR, APLICACION DE SELLADOR TIPO SA25-003, HERRAMIENTA.	M2	370.00	370.00	0.00	370.00	\$ 749.00	\$ -	\$ 277,130.00
11-O-EXT-029	PISO FIRME OXIDADO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO DE 200MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSLDADA 6-10/10, ACABADO OXIDADO. INCLUYE DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.40	32.40	0.00	32.40	\$ 720.00	\$ -	\$ 23,328.00
20-ASF-003	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICODE 3CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 100% P.U.O.T.	M3	51.71	51.71	0.00	51.71	\$ 4,900.00	\$ -	\$ 253,379.00
	TOTAL DE PAVIMENTACION						\$ -	\$ -	\$ 731,917.00
05	ACABADOS								
05-ACA-003	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 DE PROPORCIÓN, EN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 4.0 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO.	M2	9.12	9.12	0.00	9.12	\$ 290.00	\$ -	\$ 2,644.80
	TOTAL DE ACABADOS						\$ -	\$ -	\$ 2,644.80
SUMA HOJA No. 02							\$ -	\$ -	\$ 743,269.10
ACUMULADO							\$ -	\$ -	\$ 1,199,978.00

ARQ. LUIS ANTONIO BÉNTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

	ESTIMACIÓN:	03	HOJA 05 DE 10	FINIQUITO				OBRA:	"CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"				
	PERIODO:	DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021							UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL			
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,500,000.00						MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-D05-FIV-INF-BASIC-2021-05							PROGRAMA:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
FECHA:				04 DE OCTUBRE 2021				EJERCICIO FISCAL 2021					
NÚMEROS GENERADORES													
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD		
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL			
01-PRE-004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	1-2	A-B	TRAZO	2.00		682.50		1,365.00	1,365.00	M2		
TOTAL									1,365.00		M2		
01-PRE-007	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	EXCAVACION	1.00	156.73			156.73	156.73	M3		
TOTAL									156.73		M3		
01-PRE-017	DEMOLICIÓN DE FIRMES HASTA 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	1-2	A-B	DEMOLICION	4.00	255.00			1,020.00	1,020.00	M3		
TOTAL									1,020.00		M3		
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B	ACARREO	4.00	4.00	19.18		306.87	306.87	M3		
TOTAL									306.87		M3		
04-ELECT-534	RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE CFE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: TRASLADO	1-2	A-B	RETITO	0.43	2.30			1.00	1.00	PZA		
TOTAL									1.00		PZA		
03-ALB-122	CORTE DE PISO CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE DISCO	1-2	A-B	CORTE	740.00				740.00	740.00	ML		
TOTAL									740.00		ML		
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.		A-B	PLATILLA	4.50	6.00			27.00	27.00	M2		
TOTAL									27.00		M2		

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS


	ESTIMACIÓN:	03	HOJA 06 DE 10	FINIQUITO DESARROLLO SOCIAL				OBRA:	"CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"			
	PERIODO:	DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021						UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL			
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,500,000.00					MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-05						PROGRAMA:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
FECHA:	04 DE OCTUBRE 2021						EJERCICIO FISCAL 2021					
NÚMEROS GENERADORES												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD	
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL		
03-ALB-118	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B	MURO	71.67	0.00	1.20		86.00	86.00	M2	
							TOTAL		86.00		M2	
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	1-2	A-B	RELLENO	282.61	2.30			650.00	650.00	M3	
							TOTAL		650.00		M3	
02-CIM-020	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE 1.20X1.20 CMS.0.25 CMS ESPESOR,CON VARILLAS DEL No.4 (1/2")@ 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS, REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL No.3 (3/8")@0.20 CMS, CONCRETO DE	1-2	A-B	ZAPATA	4.00	0.25			1.00	1.00	PZA	
							TOTAL		1.00		PZA	
03-ALB-049	COLUMNA DADO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 MTS. A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS # 5 (5/8") DE DIÁMETRO Y 2 VARILLAS # 4 (1/2") DE DIÁMETRO, ESTRIBOS DEL # 3 @ 0.15 MTS. Y UN	1-2	A-B	COLUMNA	3.50	0.91			3.20	3.20	ML	
							TOTAL		3.20		ML	
03-ALB-016	LOSA DE CONCRETO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DEL NO 3, (3/8" DE Ø), F'C= 250 KG/CM2 CON AGREGADO	1-2	A-B	LOSA	0.52	2.30			1.20	1.20	M2	
							TOTAL		1.20		M2	
03-ALB-072	FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 0.10 CMS DE ESPESOR DE RAMPA, ESCALON DE 0.15 CMS DE PERALTE Y 0.30 CMS DE HUELLA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B	ESCALINATA	7.20			0.00	7.20	7.20	ML	
							TOTAL		7.20		ML	
19-E-ACERO-003	PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45 MTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN.	1-2	A-B	PLACA				1.00	1.00	1.00	PZA	
							TOTAL		1.00		PZA	
03-ALB-008	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 14X21 CMS ARMADA C/4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15 CMS INCLUYE CIMBRA	1-2	A-B	CASTILLO	6.00			0.00	6.00	6.00	ML	
							TOTAL		6.00		ML	

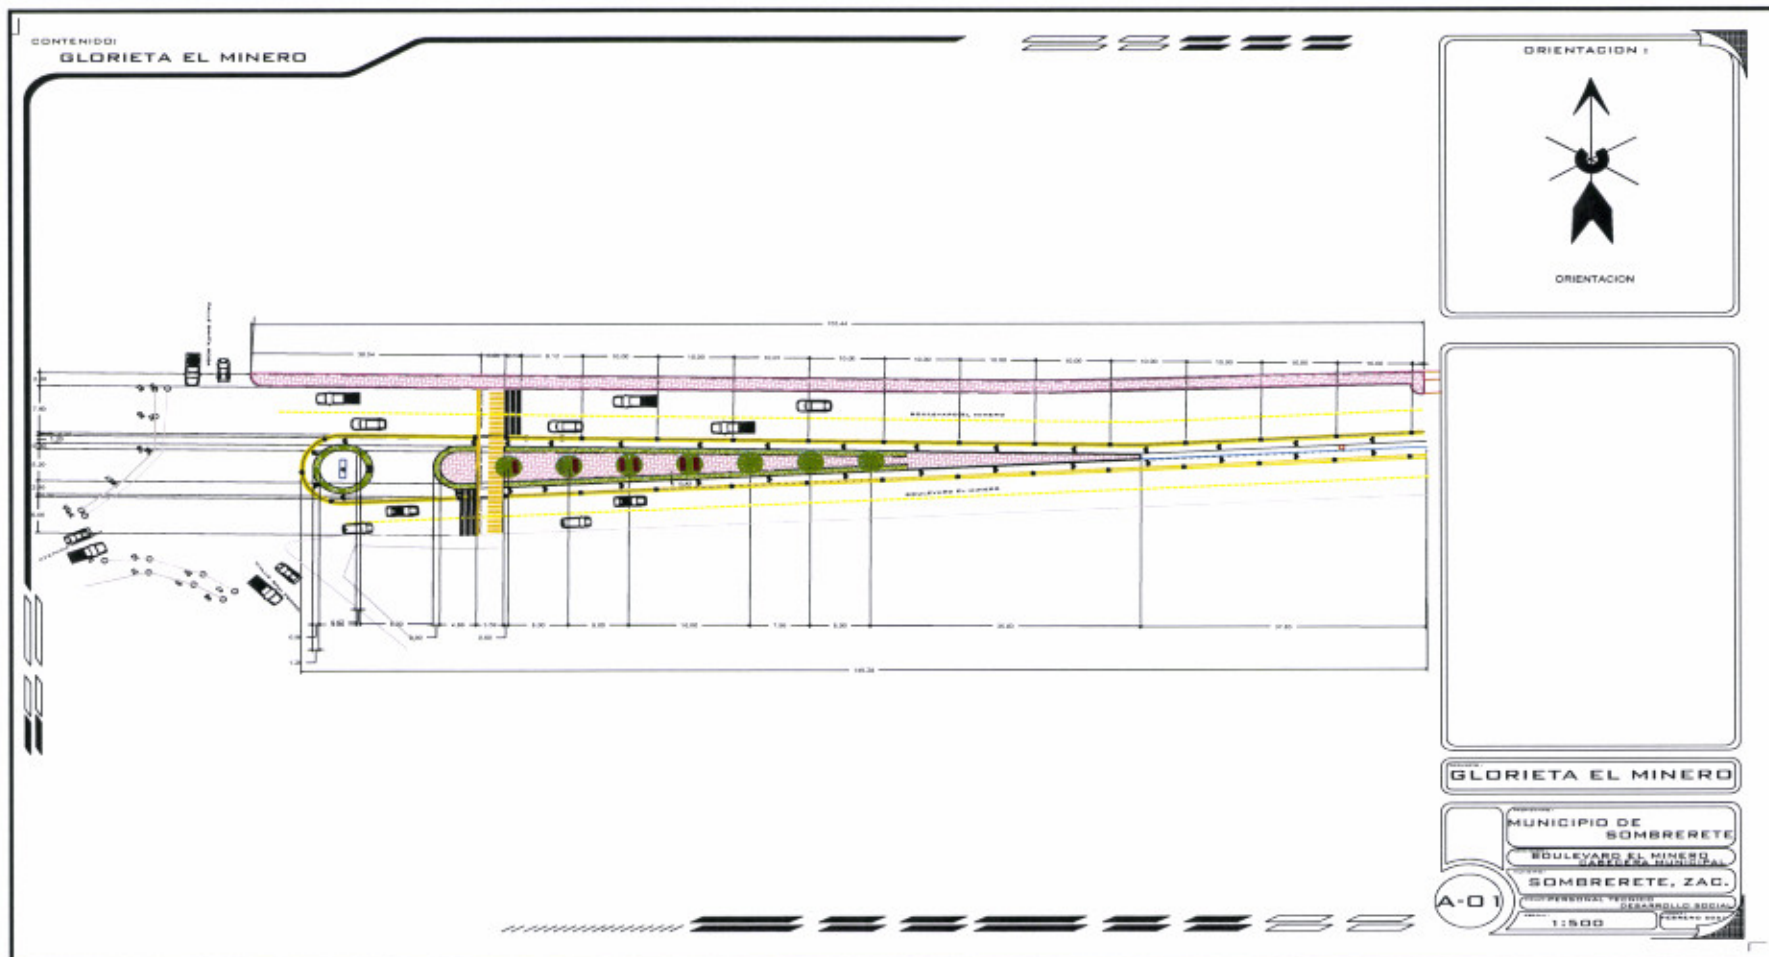
ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

	ESTIMACIÓN:	3	HOJA 08 DE 10	FINQUITO 	OBRA:	"CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"
	PERIODO:	DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021			UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,500,000.00		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-05			PROGRAMA:	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)
FECHA:	04 DE OCTUBRE 2021		CROQUIS DE OBRA			EJERCICIO FISCAL 2021



 ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
---	---	---



ESTIMACIÓN: 3 HOJA 09 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 1,500,000.00

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFASIC-2021-05

FECHA: 04 DE OCTUBRE 2021

FINIQUITO

DESARROLLO SOCIAL

OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BEMÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS



ESTIMACIÓN: 3 HOJA 10 DE 10
PERIODO: DEL 31 DE MAYO DEL 2021 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 1,500,000.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INF-BASIC-2021-05
FECHA: 04 DE OCTUBRE 2021

FINIQUITO

DESARROLLO SOCIAL

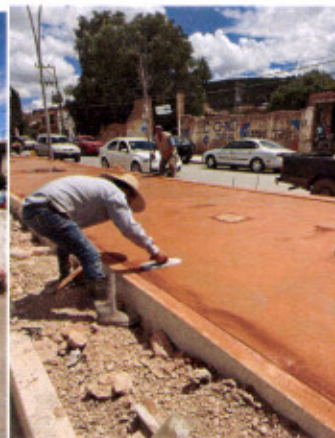
OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO"

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN O FONDO IV)
EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
