

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
 PERIODO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 94,800.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-007
 FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES
 UBICACIÓN ALFREDO V. BONFIL
 MUNICIPIO SOMBRETERE, ZAC.
 PROGRAM/ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES	1	LOTE	\$ 94,800.00	\$ 94,800.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 94,800.00	

FINIQUITO	\$81,724.14
IVA 16%	\$13,075.86
SUBTOTAL	\$94,800.00
DEDUCCIONES:	
AMORT. DE ANTICIPO	\$0.00
TOTAL	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 28,440.00			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 28,440.00			ESTIMADO A LA FECHA: \$ 94,800.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00			ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -			SALDO POR EJERCER \$ -

Yesica Coronado Estupiñan.
 C. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. Jaime Arturo Viedma Ceceñas
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. Jesus Rojas Zuñiga
 C. JESUS ROJAS ZUÑIGA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6
 PERIODO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021
 MONTO CONTRATADO: \$ 94,800.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-007
 FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES
 UBICACIÓN: ALFREDO V. BONFIL
 MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
10-M-BA-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA ECOTEMPER, ACERO INOXIDABLE, ALTURA EN TANQUE DE 1.10 Y 12 TUBOS , BARRA DE MAGNECIO, INSTALADO CON TUBERIA DE POLIPROPILENO 3/4"	pza	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 7,900.00	\$ -	\$ 94,800.00
								\$	\$ 94,800.00
SUMA HOJA No. 01								\$	\$ 94,800.00

Yesica Coronado Estupiñan.
 C. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. Jaime Arturo Viedma Ceceñas
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

 C. JESUS ROJAS ZUÑIGA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 94,800.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-007
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES
UBICACIÓN: ALFREDO V. BONFIL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

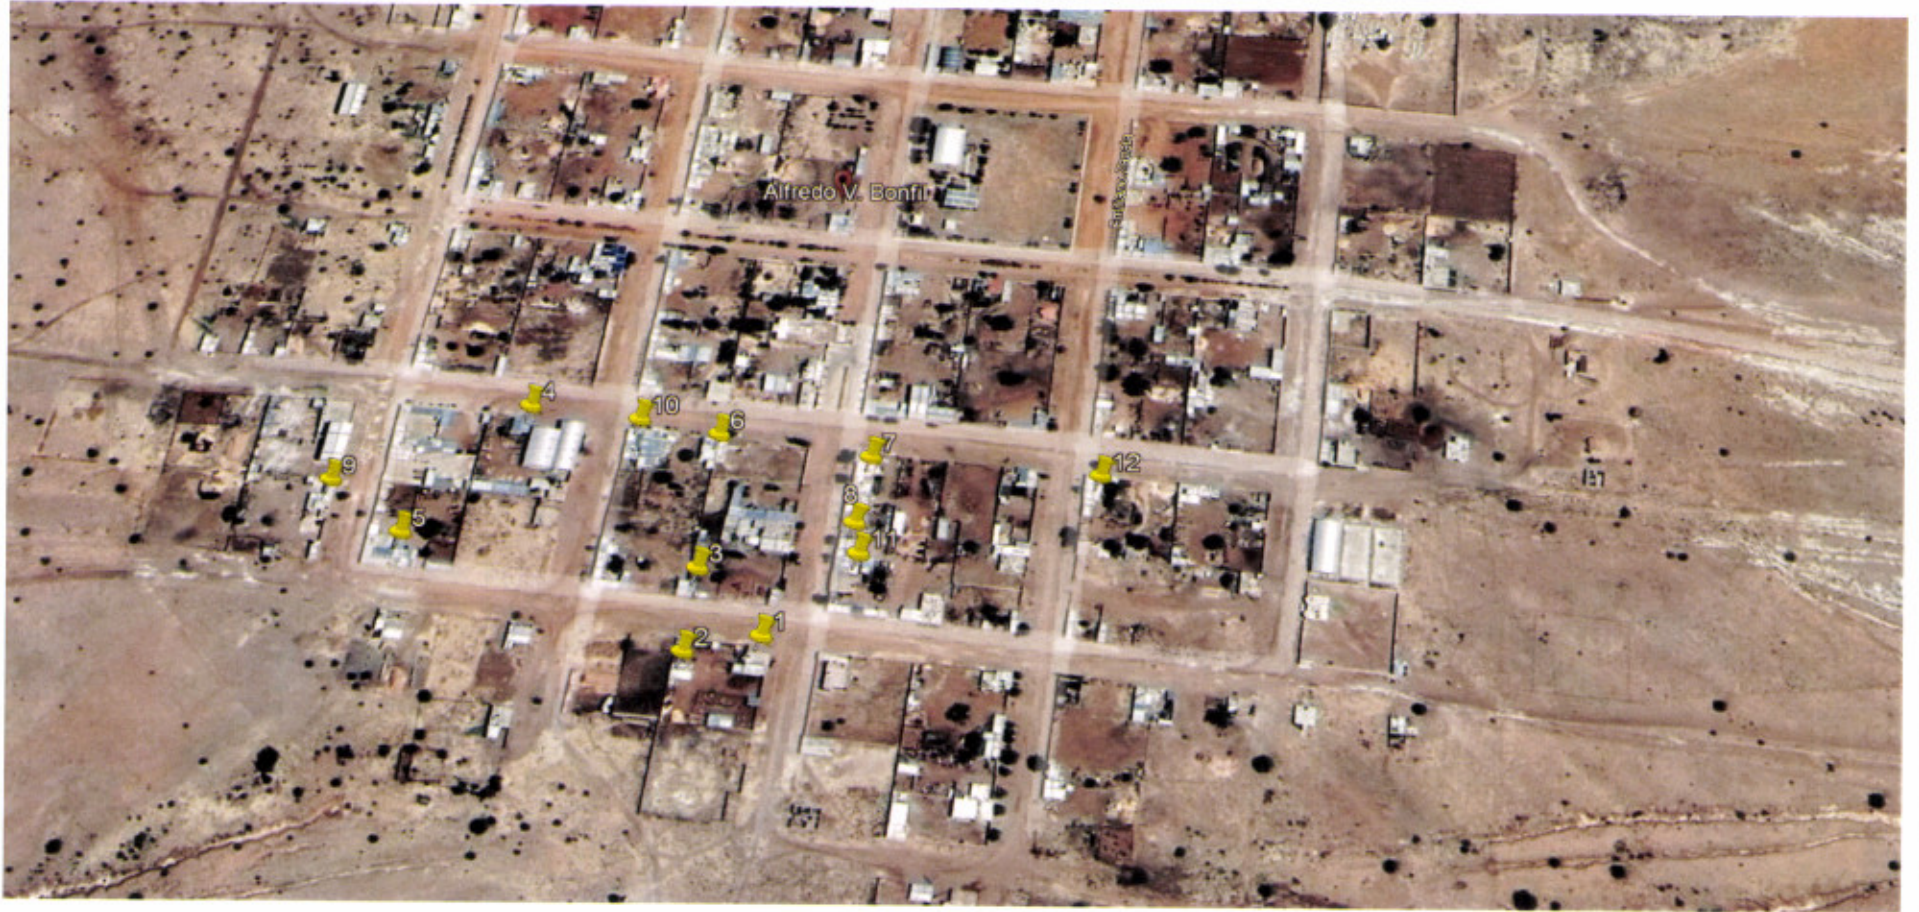

Yesica Coronado Estupiñán
C. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
RESIDENTE DE OBRA

L. S. Jaime Arturo Viedma Ceceñas
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JESUS ROJAS ZUÑIGA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
