

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 1 DE 9	FINIQUITO	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035
	PERIODO: DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021			UBICACIÓN: OJO DE AGUA DEL CALABAZAL
	MONTO CONTRATADO: \$ 3,593,994.60			MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS
	No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-004			PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	FECHA: 30 de agosto de 2021			EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
I	TERRACERIAS	1	LOTE	\$ 1,353,994.21	\$ 1,570,633.28	
II	OBRAS DE DRENAJE	1	LOTE	\$ 128,568.12	\$ 149,139.01	
III	PAVIMENTO ASFALTICO, AVENIDA DE 7.00 MTS.	1	LOTE	\$ 1,473,611.73	\$ 1,709,389.61	
IV	SEÑALAMIENTOS	1	LOTE	\$ 142,097.15	\$ 164,832.69	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 3,593,994.60	
						FINIQUITO \$3,098,271.21 IVA 16% \$495,723.39 SUBTOTAL \$3,593,994.60 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$1,078,198.38 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1,078,198.38		RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 1,078,198.38		AMORT. A LA FECHA: \$3,593,994.60
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:			AMORT. EN ESTA ESTIMACION:
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -		POR AMORTIZAR: \$ 0.00

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA <u>2</u> DE 9	FINIQUITO	OBRA:	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035	
	PERIODO:	DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021			UBICACIÓN:	OJO DE AGUA DEL CALABAZAL	
	MONTO CONTRATADO:	\$	3,593,994.60		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-004			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	FECHA:	30 de agosto de 2021					

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
I TERRACERIAS									
01-PRE-056	DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPOSITOS, DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTES, DE REGIONES ARIDAS, O SEMIARIDAS.	ha	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 30,115.35	\$ -	\$ 30,115.35
01-PRE-032	DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES DE 20CM. DE ESPESOR, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA TERRACERIA	m3	1,941.63	1,941.63	0.00	0.00	\$ 21.17	\$ -	\$ 41,104.31
01-PRE-034	CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES; MATERIAL "C", EN ROCA	m3	6,710.45	6,710.45	0.00	0.00	\$ 47.28	\$ -	\$ 317,270.08
01-PRE-033	CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION	m3	127.57	127.57	0.00	0.00	\$ 63.33	\$ -	\$ 8,079.01
01-PRE-044	COMPACTACION DE PLANTILLA AL 90% PARA DESPLANTE DE TERRACERIAS P.U.O.T.	m2	9,185.29	9,185.29	0.00	0.00	\$ 6.85	\$ -	\$ 62,919.24
01-PRE-046	EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO; MATERIAL "C" (EXTRACCION CON MAQUINARIA)	m3	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	\$ 31.51	\$ -	\$ 182,758.00
01-PRE-042	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS; KILOMETRO SUBSECUENTE; HASTA 3 KM.	m3	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	\$ 26.20	\$ -	\$ 205,146.00
01-PRE-047	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%	m3	2,785.69	2,785.69	0.00	0.00	\$ 71.63	\$ -	\$ 199,538.97
01-PRE-048	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE SUB-BASE DE 30CM AL 100%	m3	2,824.88	2,824.88	0.00	0.00	\$ 94.19	\$ -	\$ 266,075.45
01-PRE-038	FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CONSTRUIDAS CON MATERIAL A VOLTEO, (ARROPES)	m3	1,941.63	1,941.63	0.00	0.00	\$ 21.11	\$ -	\$ 40,987.81
TOTAL TERRACERIAS								\$ -	\$ 1,353,994.21

II OBRAS DE DRENAJE									
02-CIM-017	MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA; PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS: CON MORTERO DE CEMENTO	m3	26.50	26.50	0.00	0.00	\$ 1,764.94	\$ -	\$ 46,770.91
03-ALB-076	ZAMPEO A BASE DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO, PARA CUALQUIER ALTURA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m3	4.07	4.07	0.00	0.00	\$ 1,422.25	\$ -	\$ 5,788.56
14-ACCES-16	TUBO CIRCULAR ANILLADO DE POLIURETANO, TIPO DESARMABLE E INTERCAMBIABLE: DE 91 CM. DE DIÁMETRO.	ml	22.00	22.00	0.00	0.00	\$ 3,049.03	\$ -	\$ 67,078.66
03-ALB-030	ACERO DE REFUERZO EN DIÁMETROS #3 (3/8") CON UNA RESISTENCIA F'Y=4200 KG/CM2, COLOCADO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.	kg	150.00	150.00	0.00	0.00	\$ 25.12	\$ -	\$ 3,768.00
03-ALB-120	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS	m3	2.02	2.02	0.00	0.00	\$ 2,555.44	\$ -	\$ 5,161.99
TOTAL OBRAS DE DRENAJE								\$ -	\$ 128,568.12

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA <u>3</u> DE 9	FINIQUITO	OBRA:	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035
	PERIODO:	DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021			UBICACIÓN:	OJO DE AGUA DEL CALABAZAL
	MONTO CONTRATADO:	\$	3,593,994.60		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-004			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	FECHA:	30 de agosto de 2021				EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
III PAVIMENTO ASFALTICO, AVENIDA DE 7.00 MTS.									
01-PRE-049	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION, DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. AL 100%	m3	1,568.20	1,568.20	0.00	0.00	\$ 167.56	\$ -	\$ 262,767.59
20-ASF-002	RIEGO DE LIGA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ASFALTO FM-1 O ALTERNOS A RAZON DE 1,20 LTS/M2	lts	9,657.99	9,657.99	0.00	0.00	\$ 19.02	\$ -	\$ 183,694.97
20-ASF-001	RIEGO DE IMPREGNACION, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ASFALTO FM-1 O ALTERNOS A RAZON DE 1,00 LTS POR M2	lts	8,048.33	8,048.33	0.00	0.00	\$ 17.00	\$ -	\$ 136,821.61
20-ASF-003	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICODE 3CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 100% P.U.O.T.	m3	241.45	241.45	0.00	0.00	\$ 3,687.42	\$ -	\$ 890,327.56
TOTAL PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.00 MTS.								\$ -	\$ 1,473,611.73

IV SEÑALAMIENTOS									
21-SEC-002	SEÑALES RESTRICTIVAS CUADRADAS DE 71*71CM CON CEJA	pza	16.00	16.00	0.00	0.00	\$ 1,337.75	\$ -	\$ 21,404.00
21-SEC-017	SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN: SII - 15 KILOMETRAJE SIN RUTA DE 30 X 76 CM. SIN ESCUDO. (EP-17)	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 787.71	\$ -	\$ 1,575.42
21-SEC-010	SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO, DE 40*239VM. DOS TABLERO	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 2,686.66	\$ -	\$ 5,373.32
21-SEC-006	RAYA SOBRE EL PAVIMENTO RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 10CM. DE ANCHO DE LONGITUD EFECTIVA	ml	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	\$ 13.63	\$ -	\$ 40,890.00
21-SEC-018	INDICADORES DE ALINEAMIENTO: OD-6 DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, BLANCO, P.U.O.T. FANTASMAS.	pza	58.00	58.00	0.00	0.00	\$ 348.93	\$ -	\$ 20,237.94
21-SEC-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS	pza	140.00	140.00	0.00	0.00	\$ 101.94	\$ -	\$ 14,271.60
21-SEC-019	SEÑALES VERTICALES BAJAS: LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE 600 X 300 CM (EP-21) SAOP: EP-RA-EP CARRETERAS-62-04-001/13	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 38,344.87	\$ -	\$ 38,344.87
TOTAL SEÑALAMIENTOS								\$ -	\$ 142,097.15



 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GÓMEZ
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 5 DE 9	FINIQUITO	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035					
	PERIODO:	DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021			UBICACIÓN:	OJO DE AGUA DEL CALABAZAL					
	MONTO CONTRATADO: \$	3,593,994.60			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.					
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-URB-004			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
	FECHA:	30 de agosto de 2021			EJERCICIO FISCAL 2021						
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
III	PAVIMENTO ASFALTICO, AVENIDA 7.00 MTS.										
01-PRE-049	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION, DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. AL 100%	1	A-B	Base	1,000.00	7.841	0.20	1.00	1,568.20	1,568.20	M3
							TOTAL		1,568.20		M3
20-ASF-002	RIEGO DE LIGA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ASFALTO FM-1 O ALTERNOS A RAZON DE 1.20 LTS/M2	1	A-B	Liga	1,000.00	7.40	0.00	1.20	7,400.00	8,880.00	LTS
		1	A-B	Liga-Curva	582.41	1.113181	0.00	1.20	648.32	777.99	LTS
							TOTAL		9,667.99		LTS
20-ASF-001	RIEGO DE IMPREGNACION, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ASFALTO FM-1 O ALTERNOS A RAZON DE 1.00 LTS POR M2	1	A-B	Impregnación	1,000.00	7.40	0.00	1.00	7,400.00	7,400.00	LTS
		1	A-B	Impregn-Curva	582.4074	1.113189	0.00	1.00	648.33	648.33	LTS
							TOTAL		8,048.33		LTS
20-ASF-003	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICODE 3CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 100% P.U.O.T.	1	A-B	Carpeta	1,000.00	7.00	0.03	1.00	210.00	210.00	M3
		1	A-B	Carpeta-Curva	582.4074	1.80	0.03	1.00	31.45	31.45	M3
							TOTAL		241.45		M3
IV	SEÑALAMIENTOS										
21-SEC-002	SEÑALES RESTRICTIVAS CUADRADAS DE 71*71CM CON CEJA	1	A-B	Señales	0.71	0.71	2.00	16.00	16.00	16.00	PZA
							TOTAL		16.00		PZA
21-SEC-017	SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN: SII - 15 KILOMETRAJE SIN RUTA DE 30 X 76 CM. SIN ESCUDO. (EP-17)	1	A-B	Señales	0.71	0.71	2.00	2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL		2.00		PZA
21-SEC-010	SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO, DE 40*239VM. DOS TABLERO	1	A-B	Señales	0.71	0.71	2.00	2.00	2.00	2.00	PZA
							TOTAL		2.00		PZA
21-SEC-006	RAYA SOBRE EL PAVIMENTO RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 10CM. DE ANCHO DE LONGITUD EFECTIVA	1	A-B	Señales	1,000.00	0.10	0.00	3.00	1,000.00	3,000.00	ML
							TOTAL		3,000.00		ML
21-SEC-018	INDICADORES DE ALINEAMIENTO: OD-6 DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, BLANCO, P.U.O.T. FANTASMAS.	1	A-B	Fantasmas	0.00	0.20	0.80	58.00	58.00	58.00	PZA
							TOTAL		58.00		PZA
21-SEC-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS	1	A-B	Vialetas	0.10	0.10	0.03	140.00	140.00	140.00	PZA
							TOTAL		140.00		PZA
21-SEC-019	SEÑALES VERTICALES BAJAS LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE 600 X 300 CM (EP-21) SAOP: EP-RA-EP CARRETERAS-62-04-001/13	1	A-B	Letrero	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	PZA
							TOTAL		1.00		PZA


 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 9

PERIODO: DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 3,593,994.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-004

FECHA: 30 de agosto de 2021

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035


UBICACIÓN: OJO DE AGUA DEL CALABAZAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA

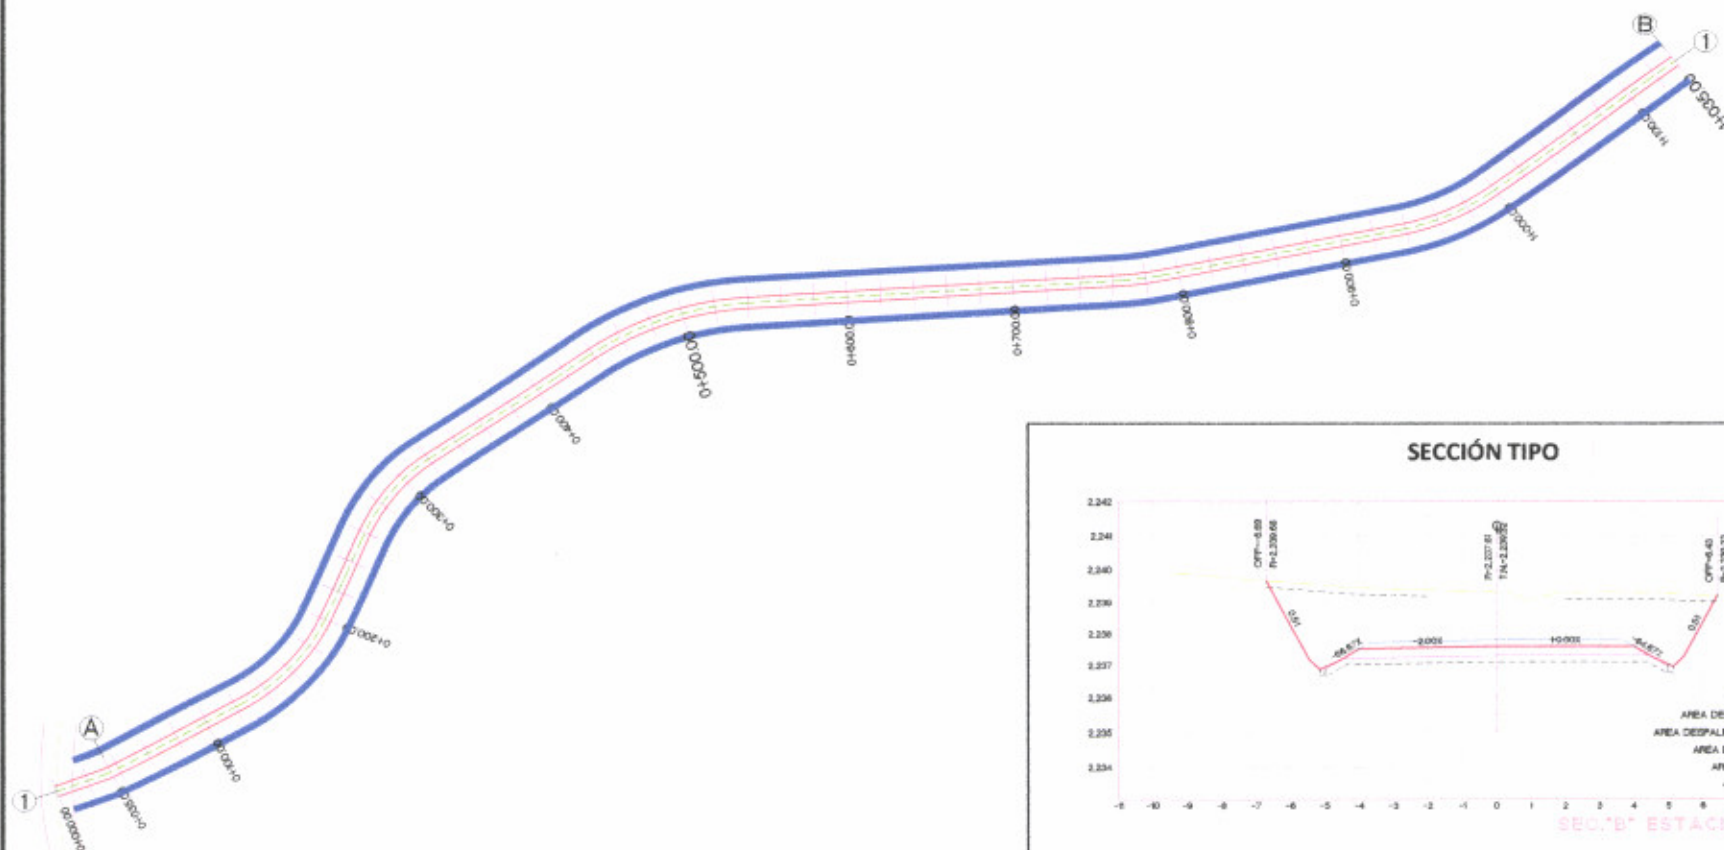

SECCIÓN TIPO

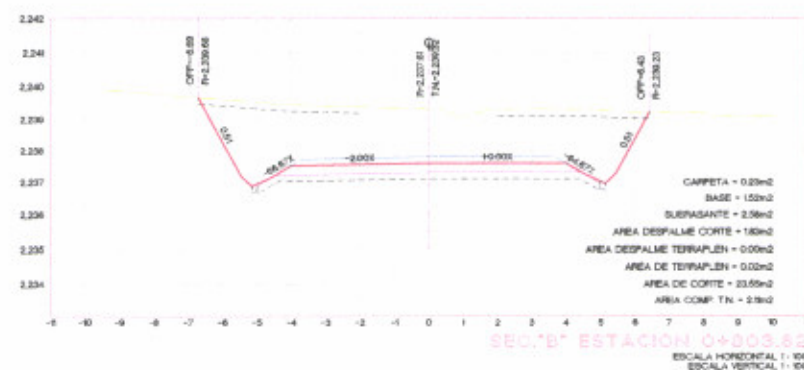

ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Juan F. Villarreal G
C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 9

PERIODO: DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 3,593,994.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-004

FECHA: 30 de agosto de 2021

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EC. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035

UBICACIÓN: OJO DE AGUA DEL CALABAZAL

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 9

PERIODO: DEL 05-ABRIL-AL 29-AGOSTO DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 3,593,994.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-004

FECHA: 30 de agosto de 2021

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL
DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM
0+035 AL 1+035


UBICACIÓN: OJO DE AGUA DEL CALABAZAL


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

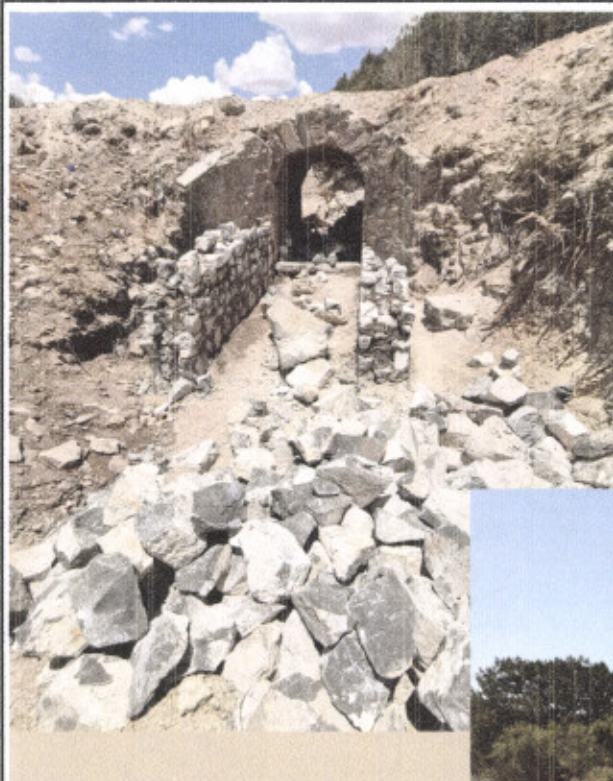


ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 9 DE 9

PERIODO: DEL 05-ABRIL AL 29-AGOSTO DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 3,593,994.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-004

FECHA: 30 de agosto de 2021

FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035


UBICACIÓN: OJO DE AGUA DEL CALABAZAL


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

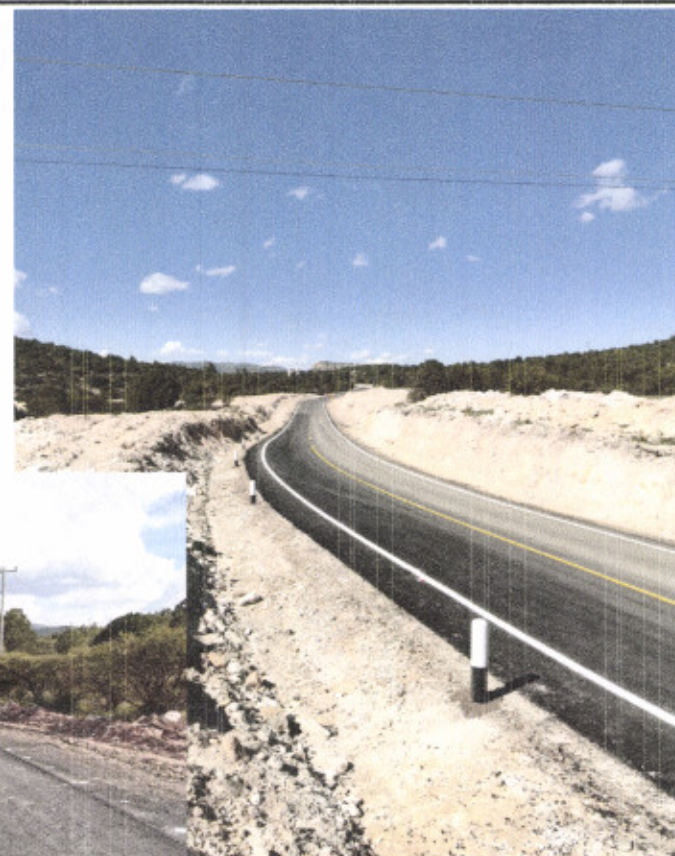


ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
