

FINIQUITO				OBRA:	
ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOLIA 1 DE 15	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES		
PERIODO:	DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		UBICACIÓN:		
MONTTO CONTRATADO:	\$	2,093,703.98	EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES		
Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-004		MUNICIPIO:		
FECHA:	08 DE JULIO DEL 2022		SOMBRERETE, ZAC.		
			PROGRAMA:		
			FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
			EJERCICIO FISCAL 2022		
CARATULA DE ESTIMACIÓN					
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
01	ELECTRICO	1	LOTE	\$ 1,804,917.22	\$2,093,703.98
					FINIQUITO \$ 2,093,703.98
FINIQUITO \$1,804,917.22 IVA 16% \$288,786.76 SUBTOTAL \$2,093,703.98 DEDUCCIONES: AMORT DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00					
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:					
ESTIMADO A LA FECHA:					\$2,093,703.98
ESTA ESTIMACIÓN:					\$0.00
SALDO POR EJERCER					\$0.00
ANTICIPO OTORGADO: \$ 628,111.19 ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 628,111.19 ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ - SALDO POR AMORTIZAR \$ -					
ARQ. LUIS ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION					

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 15	FINIQUITO 			OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
	PERÍODO:	DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022					UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,093,703.98					MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MCO-DDS-FISM-22-ELECT-004					PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	08 DE JULIO DEL 2022						EJERCICIO FISCAL 2022

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
01	ELECTRICO								
04-ELECT-150	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANA SLIM LED 100W SMD 2835 200PCS AC85-265V 50/60 HZ 11000 LM 1051MMW6500 K RA>70 PF>.95 IP67 surge.4kv CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	PZA	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 4,349.48	\$ -	\$ 1,304,844.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2835V DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 293.48	\$ -	\$ 88,044.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 625.81	\$ -	\$ 187,743.00
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 5,956.21	\$ -	\$ 119,124.20
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	\$ 22.41	\$ -	\$ 33,615.00
04-ELECT-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 8/10. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	600.00	600.00	0.00	600.00	\$ 100.40	\$ -	\$ 60,240.00
04-ELECT-297	LETTERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,307.02	\$ -	\$ 11,307.02
TOTAL DE ELECTRICO								\$ -	\$ 1,804,917.22

SUMA HOJA No. 01

TOTAL DE FINIQUITO


\$ 1,804,917.22

ARQ. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO		HOJA 4 DE 15		FINIQUITO 		OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022						UBICACIÓN:		EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.98						MUNICIPIO:		SOMBRERETE, ZAC.	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-22-ELECT-004						PROGRAMA:		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022				CROQUIS DE OBRA		EJERCICIO FISCAL 2022			

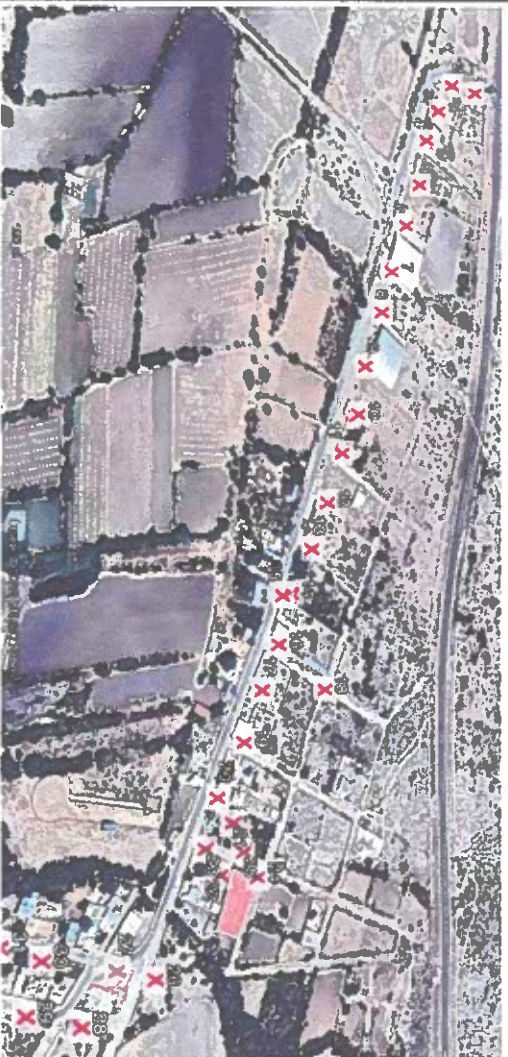

LAMPARA	COORDENADA
LAMPARA 1	23°45'18.97"N 103°50'36.39"E
LAMPARA 2	23°45'17.93"N 103°50'37.07"E
LAMPARA 3	23°45'16.85"N 103°50'36.60"E
LAMPARA 4	23°45'15.78"N 103°50'36.02"E
LAMPARA 5	23°45'14.67"N 103°50'34.91"E
LAMPARA 6	23°45'13.36"N 103°50'34.04"E
LAMPARA 7	23°45'11.95"N 103°50'33.09"E
LAMPARA 8	23°45'10.85"N 103°50'32.20"E
LAMPARA 9	23°45'9.28"N 103°50'31.12"E
LAMPARA 10	23°45'8.20"N 103°50'30.00"E
LAMPARA 11	23°45'6.94"N 103°50'29.34"E
LAMPARA 12	23°45'5.62"N 103°50'28.39"E
LAMPARA 13	23°45'4.31"N 103°50'27.58"E
LAMPARA 14	23°45'2.94"N 103°50'26.94"E
LAMPARA 15	23°45'2.62"N 103°50'27.10"E
LAMPARA 16	23°45'1.73"N 103°50'25.97"E
LAMPARA 17	23°45'0.50"N 103°50'25.23"E
LAMPARA 18	23°45'2.50"N 103°50'23.62"E
LAMPARA 19	23°44'59.10"N 103°50'24.40"E
LAMPARA 20	23°44'57.57"N 103°50'23.74"E
LAMPARA 21	23°44'57.57"N 103°50'22.79"E
LAMPARA 22	23°44'56.45"N 103°50'22.79"E
LAMPARA 23	23°44'56.45"N 103°50'20.74"E
LAMPARA 24	23°44'57.42"N 103°50'20.74"E
LAMPARA 25	23°44'57.42"N 103°50'21.02"E
LAMPARA 26	23°44'53.28"N 103°50'22.18"E
LAMPARA 27	23°44'52.53"N 103°50'21.81"E
LAMPARA 28	23°44'50.98"N 103°50'23.34"E
LAMPARA 29	23°44'50.02"N 103°50'24.17"E
LAMPARA 30	23°44'51.07"N 103°50'24.17"E

ARQ. LUIS ANTONIO BERNIERI GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO		HOJA 5 DE 15	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022			
MONTTO CONTRATADO:		\$ 2.093.703,96			
No. DE CONTRATO:		MSO-DOS-FISM-22-ELECT-004			
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022			

SOMBRETE
BUENOS RESULTADOS

OBRAS:		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
UBICACIÓN:		EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MUNICIPIO:		SOMBRETE, ZAC.	
PROGRAMA:		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
		EJERCICIO FISCAL 2022	

CROQUIS DE OBRA



LAMPARA	CORDENADA
LAMPARA 31	23°44'50.42"N 103°50'25.36"O
LAMPARA 32	23°44'48.83"N 103°50'24.87"O
LAMPARA 33	23°44'49.34"N 103°50'26.90"O
LAMPARA 34	23°44'48.22"N 103°50'25.99"O
LAMPARA 35	23°44'47.39"N 103°50'27.30"O
LAMPARA 36	23°44'47.39"N 103°50'27.30"O
LAMPARA 37	23°44'46.75"N 103°50'29.16"O
LAMPARA 38	23°44'48.03"N 103°50'29.39"O
LAMPARA 39	23°44'48.09"N 103°50'30.08"O
LAMPARA 40	23°44'45.03"N 103°50'28.10"O
LAMPARA 41	23°44'48.22"N 103°50'25.99"O
LAMPARA 42	23°44'46.81"N 103°50'24.45"O
LAMPARA 43	23°44'48.13"N 103°50'22.80"O
LAMPARA 44	23°44'48.13"N 103°50'22.80"O
LAMPARA 45	23°44'44.85"N 103°50'24.34"O
LAMPARA 46	23°44'44.85"N 103°50'24.34"O
LAMPARA 47	23°44'43.29"N 103°50'23.99"O
LAMPARA 48	23°44'43.33"N 103°50'24.03"O
LAMPARA 49	23°44'43.24"N 103°50'24.00"O
LAMPARA 50	23°44'42.05"N 103°50'23.66"O
LAMPARA 51	23°44'43.12"N 103°50'23.16"O
LAMPARA 52	23°44'43.17"N 103°50'23.07"O
LAMPARA 53	23°44'43.92"N 103°50'21.89"O
LAMPARA 54	23°44'43.92"N 103°50'21.89"O
LAMPARA 55	23°44'45.00"N 103°50'20.09"O
LAMPARA 56	23°44'45.00"N 103°50'20.09"O
LAMPARA 57	23°44'46.09"N 103°50'17.29"O
LAMPARA 58	23°44'46.09"N 103°50'17.29"O
LAMPARA 59	23°44'48.05"N 103°50'17.85"O
LAMPARA 60	23°44'48.05"N 103°50'17.85"O

ARO. LUIS ANTONIO BENITEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINQUITO		HOJA 6 DE 15	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022			
MONTOS CONTRATADOS:		\$		2,083,703.98	
No. DE CONTRATO:		MCO-DOS-FISM-22-ELECT-004			
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022			



SOMBRERETE
BUENOS RESULTADOS

OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
UBICACIÓN:		EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MUNICIPIO:		SOMBRERETE, ZAC.	
PROGRAMA:		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
		EJERCICIO FISCAL 2022	

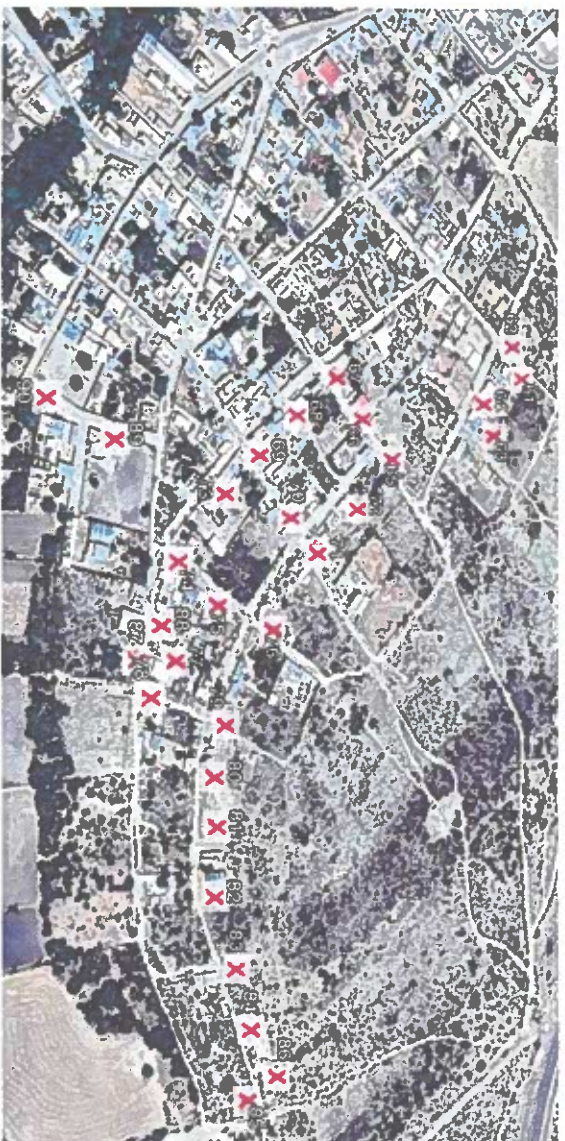

LAMPARA 61	23°44'48.12"N	103°50'14.68"O
LAMPARA 62	23°44'48.12"N	103°50'14.68"O
LAMPARA 63	23°44'46.37"N	103°50'13.55"O
LAMPARA 64	23°44'46.37"N	103°50'13.55"O
LAMPARA 65	23°44'42.51"N	103°50'13.39"O
LAMPARA 66	23°44'41.98"N	103°50'14.80"O
LAMPARA 67	23°44'41.59"N	103°50'16.12"O
LAMPARA 68	23°44'39.98"N	103°50'15.69"O
LAMPARA 69	23°44'38.48"N	103°50'15.18"O
LAMPARA 70	23°44'38.72"N	103°50'13.29"O
LAMPARA 71	23°44'39.15"N	103°50'12.08"O
LAMPARA 72	23°44'40.85"N	103°50'12.62"O
LAMPARA 73	23°44'37.12"N	103°50'14.68"O
LAMPARA 74	23°44'35.18"N	103°50'13.68"O
LAMPARA 75	23°44'35.79"N	103°50'12.19"O
LAMPARA 76	23°44'37.05"N	103°50'10.88"O
LAMPARA 77	23°44'34.15"N	103°50'12.48"O
LAMPARA 78	23°44'33.19"N	103°50'10.99"O
LAMPARA 79	23°44'34.81"N	103°50'9.39"O
LAMPARA 80	23°44'34.00"N	103°50'8.29"O
LAMPARA 81	23°44'33.57"N	103°50'7.12"O
LAMPARA 82	23°44'32.81"N	103°50'5.35"O
LAMPARA 83	23°44'32.62"N	103°50'3.51"O
LAMPARA 84	23°44'32.38"N	103°50'1.81"O
LAMPARA 85	23°44'32.56"N	103°50'0.22"O
LAMPARA 86	23°44'32.56"N	103°50'0.22"O
LAMPARA 87	23°44'33.19"N	103°50'10.99"O
LAMPARA 88	23°44'34.15"N	103°50'12.48"O
LAMPARA 89	23°44'34.77"N	103°50'12.11"O
LAMPARA 90	23°44'33.51"N	103°50'18.66"O

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 7 DE 15	FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2021 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRAS: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
	PERIODO:	DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022			
	MONTO CONTRATADO:	\$	2,093,703.98		
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-005-FISM-22-ELECT-004			
	FECHA:	08 DE JULIO DEL 2022			
CROQUIS DE OBRA					
	UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES			
	MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.			
	PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
		EJERCICIO FISCAL 2022			




LAMPARA	CORDENADA
LAMPARA 91	23°44'34.62"N 103°50'19.98"O
LAMPARA 92	23°44'36.02"N 103°50'20.79"O
LAMPARA 93	23°44'35.22"N 103°50'17.58"O
LAMPARA 94	23°44'34.28"N 103°50'18.65"O
LAMPARA 95	23°44'37.53"N 103°50'18.21"O
LAMPARA 96	23°44'37.83"N 103°50'22.22"O
LAMPARA 97	23°44'38.51"N 103°50'22.60"O
LAMPARA 98	23°44'37.14"N 103°50'23.86"O
LAMPARA 99	23°44'36.51"N 103°50'26.30"O
LAMPARA 100	23°44'34.85"N 103°50'27.02"O
LAMPARA 101	23°44'33.01"N 103°50'26.51"O
LAMPARA 102	23°44'33.01"N 103°50'26.51"O
LAMPARA 103	23°44'35.75"N 103°50'28.99"O
LAMPARA 104	23°44'35.28"N 103°50'30.51"O
LAMPARA 105	23°44'35.28"N 103°50'30.51"O
LAMPARA 106	23°44'34.83"N 103°50'32.17"O
LAMPARA 107	23°44'34.05"N 103°50'31.73"O
LAMPARA 108	23°44'33.02"N 103°50'31.12"O
LAMPARA 109	23°44'32.07"N 103°50'30.56"O
LAMPARA 110	23°44'32.07"N 103°50'30.56"O
LAMPARA 111	23°44'36.12"N 103°50'33.20"O
LAMPARA 112	23°44'35.90"N 103°50'33.67"O
LAMPARA 113	23°44'36.57"N 103°50'33.10"O
LAMPARA 114	23°44'36.72"N 103°50'33.40"O
LAMPARA 115	23°44'36.52"N 103°50'34.10"O
LAMPARA 116	
LAMPARA 117	
LAMPARA 118	
LAMPARA 119	
LAMPARA 120	

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍZ GARCÍA
RESPONSABLE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINQUITO	HOJA 8 DE 15	FINQUITO  SOMBRE RETE DE ASESORIA TECNICA 2021 2022 BUENOS RESULTADOS		OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022				UBICACIÓN:		EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.98				MUNICIPIO:		SOMBRE RETE, ZAC.
Nº. DE CONTRATO:		MSO-DOS-RSM-22-ELECT-004				PROGRAMA:		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA:		08 DE JUNIO DEL 2022		CROQUIS DE OBRA		EJERCICIO FISCAL 2022		

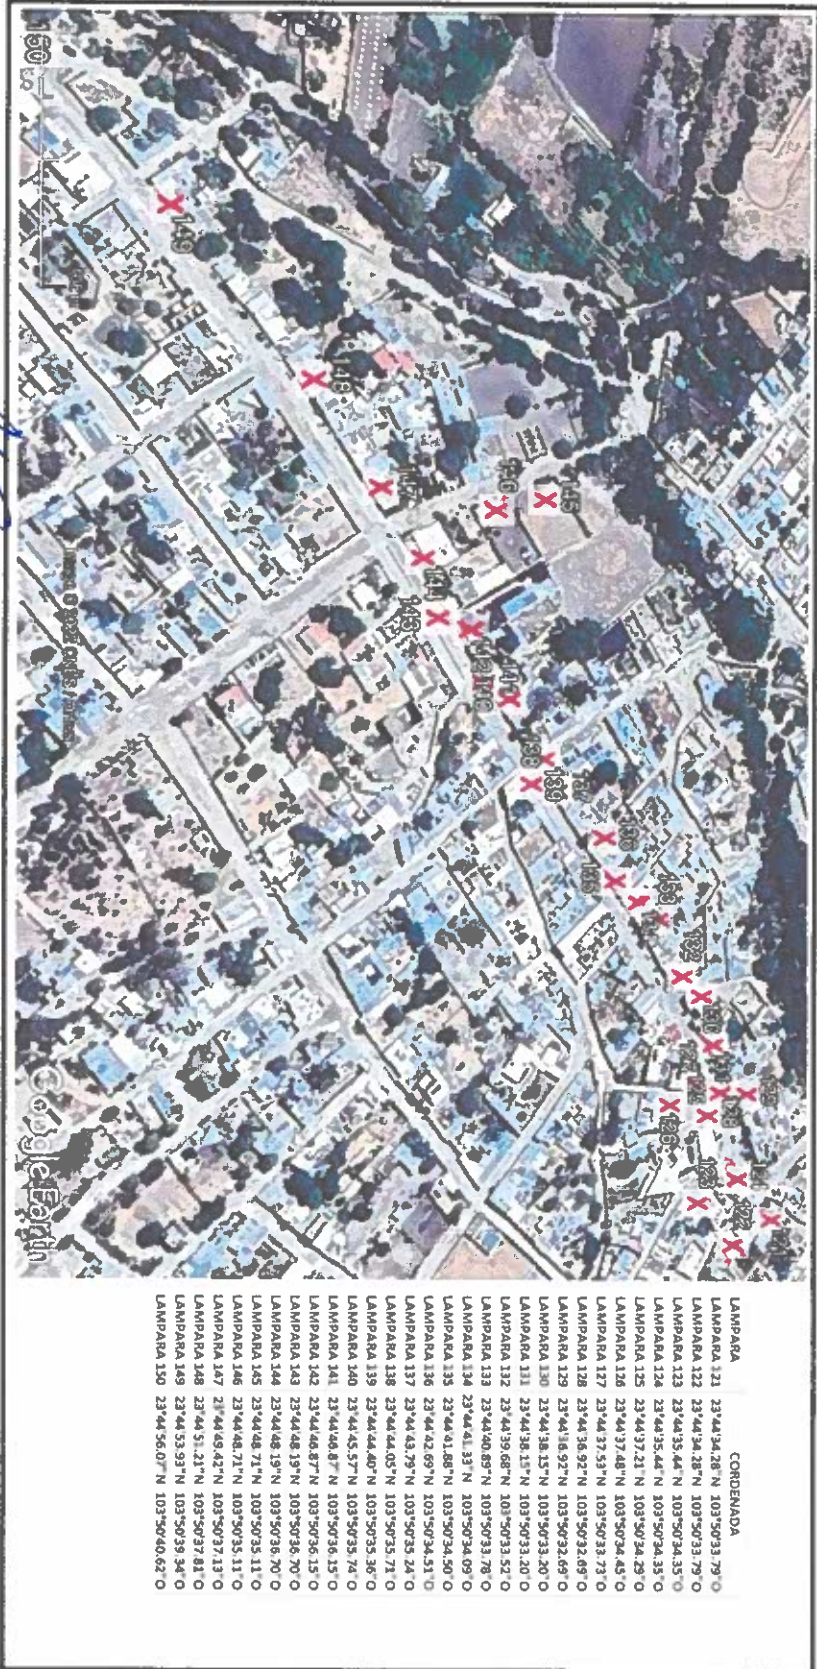


ARO, LUIS ANTONIO BENÍZEL HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINQUITO	HOLLA 9 DE 15	FINQUITO  II Ayuntamiento 1993-1995 SOMBRE RETE BUENOS RESULTADOS		OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022				UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.96				MUNICIPIO: SOMBRE RETE, ZAC.	
Nº. DE CONTRATO:		MSO-DOS-FISM-22-ELECT-004				PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022		CROQUIS DE OBRA		EJERCICIO FISCAL 2022	

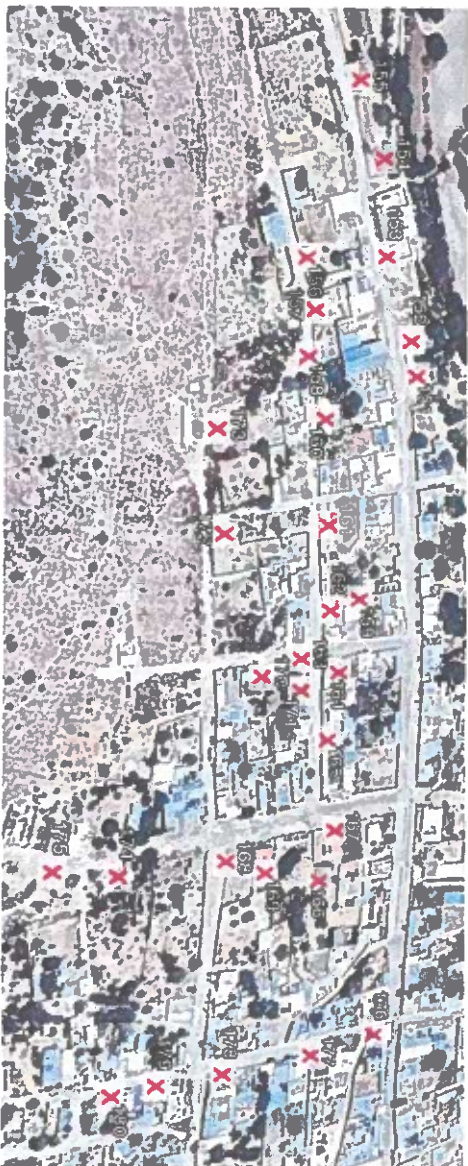


LAMPARA 151	23°44'56.07"N	103°50'40.63"O
LAMPARA 152	23°44'56.64"N	103°50'41.03"O
LAMPARA 153	23°44'57.78"N	103°50'42.23"O
LAMPARA 154	23°44'59.32"N	103°50'43.02"O
LAMPARA 155	23°45'0.31"N	103°50'43.10"O
LAMPARA 156	23°44'56.98"N	103°50'43.99"O
LAMPARA 157	23°44'56.23"N	103°50'43.42"O
LAMPARA 158	23°44'56.11"N	103°50'43.23"O
LAMPARA 159	23°44'54.33"N	103°50'42.41"O
LAMPARA 160	23°44'52.78"N	103°50'41.56"O
LAMPARA 161	23°44'51.35"N	103°50'40.86"O
LAMPARA 162	23°44'50.32"N	103°50'40.17"O
LAMPARA 163	23°44'50.32"N	103°50'40.17"O
LAMPARA 164	23°44'50.32"N	103°50'39.91"O
LAMPARA 165	23°44'49.03"N	103°50'39.07"O
LAMPARA 166	23°44'47.47"N	103°50'38.00"O
LAMPARA 167	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 168	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 169	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 170	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 171	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 172	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 173	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 174	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 175	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 176	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 177	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 178	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 179	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O
LAMPARA 180	23°44'46.32"N	103°50'37.37"O

ARQ. LUIS ANTONIO BERRIO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOLLA 10 DE 15	FINIQUITO  SOMBRERETE M. AYUNTAMIENTO 2021-2024 BUENOS RESULTADOS		OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
PERIODO:	DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022				UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,083,703.98				MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
No. DE CONTRATO:	MSO-D05-FISM-22-ELECT-004				PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA:	08 DE JULIO DEL 2022		CROQUIS DE OBRA		EJERCICIO FISCAL 2022	

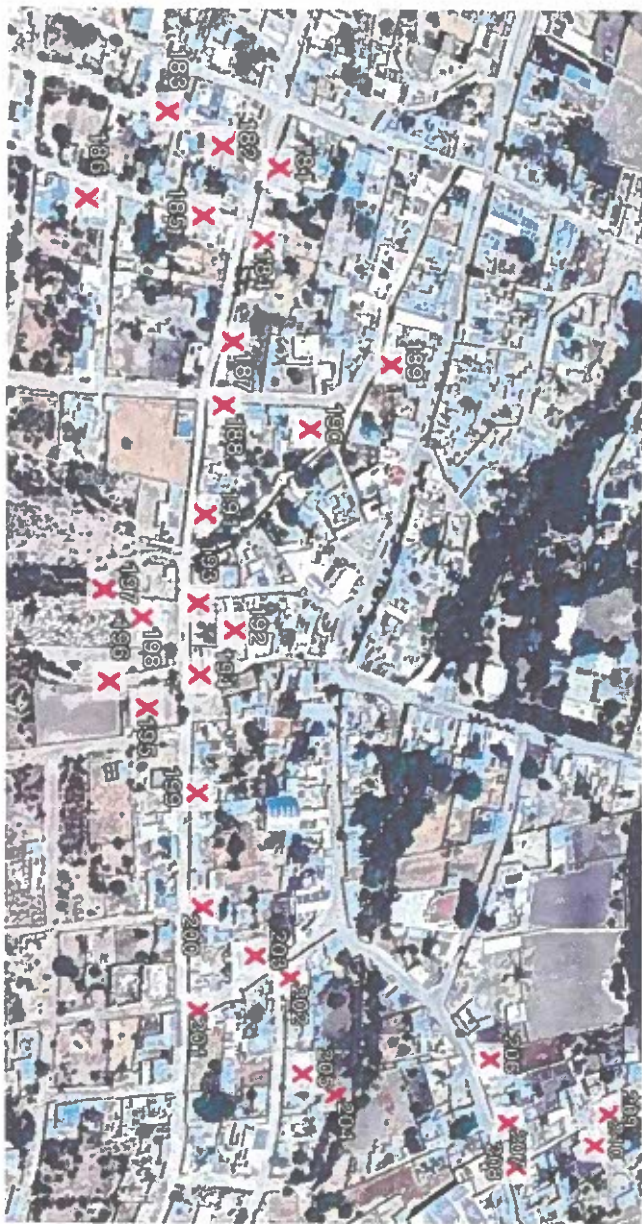


LAMPARA	CORDENADA
LAMPARA 181	23°44'41.40"N 103°50'39.79"O
LAMPARA 182	23°44'41.01"N 103°50'41.03"O
LAMPARA 183	23°44'40.82"N 103°50'42.32"O
LAMPARA 184	23°44'40.19"N 103°50'39.30"O
LAMPARA 185	23°44'39.81"N 103°50'40.65"O
LAMPARA 186	23°44'38.68"N 103°50'42.80"O
LAMPARA 187	23°44'38.34"N 103°50'38.76"O
LAMPARA 188	23°44'37.30"N 103°50'38.24"O
LAMPARA 189	23°44'39.55"N 103°50'35.54"O
LAMPARA 190	23°44'37.98"N 103°50'36.37"O
LAMPARA 191	23°44'35.46"N 103°50'37.39"O
LAMPARA 192	23°44'34.04"N 103°50'36.54"O
LAMPARA 193	23°44'34.04"N 103°50'36.54"O
LAMPARA 194	23°44'32.97"N 103°50'35.71"O
LAMPARA 195	23°44'31.89"N 103°50'37.34"O
LAMPARA 196	23°44'31.89"N 103°50'37.34"O
LAMPARA 197	23°44'33.20"N 103°50'38.49"O
LAMPARA 198	23°44'31.10"N 103°50'34.41"O
LAMPARA 199	23°44'31.10"N 103°50'34.41"O
LAMPARA 200	23°44'29.33"N 103°50'32.89"O
LAMPARA 201	23°44'27.60"N 103°50'31.84"O
LAMPARA 202	23°44'29.10"N 103°50'30.31"O
LAMPARA 203	23°44'27.64"N 103°50'28.84"O
LAMPARA 204	23°44'27.64"N 103°50'28.84"O
LAMPARA 205	23°44'27.64"N 103°50'28.84"O
LAMPARA 206	23°44'29.55"N 103°50'24.74"O
LAMPARA 207	23°44'29.05"N 103°50'23.44"O
LAMPARA 208	23°44'28.36"N 103°50'22.62"O
LAMPARA 209	23°44'30.38"N 103°50'21.04"O
LAMPARA 210	23°44'29.66"N 103°50'20.35"O

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO	HOJA 11 DE 15	FINIQUITO	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.98		UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
No. DE CONTRATO:		MSO-DOS-FISM-22-ELECT-004		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.	
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
CROQUIS DE OBRA				EJERCICIO FISCAL 2022	

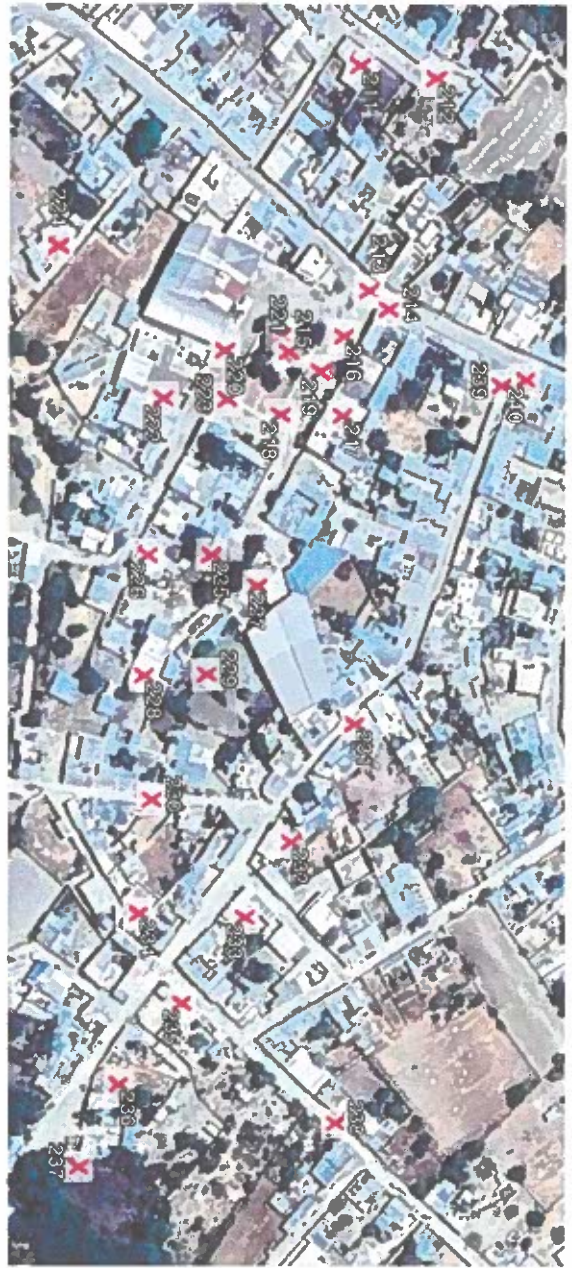

- CONDENADA**
- LAMPARA 211 23°44'23.66"N 103°50'20.95"O
 - LAMPARA 212 23°44'23.55"N 103°50'19.24"O
 - LAMPARA 213 23°44'26.77"N 103°50'20.24"O
 - LAMPARA 214 23°44'26.53"N 103°50'20.42"O
 - LAMPARA 215 23°44'26.16"N 103°50'21.13"O
 - LAMPARA 216 23°44'26.16"N 103°50'21.13"O
 - LAMPARA 217 23°44'25.10"N 103°50'21.13"O
 - LAMPARA 218 23°44'25.10"N 103°50'21.13"O
 - LAMPARA 219 23°44'25.69"N 103°50'21.50"O
 - LAMPARA 220 23°44'25.94"N 103°50'22.01"O
 - LAMPARA 221 23°44'25.94"N 103°50'22.01"O
 - LAMPARA 222 23°44'25.30"N 103°50'22.97"O
 - LAMPARA 223 23°44'25.30"N 103°50'22.97"O
 - LAMPARA 224 23°44'27.23"N 103°50'22.55"O
 - LAMPARA 225 23°44'23.21"N 103°50'22.21"O
 - LAMPARA 226 23°44'23.21"N 103°50'22.21"O
 - LAMPARA 227 23°44'22.77"N 103°50'22.47"O
 - LAMPARA 228 23°44'21.56"N 103°50'22.27"O
 - LAMPARA 229 23°44'21.56"N 103°50'22.27"O
 - LAMPARA 230 23°44'19.82"N 103°50'22.15"O
 - LAMPARA 231 23°44'20.82"N 103°50'20.84"O
 - LAMPARA 232 23°44'19.14"N 103°50'21.88"O
 - LAMPARA 233 23°44'18.07"N 103°50'22.63"O
 - LAMPARA 234 23°44'18.19"N 103°50'22.37"O
 - LAMPARA 235 23°44'16.85"N 103°50'22.67"O
 - LAMPARA 236 23°44'15.69"N 103°50'22.71"O
 - LAMPARA 237 23°44'14.50"N 103°50'22.37"O
 - LAMPARA 238 23°44'14.86"N 103°50'21.06"O
 - LAMPARA 239 23°44'15.54"N 103°50'18.43"O
 - LAMPARA 240 23°44'25.63"N 103°50'18.13"O

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ MERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO	HOJA 12 DE 15		FINIQUITO	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES		
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.98		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.		
NO. DE CONTRATO:		MSO-DOS-FISM-22-ELECT-004		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022		EJERCICIO FISCAL 2022		



SOMBRERETE
COAHUILA DE ZARAGOZA

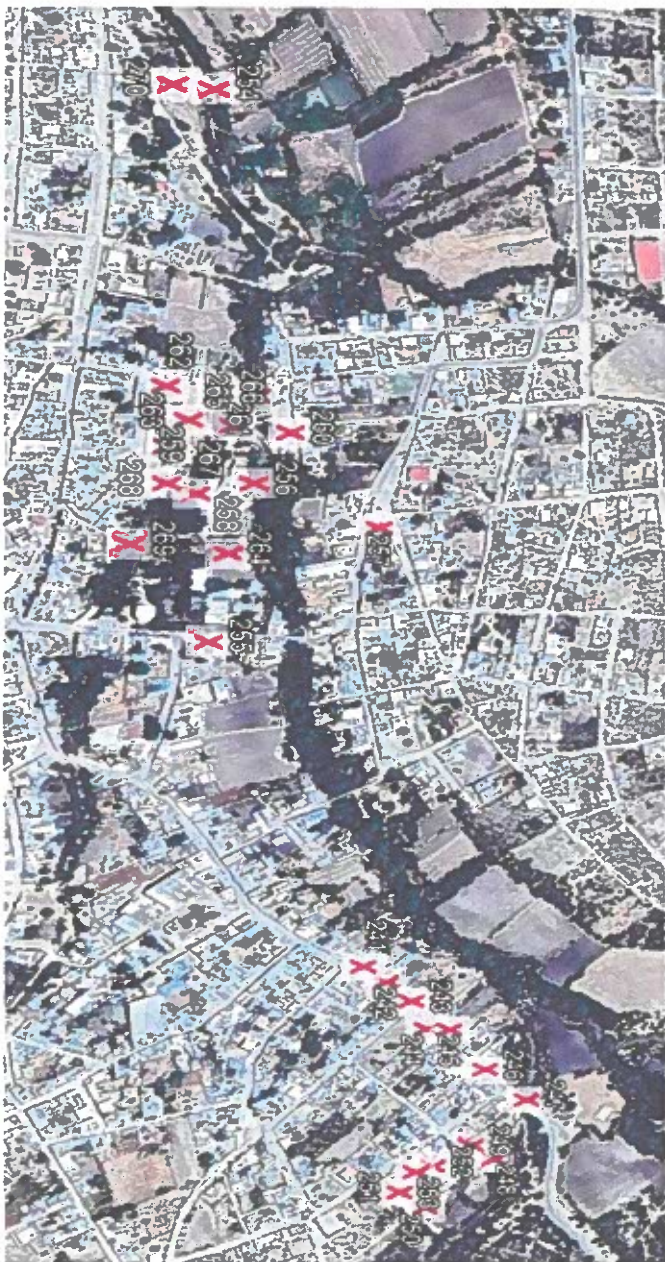


LAMPARA 201 23°44'23.37"N 103°50'16.30"W
LAMPARA 202 23°44'24.98"N 103°50'15.07"W
LAMPARA 203 23°44'26.44"N 103°50'13.74"W
LAMPARA 204 23°44'28.07"N 103°50'12.37"W
LAMPARA 205 23°44'29.67"N 103°50'11.00"W
LAMPARA 206 23°44'31.25"N 103°50'09.67"W
LAMPARA 207 23°44'32.87"N 103°50'08.30"W
LAMPARA 208 23°44'34.47"N 103°50'06.93"W
LAMPARA 209 23°44'36.07"N 103°50'05.57"W
LAMPARA 210 23°44'37.67"N 103°50'04.20"W
LAMPARA 211 23°44'39.27"N 103°50'02.83"W
LAMPARA 212 23°44'40.87"N 103°50'01.47"W
LAMPARA 213 23°44'42.47"N 103°50'00.10"W
LAMPARA 214 23°44'44.07"N 103°49'58.73"W
LAMPARA 215 23°44'45.67"N 103°49'57.37"W
LAMPARA 216 23°44'47.27"N 103°49'56.00"W
LAMPARA 217 23°44'48.87"N 103°49'54.63"W
LAMPARA 218 23°44'50.47"N 103°49'53.27"W
LAMPARA 219 23°44'52.07"N 103°49'51.90"W
LAMPARA 220 23°44'53.67"N 103°49'50.53"W
LAMPARA 221 23°44'55.27"N 103°49'49.17"W
LAMPARA 222 23°44'56.87"N 103°49'47.80"W
LAMPARA 223 23°44'58.47"N 103°49'46.43"W
LAMPARA 224 23°44'60.07"N 103°49'45.07"W
LAMPARA 225 23°44'61.67"N 103°49'43.70"W
LAMPARA 226 23°44'63.27"N 103°49'42.33"W
LAMPARA 227 23°44'64.87"N 103°49'40.97"W
LAMPARA 228 23°44'66.47"N 103°49'39.60"W
LAMPARA 229 23°44'68.07"N 103°49'38.23"W
LAMPARA 230 23°44'69.67"N 103°49'36.87"W
LAMPARA 231 23°44'71.27"N 103°49'35.50"W
LAMPARA 232 23°44'72.87"N 103°49'34.13"W
LAMPARA 233 23°44'74.47"N 103°49'32.77"W
LAMPARA 234 23°44'76.07"N 103°49'31.40"W
LAMPARA 235 23°44'77.67"N 103°49'30.03"W
LAMPARA 236 23°44'79.27"N 103°49'28.67"W
LAMPARA 237 23°44'80.87"N 103°49'27.30"W
LAMPARA 238 23°44'82.47"N 103°49'25.93"W
LAMPARA 239 23°44'84.07"N 103°49'24.57"W
LAMPARA 240 23°44'85.67"N 103°49'23.20"W
LAMPARA 241 23°44'87.27"N 103°49'21.83"W
LAMPARA 242 23°44'88.87"N 103°49'20.47"W
LAMPARA 243 23°44'90.47"N 103°49'19.10"W
LAMPARA 244 23°44'92.07"N 103°49'17.73"W
LAMPARA 245 23°44'93.67"N 103°49'16.37"W
LAMPARA 246 23°44'95.27"N 103°49'15.00"W
LAMPARA 247 23°44'96.87"N 103°49'13.63"W
LAMPARA 248 23°44'98.47"N 103°49'12.27"W
LAMPARA 249 23°44'100.07"N 103°49'10.90"W
LAMPARA 250 23°44'101.67"N 103°49'09.53"W
LAMPARA 251 23°44'103.27"N 103°49'08.17"W
LAMPARA 252 23°44'104.87"N 103°49'06.80"W
LAMPARA 253 23°44'106.47"N 103°49'05.43"W
LAMPARA 254 23°44'108.07"N 103°49'04.07"W
LAMPARA 255 23°44'109.67"N 103°49'02.70"W
LAMPARA 256 23°44'111.27"N 103°49'01.33"W
LAMPARA 257 23°44'112.87"N 103°49'00.00"W
LAMPARA 258 23°44'114.47"N 103°48'58.63"W
LAMPARA 259 23°44'116.07"N 103°48'57.27"W
LAMPARA 260 23°44'117.67"N 103°48'55.90"W
LAMPARA 261 23°44'119.27"N 103°48'54.53"W
LAMPARA 262 23°44'120.87"N 103°48'53.17"W
LAMPARA 263 23°44'122.47"N 103°48'51.80"W
LAMPARA 264 23°44'124.07"N 103°48'50.43"W
LAMPARA 265 23°44'125.67"N 103°48'49.07"W
LAMPARA 266 23°44'127.27"N 103°48'47.70"W
LAMPARA 267 23°44'128.87"N 103°48'46.33"W
LAMPARA 268 23°44'130.47"N 103°48'44.97"W
LAMPARA 269 23°44'132.07"N 103°48'43.60"W
LAMPARA 270 23°44'133.67"N 103°48'42.23"W

ARQ. LUIS ANTONIO BENTIZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:		FINQUITO	HOJA 13 DE 15	FINQUITO	
PERIODO:		DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
MONTO CONTRATADO:		\$ 2,093,703.98		UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES	
No. DE CONTRATO:		MSO-005-FISM-22-ELECT-004		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.	
FECHA:		08 DE JULIO DEL 2022		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
CROQUIS DE OBRA				EJERCICIO FISCAL 2022	

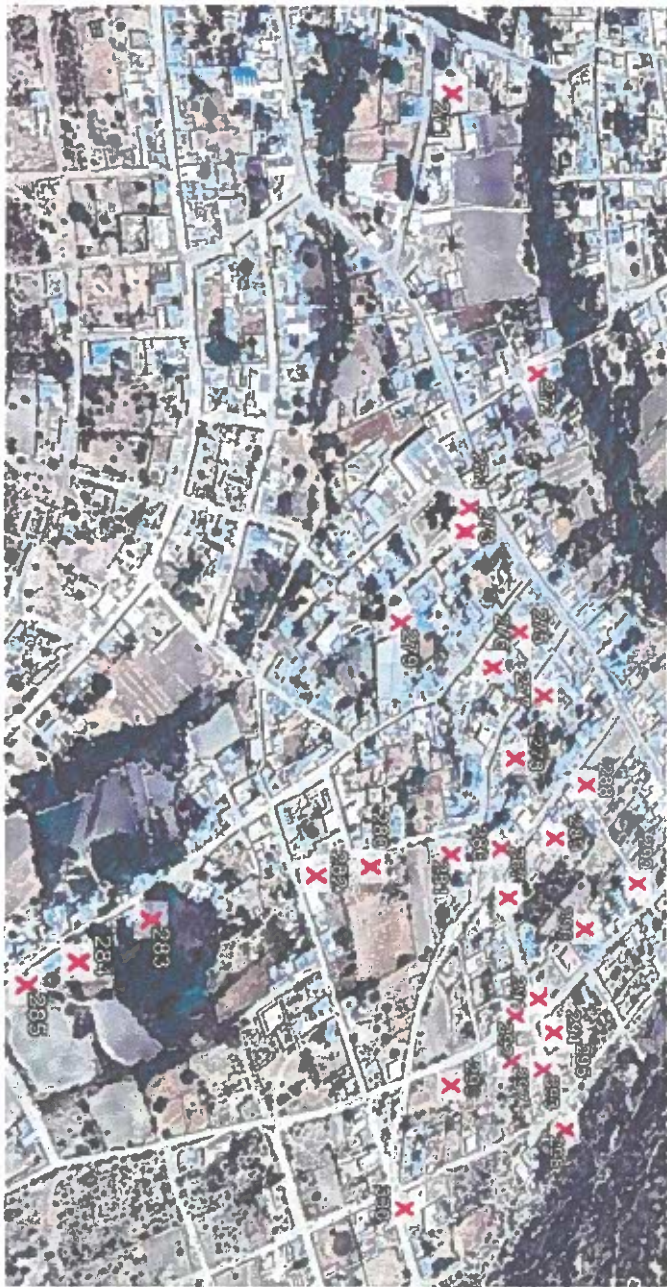

LAMPARA	COORDENADA
LAMPARA 271	23°44'34.85" N 103°50'27.02" O
LAMPARA 272	23°44'30.36" N 103°50'21.05" O
LAMPARA 273	23°44'25.69" N 103°50'21.50" O
LAMPARA 274	23°44'26.30" N 103°50'21.69" O
LAMPARA 275	23°44'24.17" N 103°50'18.40" O
LAMPARA 276	23°44'22.97" N 103°50'18.86" O
LAMPARA 277	23°44'23.02" N 103°50'16.87" O
LAMPARA 278	23°44'21.13" N 103°50'16.85" O
LAMPARA 279	23°44'22.77" N 103°50'22.47" O
LAMPARA 280	23°44'16.91" N 103°50'20.47" O
LAMPARA 281	23°44'18.05" N 103°50'17.92" O
LAMPARA 282	23°44'16.17" N 103°50'22.09" O
LAMPARA 283	23°44'13.76" N 103°50'26.41" O
LAMPARA 284	23°44'12.34" N 103°50'27.89" O
LAMPARA 285	23°44'11.51" N 103°50'28.98" O
LAMPARA 286	23°44'18.77" N 103°50'16.19" O
LAMPARA 287	23°44'17.64" N 103°50'15.24" O
LAMPARA 288	23°44'21.43" N 103°50'13.79" O
LAMPARA 289	23°44'19.68" N 103°50'14.26" O
LAMPARA 290	23°44'19.57" N 103°50'10.24" O
LAMPARA 291	23°44'15.46" N 103°50'12.67" O
LAMPARA 292	23°44'14.77" N 103°50'11.36" O
LAMPARA 293	23°44'14.66" N 103°50'11.48" O
LAMPARA 294	23°44'14.76" N 103°50'11.56" O
LAMPARA 295	23°44'14.82" N 103°50'11.63" O
LAMPARA 296	23°44'14.75" N 103°50'11.78" O
LAMPARA 297	23°44'13.58" N 103°50'10.87" O
LAMPARA 298	23°44'12.29" N 103°50'9.67" O
LAMPARA 299	23°44'12.45" N 103°50'14.87" O
LAMPARA 300	23°44'9.00" N 103°50'14.96" O


ARO, LUIS ANTONIO GARCIA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 14 DE 15	FINIQUITO  BUENOS RESULTADOS		OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
PERIODO:	DE 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022				UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES
MONTO CONTRATADO:	\$	2,093,703.98			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-004				PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FECHA:	08 DE JULIO DEL 2022		EJERCICIO FISCAL 2022			

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

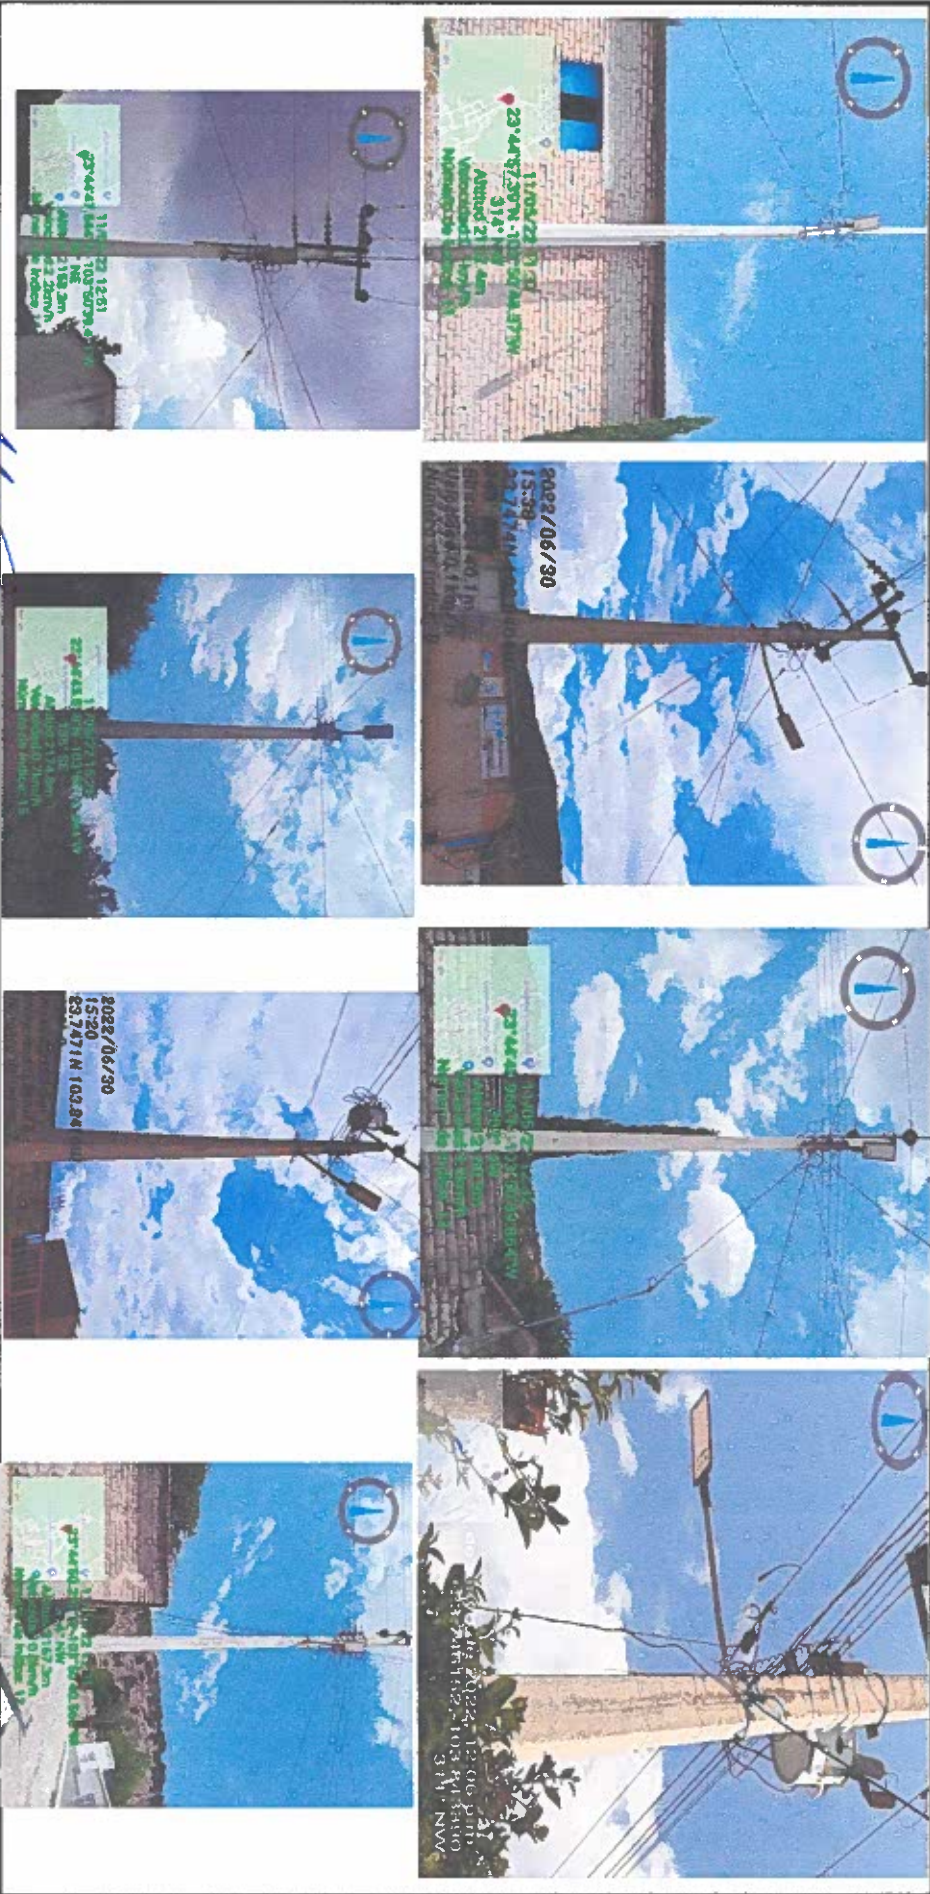

ARQ. LUIS ANTONIO PEÑATE MARRANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. A. Udele
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
