

FINIQUITO

HOJAS: 01 DE 11
 PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37
 NO. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-004
 FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS).
 UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS).
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 61,290.36	\$ 71,096.82	
02	CANCHA	1	LOTE	\$ 542,061.38	\$ 628,791.20	
03	TECHUMBRE	1	LOTE	\$ 960,506.90	\$1,114,188.00	
04	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	\$ 52,681.33	\$ 61,110.34	
TOTAL DE FINIQUITO					\$1,875,186.37	

FINIQUITO \$1,616,539.97
 IVA 16% \$258,646.40
SUBTOTAL \$1,875,186.37

AMORT DE ANTICIPO		AMORT DE ANTICIPO		AMORT DE ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 562,555.91	RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:			
AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 562,555.91	ESTIMADO A LA FECHA:	\$	1,875,186.37	
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$	SALDO POR EJERCER:	\$		

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

Yesica Coronado Estupinan
 ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valencia Becerra
 CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINQUITO		HOJAS: 02 DE 11	CONSTRUCCION DE TECNOLOGIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILLOS).	
PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022	MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37	MSO-005-FISM-22-UBR-004	UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILLOS).	
No. DE CONTRATO:	FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022	MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.		
		PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).		

DESGLOSE DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
PRELIMINARES									
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 14.66	\$	\$ 7,916.40
1-PRE-002	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS CON MEDIDA DE 21.70 X 18.04 INCLUYE: PROTECCION TIPO TAPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	59.00	59.00	0.00	59.00	\$ 125.72	\$	\$ 7,417.48
01-PRE-107	MEJORAMIENTO DE TERRENO Y COMPACTACION EN AREA DE CANCHA INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 48.63	\$	\$ 26,260.20
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOLES CON UN ALTURA DE 1.50 MTS INCLUYE RETIRO, CARGA Y ACAREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISOR	Mt	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 485.62	\$	\$ 8,741.16
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR INCLUYE	M3	59.00	59.00	0.00	59.00	\$ 185.68	\$	\$ 10,955.12
TOTAL DE PRELIMINARES								\$	\$ 61,290.36
CANCHA									
02	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4" INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2	45.00	45.00	0.00	45.00	\$ 285.98	\$	\$ 12,869.10
03-ALB-027	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	45.00	45.00	0.00	45.00	\$ 945.88	\$	\$ 42,564.60
1-PRE-003	RELLENO CON MATERIAL TIPO (TERPETATE) EN CAPAS DE 0.20 CMS COMPACTOS CON EQUIPO	M3	183.00	183.00	0.00	183.00	\$ 245.59	\$	\$ 44,942.97
03-PAV-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F.C= 250 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBADO, SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE MALLA CIMBA Y ARMADURA A-2 A BASE DE PIR DE 2" X 2" CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL TRABAJOS DE TALLER ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBAÑO, CORTES	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 659.80	\$	\$ 356,292.00
1-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLETA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 12,660.66	\$	\$ 25,301.32
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO INCLUYE TRAZO ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,252.43	\$	\$ 4,252.43
TOTAL DE CANCHA								\$	\$ 542,061.39
SUMA HOJA No. 01								\$	\$ 603,351.74

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEIRA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

HOJAS:	03 DE 11	OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLOMIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILAS)
PERIODO:	16 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	UBICACION:	COLOMIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILAS)
MONTO CONTRATADO:	\$ 1,875,186.37	MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
No. DE CONTRATO:	MSO-005-FISM-23-UIB-004	PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2022		



DESGLASE DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
03	TECHADO								
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00m DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	21.00	21.00	0.00	21.00	\$ 345.57	\$	\$ 7,256.97
01-PRE-083	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS (BALASTA) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDIDO DE MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION, 3% DE CAL Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 245.59	\$	\$ 4,420.62
02-CIM-005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100KG/CM2 ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 211.23	\$	\$ 3,802.14
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20 X 1.20 MTS, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 4,250.83	\$	\$ 51,003.96
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA, F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO 3 Y ESTRIOS DEL NO 3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	Ml	21.00	21.00	0.00	21.00	\$ 3,250.63	\$	\$ 69,103.23
1E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRERADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 450.70	\$	\$ 10,816.80
1E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 6" C 40 DE 8.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 15,983.88	\$	\$ 191,806.56
1E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	92.00	92.00	0.00	92.00	\$ 1,210.28	\$	\$ 111,345.76
1E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 27XZ (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 27XZ (BLANCO) EN MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	#2A	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 38,991.55	\$	\$ 239,949.20
03-ALB-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM, INCLUYE: CAMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 250.56	\$	\$ 3,006.72
1E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KG	285.00	285.00	0.00	285.00	\$ 84.74	\$	\$ 24,150.90
1E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFUJANTE A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUELTAR DE 3/16 INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	KG	266.00	266.00	0.00	266.00	\$ 84.59	\$	\$ 22,500.94
1E-ACERO-0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PLAS AUTOTALABRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 359.00	\$	\$ 193,860.00
SUBTOTAL CANCHA							\$	\$	\$ 933,023.90
SUMA HOJA No. 02							\$	\$	\$ 1,124,830.46

Resido Coronado Estupian.
ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEIRA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria Tecobedot.
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINQUITO		HOJAS: 04 DE 11 PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022 MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37 No. DE CONTRATO: M80-D05-FISM-22-JUNE-004 FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022		 SOMBRERETE AVUNAMIENTOS 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS		OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS). UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS). MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).	
-----------------	--	--	--	--	--	---	--

DESGLOSE DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
03	TECHOMANTE								
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14, INSTALADO CON PULAS AUTOTALADANTES DE 14"x1" INCLUYE: BALADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLETA DE 1"x1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	ML	60.00	50.00	0.00	60.00	\$ 368.94	\$	\$ 22,136.40
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6" DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BALANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 445.55	\$	\$ 5,346.60
02	TOTAL DE TECHOMANTE						\$	\$	\$ 990,509.80
02	INSTALACION ELECTRICA								
02-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 14-ELECT-55: 100 WATTS, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 2,451.10	\$	\$ 24,511.00
02-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,838.67	\$	\$ 2,838.67
08-ELE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICO THW DEL NO. 12, 14, CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	SAL	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 1,246.88	\$	\$ 12,468.80
08-HERR-007	LETREO ALUSIVO A LA OBRA DE 3 00X2 40 MTS SOPORTES DE 1 77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2"X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	SAL	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,862.86	\$	\$ 12,862.86
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA							\$	\$	\$ 52,681.33
SUMA HOJA No. 02							\$	\$	\$ 1,616,539.97

Yesica Coronado Estupian
 ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIAN
 RESIDENTE DE OBRA

S.C. JAIME ARTURO VIERNA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Volana Estrada T.
 CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.


HOJAS: 06 DE 11

PERIODO: 18 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022

MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37

No. DE CONTRATO: MSO-005-FISM-23-URB-004

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022



CONSTRUCCION DE TECNADO EN AREA DE IMPLANTACION

OBRA: DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).

UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	1-2	A-B		30.00	18.00			540.00	540.00	M2
01-PRE-020	DEMOLUCION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS CON MEDIDA DE 21.70 X 18.04 INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	1-2	A-B		16.39	30.00	0.12		59.00	59.00	M3
01-PRE-107	MEJORAMIENTO DE TERRENO Y COMPACTACION EN AREA DE CANCHA INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO.	1-2	A-B		30.00	18.00			540.00	540.00	M2
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOLES CON UN ALTURA DE 1.50 MTS INCLUYE RETIRO, CARGA Y ACAREO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	1-2	A-B					18.00	18.00	18.00	PZA
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLUCION TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL	1-2	A-B		16.39	30.00	0.12		59.00	59.00	M3
03-AL-B-027	CIMBRA APARENTE, CON CAMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4" INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	1-2	A-B		25.00	1.80			45.00	45.00	M2
03-AL-B-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEY Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B		25.00	1.80			45.00	45.00	M2
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL TIPO (TEPETATE), EN CAPAS DE 0.20 CMS COMPACTOS INCLUYE ABUNDAMIENTO DEL 15 % PORCIENTO, MANO DE	1-2	A-B		30.00	18.00	0.34		183.00	183.00	M3

Residente de obra

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

HOJAS: 06 DE 11
PERIODO: 18 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37
No. DE CONTRATO: M50-DDS-FISM-23-URB-006
FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022



OBRA: DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).
USICACIÓN: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).
MUNICIPIO: SOMBRE RETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACIÓN	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO	UNIDAD	
										PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-PAV-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA #4 10/10 F.C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBADO, SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE MALLA, CIMA Y DESCIMBRA COLADO CURADO Y TODO	1-2	A-B			30.00	18.00			540.00	540.00	M2
									2.00	540.00		M2
												PZA
19-E-ACERO-035	ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	1-2	A-B							2.00	2.00	M2
									2.00	2.00		PZA
												PZA
19-E-ACERO-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50' DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 27x27x1/8" Y SOLETA 27x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO.	1-2	A-B							2.00	2.00	M2
									2.00	2.00		PZA
												PZA
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETEBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA.	1-2	A-B							1.00	1.00	PZA
									1.00	2.00		PZA
												PZA
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA.	1-2	A-B			25.00	0.60			21.00	21.00	M3
									1.40	1.00		M3
												M3
01-PRE-083	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS (BALARINA) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDDECIDO DE MATERIAL PARA SU HOMOGENEIZACION	1-2	A-B			25.00	0.60			18.00	18.00	M3
									1.20	21.00		M3
												M3
02-CIM-005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR F.C=100KG/CM2 ACABADO COMULIN INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	1-2	A-B			25.00	0.72			18.00	18.00	M2
										18.00		M2
												M2
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F.C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20 X1.20 MTS. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y	1-2	A-B							12.00	12.00	PZA
										18.00		M2
												PZA
												PZA

Residente de obra: *Yesica Coronado Estupian*
Residente de obra: *Yesica Coronado Estupian*
L.S.C. Jaime Arturo Viedma Cegañas
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Voluntario: *Voluntario*
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

HOJAS: 07 DE 11
PERIODO: 18 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37
No. DE CONTRATO: MSO-DOS-FISM-22-URB-004
FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022



CONSTRUCCION DE TECNOLOGO EN AREA DE TIERRAS
OBRA: DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).
UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)
MUNICIPIO: SOMBRETERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-AL-B-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F.C-250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B			21.00		21.00	21.00	ML	
						TOTAL		21.00	24.00	ML	
19-E-ACERO-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO	1-2	A-B				24.00	24.00	24.00	PZA	
						TOTAL		24.00	12.00	PZA	
19-E-ACERO-032	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 6" C 40 DE 6.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO	1-2	A-B				12.00	12.00	12.00	PZA	
						TOTAL		12.00	92.00	PZA	
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN	1-2	A-B				92.00	92.00	92.00	PZA	
						TOTAL		92.00	6.00	PZA	
19-E-ACERO-010	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN SEPARADORES A CADA 80CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA	1-2	A-B				6.00	6.00	6.00	PZA	
						TOTAL		6.00	12.00	PZA	
03-AL-B-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT INVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM INCLUYE CAMBRA Y DECAMBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B				12.00	12.00	12.00	PZA	
						TOTAL		12.00	285.00	KG	
19-E-ACERO-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1-2	A-B				285.00	285.00	285.00	KG	
						TOTAL		285.00	266.00	KG	
19-E-ACERO-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLEAMBO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y	1-2	A-B				266.00	266.00	266.00	KG	
						TOTAL		266.00	266.00	KG	

YESICA Coronado Espinosa.
ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria Escobedo F.
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO		HOJAS: 08 DE 11 PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022 MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37 No. DE CONTRATO: MSO-005-FISM-22-UBR-008 FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022	
------------------	--	---	--



OBRA: CONSTRUCCION DE TENDIDO EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS) MUNICIPIO: SOMBRETERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
---	--

NÚMEROS GENERAD											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZN-PTO-ALUM CALIBRE 26. INSTALADA CON PLAS AUTOTALADANTES DE 1/4"x1". INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN FLETE A OBRA DESPERDICIO	1-2	A-B		30.00	18.00			540.00	540.00	M2
							TOTAL		540.00	60.00	M2
19-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14. INSTALADO CON PLAS AUTOTALADANTES DE 1/4"x1". INCLUYE BALADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°. ABRACADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4". MANO DE OBRA. HERRAMIENTA	1-2	A-B		60.00				60.00	60.00	ML
							TOTAL		60.00	12.00	ML
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BALANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL. COLOCADO SOBRE COLUMNA. INCLUYE MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B						12.00	10.00	ML
							TOTAL		12.00		ML
04-ELECT-553	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A. ELEGIR DE 100 WATTS. INCLUYE ACARREO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B						10.00	10.00	PZA
							TOTAL		10.00		PZA
04-ELECT-554	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR. INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS. ACARREO. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO	1-2	A-B						1.00	1.00	PZA
							TOTAL		1.00		PZA
06-E-ELE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2" CABLE ELECTRICO THHN DEL NO. 12. 14. CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU PROPIA INSTALACION	1-2	A-B						10.00	10.00	SAL
							TOTAL		10.00		SAL
09-HERR-007	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA. CON TPR DE 2"x 2". LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-2	A-B						1.00	1.00	PZA
							TOTAL		1.00		PZA

RESIDENTE DE OBRA ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN 	L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 	VALORIA T. ESCOBAR C.F. CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.
---	---	---

FINQUITO


HOJAS: 09 DE 11
 PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37
 NO. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-004
 FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022

SOMBRETERETE

BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)
 UBICACIÓN: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS)
 MUNICIPIO: SOMBRETERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CROQUIS DE OBRA

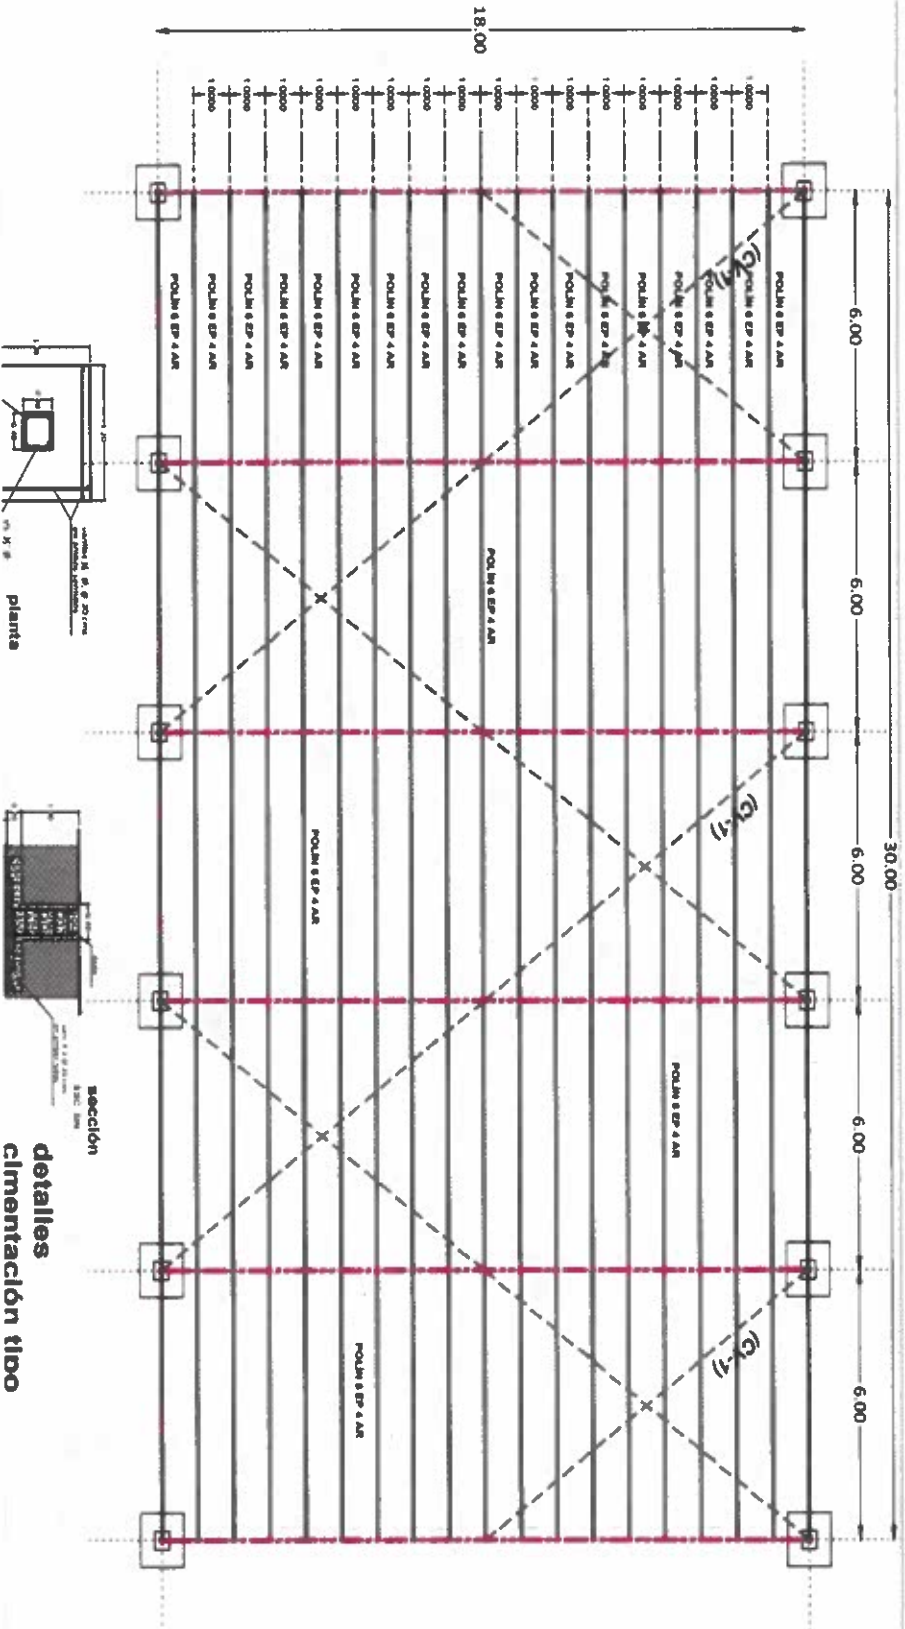

Yessica Coronado Espinosa,
 ARQ. YESSICA CORONADO ESTUPIÑAN
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valencia Escobedo de F.
 CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO		HOJAS: 10 DE 11 PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022 MONTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37 No. DE CONTRATO: MSO-DUS-FISM-22-URB-004 FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022	
		OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS). UBICACIÓN: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS). MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).	
		BUENOS RESULTADOS	

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
 RESIDENTE DE OBRA


L.S. C. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONSTRUCTORA WY S. A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 11 DE 11
PERIODO: 16 DE MAYO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022
MONTTO CONTRATADO: \$ 1,875,186.37
No. DE CONTRATO: MSO-DOS-FISM-22-URB-004
FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).
UBICACION: COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS).
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).



Yesica Coronado Estupian
ARO. YESICA CORONADO ESTUPIAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. Jaime Arturo Viedma Cedeñas
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria Escobedo T.
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.
