

FINIQUITO

HOJAS: 01 DE 10
 PERIODO: 09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,679,617.59
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-003
 FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2022



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ EN LA COLONIA SOMBRETERILLO (CUARTA ETAPA)"
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 28,475.68	\$ 33,031.79	
02	PAVIMENTACION	1	LOTE	\$ 1,236,703.32	\$1,434,575.85	
03	DRENAJE SANITARIO	1	LOTE	\$ 131,233.86	\$ 152,231.28	
04	AGUA POTABLE	1	LOTE	\$ 8,952.80	\$ 10,385.25	
05	CICLOVIA	1	LOTE	\$ 42,560.54	\$ 49,393.43	
TOTAL DE FINIQUITO					\$1,679,617.59	
						FINIQUITO \$1,447,946.20
						IVA 16% \$231,671.39
						SUBTOTAL \$1,679,617.59
						AMORT. DE ANTICIPO
						TOTAL
						SUBTOTAL
						IVA 16%
						TOTAL

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 503,685.28					RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 503,685.28	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,679,617.59
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	ESTA ESTIMACION: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER \$ -

ARQ. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
 S.A. DE C.V.

000100

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 10	 SOMBRERETE AYUNTAMIENTO 2021 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1M CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (CUARTA ETAPA)."
	PERIODO:	09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL, SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,679,617.59		MUNICIPIO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
	No. DE CONTRATO:	MSO-005 FISM-22-URB-004		PROGRAMA:	
	FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2022			

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 MZ. POR MEDIOS MANUALES, CON HLO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	986.00	986.00	0.00	986.00	\$ 12.50	\$	\$ 12,325.00
1-PRE-OP-01	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	147.90	147.90	0.00	147.90	\$ 109.20	\$	\$ 16,150.68
	TOTAL DE PRELIMINARES						\$	\$	\$ 28,475.68
02	PAVIMENTACIÓN								
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CA-416 D.C.A 7 10 M DE PROFUNDIDAD	M3	236.00	236.00	0.00	236.00	\$ 315.30	\$	\$ 75,402.00
01-PRE-013	ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA, MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	384.00	384.00	0.00	384.00	\$ 109.00	\$	\$ 41,856.00
1-PRE-OP-01	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TETAPATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAKARINA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	M3	338.53	338.53	0.00	338.53	\$ 245.40	\$	\$ 83,114.68
11-O-EXT-001	GUARNICION DE CONCRETO F.C= 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	115.00	115.00	0.00	115.00	\$ 345.70	\$	\$ 39,755.50
11-O-EXT-001	BANQUETA DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM DE 0.10 MTS DE ESPESOR. ACABADO PULIDO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE CIMBRA COMUN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	218.00	218.00	0.00	218.00	\$ 344.11	\$	\$ 75,015.98
11-O-EXT-001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F.C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-1010 CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	904.00	904.00	0.00	904.00	\$ 515.00	\$	\$ 465,560.00
11-O-EXT-001	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M1	14.00	14.00	0.00	14.00	\$ 255.71	\$	\$ 3,579.94
03-ALB-003	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	56.00	56.00	0.00	56.00	\$ 895.30	\$	\$ 50,736.80
09-HERR-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAL METALICO EN BASE A DISEÑO DE PLANO DE 90 CMS DE ALTURA. INCLUYE PERIL CUADRADO VARILLA DE CUADRADA DE 1/2". PLACA METALICA PARA ANCLAJE PINTURA ANTICORROSION, PINTURA ESMALTE. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M1	52.00	52.00	0.00	52.00	\$ 4,499.56	\$	\$ 233,977.12
11-O-EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCINO SIMPRE VERDE, FLAMA CHINA O MAGNOLIA DE 4 MTS DE ALTURA Y UN DIAMETRO DE TALLO DE 4" INCLUYE PLANTACION TIERRA VEGETAL PARA SU PRENDIMIENTO RIEGOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PLA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 22,001.70	\$	\$ 44,003.40
01-PLUV-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING 1'6" CON MEDIDAS 1'00 X 6'00 MTS DE LARGO INCLUYE CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO, ELABORACION DE FOSA CON TABIQUE DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CFM-ARENA PORP 1:3 ENLARRE EN MUROS PERIMETRALES Y PLAN LA DE CONCRETO F.C= 150 KG/CM2	M2	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 57,001.45	\$	\$ 114,002.90
	TOTAL DE PAVIMENTACION						\$	\$	\$ 1,236,703.32
	SUMA HOJA No. 01						\$	\$	\$ 1,265,179.00

ARQ. LUIS ANTONIO BERNIZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. A. 2022 C.
L.S.C. JAIME ARTURO VIEIRA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

000110

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 10	 SOMBRETERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRETERILLO (CUARTA ETAPA)."
	PERIODO:	09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL.
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,679,617.59		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-005-FISM-23-URS-003		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
	FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2022			

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
03	DRENAJE SANITARIO								
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 450, DE 0 A 2.12 M DE PROFUNDIDAD	M3	60.00	60.00	0.00	60.00	\$ 315.86	\$	18,951.60
02-CHA-005	PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR PARA TUBERIA INCLUYE APISONADO	M2	100.00	100.00	0.00	100.00	\$ 52.69	\$	5,269.00
RED-ALCA-1-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 1.8" INCLUYE PUJEA HIDROSANITARIA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M	100.00	100.00	0.00	100.00	\$ 510.45	\$	51,045.00
RED-ALCA-1-B	COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 6", INCLUYE SIETEAS CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 3,312.20	\$	33,122.00
01-PRE-003	RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE SELECCION Y VOLTEO A MANO	M3	60.00	60.00	0.00	60.00	\$ 125.95	\$	7,557.00
1-PRE-OP-00	ELABORACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO BASE INFERIOR DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,498.26	\$	8,498.26
7-HID-SAN-SI	INTERCONEXION A LINEA VIVA EN POZO DE VISITA INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 6,901.00	\$	6,901.00
	TOTAL DE DRENAJE SANITARIO							\$	131,293.86
04	AGUA POTABLE								
13-HIDRA-00	CONEXION PARA VIVIENDAS MEDIANTE CONECTOR A RED SECUNDARIA DE 3" Y MANQUERA KTEC A BASE DE ALUMINIO	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 895.28	\$	8,952.80
	TOTAL DE AGUA POTABLE							\$	8,952.80
05	CICLOVIA								
11-O-EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA VIAL DE 22 X 22 X 7 CMS EN AREA DE CICLOVIA EN COLOR AMARILLO TRAFICO INCLUYE COLOCACION PUJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	72.00	72.00	0.00	72.00	\$ 225.78	\$	16,256.16
21-SEC-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO FANTASMA OD 6 DE PVC PARA CICLOVIA EN POSTE CON BASE DE GOMA ANCLADO A CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 1,750.50	\$	5,251.50
11-O-EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIEFITAS EN COLOR BLANCO CON ANTIREFLEJANTE POR UN LADO INCLUYE COLOCACION PUJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	15.00	15.00	0.00	15.00	\$ 174.98	\$	2,639.70
05-ACAB-04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS BLANCO Y AMARILLO TRAFICO CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLEJANTE CON UN ANCHO DE 10 CMS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE, DOS MANOS	M2	255.00	255.00	0.00	255.00	\$ 62.48	\$	15,932.40
05-LOG-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA AREA DE CICLOVIA EN AZUL TRAFICO ESPECIFICADO EN PLANO DE DISEÑO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,250.39	\$	2,500.78
	TOTAL DE CICLOVIA							\$	42,580.54
	SUMA HOJA No. 02							\$	182,787.20

ARQ. LUIS ANTONIO BARRERA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

000111

000112

FINIQUITO	HOJAS:	05 DE 10	 SOMBRETERE 44 ASIENTADOS 12 2 BUENOS RESULTADOS				OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRETERITO (CUARTA ETAPA)."				
	PERIODO:	09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022					UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL.				
	MONTO CONTRATADO: \$	1,679,617.59					MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.				
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-005-FISM-22-URB-005					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2022									
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN PARCIAL	EJECUTADO SUB-TOTAL	UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO							
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F.C. 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5.610 10, CUBRA METALICA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	1-2	A-B	PAVIMENTO	100.00	9.04			904.00	904.00	M2
								TOTAL		904.00	M2
11-O-EXT-007	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F.C. 200 KG/CM2 EN BCC-ON DE 0.10x1.00 MTS. AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL. REVENIMIENTO DE 5 A 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1-2	A-B	TOPE	14.00				14.00	14.00	ML
								TOTAL		14.00	ML
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø 20 CM DE 15 CM DE ESPESOR CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIAL FS. MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B	MURO	50.00		1.12		56.00	56.00	M2
								TOTAL		56.00	M2
09-HERR-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAL METALICO EN BASE A DISEÑO DE PLANO DE 90 CMS DE ALTURA, INCLUYE PERFI. CUADRADO VARILLA DE CUADRADA DE 1/2" PLACA METALICA PARA ANCLAJE. PINTURA	1-2	A-B	BARRANDAL	52.00				52.00	52.00	ML
								TOTAL		52.00	ML
11-O-EXT-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCINO SIMPRE VERDE PLAMA CHINA O MAGNOLIA DE 4 MTS DE ALTURA Y UN DIAMETRO DEL TALLO DE 4"	1-2	A-B	ENCINO				2.00	2.00	2.00	PZA
								TOTAL		2.00	PZA
01-PLUV-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING 18" CON MEDIDAS 1.00X 8.00 MTS DE LARGO INCLUYE CONTRA MARCO DE ANCLAJE METALICO. ELABORACION DE FOSA CON TABIQUE DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO C/MA-ARENA POR 1:3 ENJARRE EN MUROS PERIMETRALES Y	1-2	A-B	REJILLA				2.00	2.00	2.00	PZA
								TOTAL		2.00	PZA
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE ILUMINENO TP3 B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 4160 DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD	1-2	A-B	EXCAVACION	100.00	0.60	1.00		60.00	60.00	M3
								TOTAL		60.00	M3
02-CIM-005	PLANTILLA Ø CAVA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR PARA TUBERIA INCLUYE AMONADO	1-2	A-B	PIATILLA	100.00				100.00	100.00	ML
								TOTAL		100.00	ML

000113

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 10	 SOMBRERETE BUENOS RESULTADOS	OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (CUARTA ETAPA)."
	PERIODO:	08 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022		UBICACION:	CABECERA MUNICIPAL
	MONTO CONTRATADO: \$	1,679,617.59		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-005-FISM 22-URB-003		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2022			

NÚMEROS GENERADORES

000115

FINIQUITO

HOJAS: 08 DE 10

PERIODO: 09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022

MONTO CONTRATADO: \$ 1,679,617.69

No. DE CONTRATO: MSO DOS FISM 22-URB-003

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2022




OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ EN LA COLONIA SOMBRETERILLO (CUARTA ETAPA)."

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CROQUIS DE OBRA

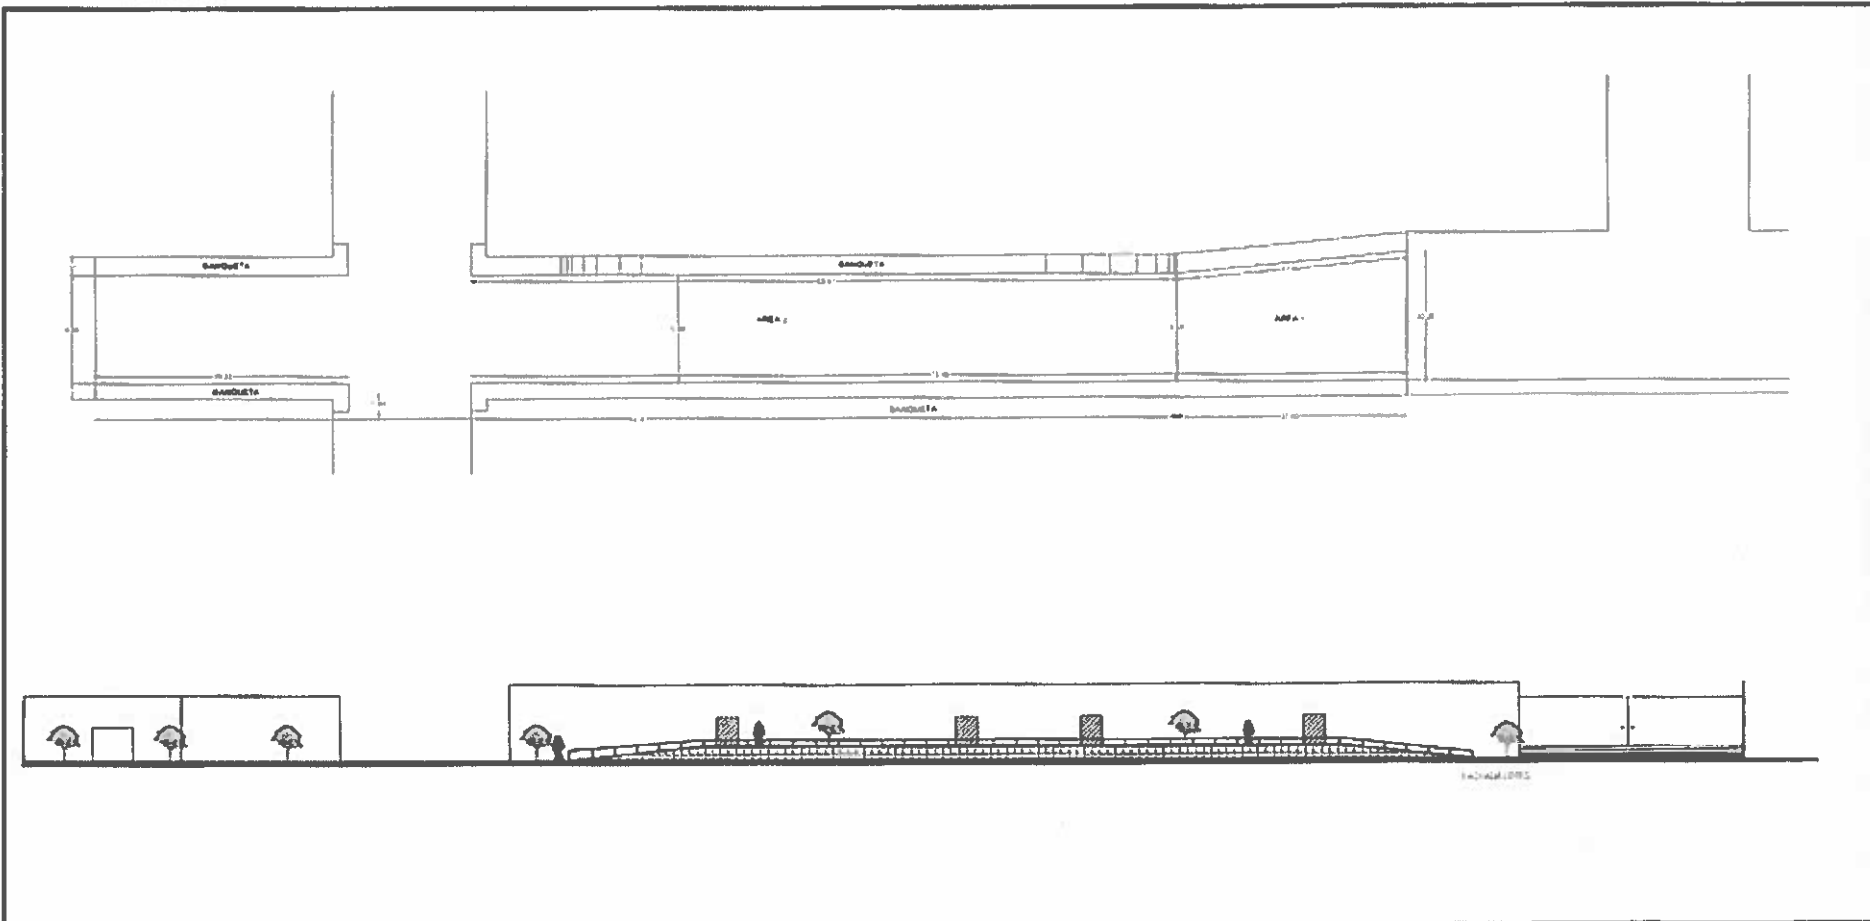



ARQ. LUIS ANTONIO BEAUTE HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

000116

FINIQUITO	HOJAS:	09 DE 10	 SOMBRETERETE A 1 MILETO 2021 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRETERILLO (CUARTA ETAPA)."
	PERIODO:	09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022		UBICACIÓN:	CABECERA MUNICIPAL.
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,679,617.59		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-0DS-FISM-22-URB-003		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
	FECHA:	08 DE JUNIO DEL 2022			
REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA					

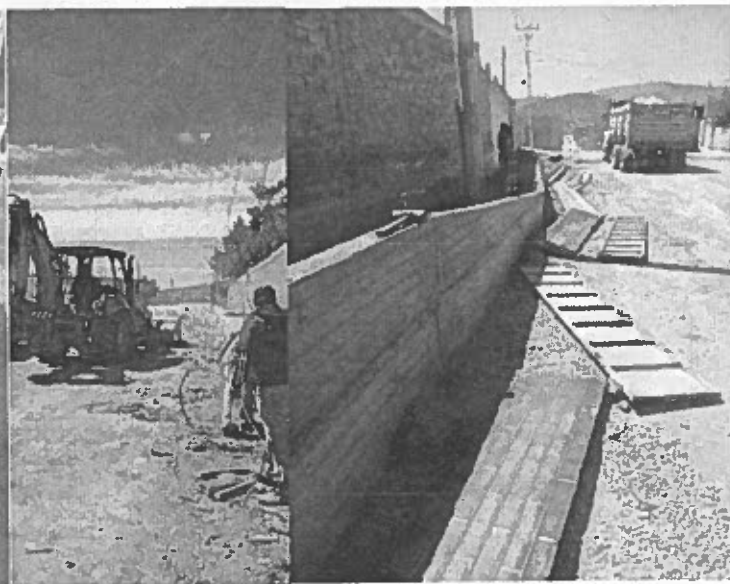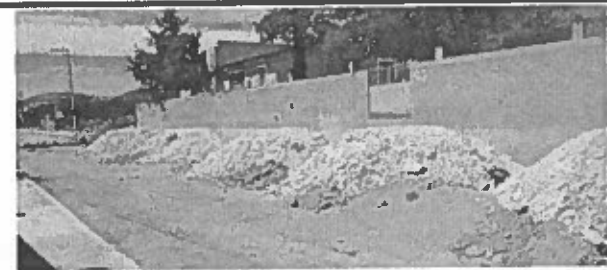

000117

ARQ. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

10 DE 10

PERIODO: 09 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE JUNIO DEL 2022

MONTO CONTRATADO: \$

1,679,617.59

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FISM-22-URB-003

FECHA:

08 DE JUNIO DEL 2022









OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRETERILLO (CUARTA ETAPA)."

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

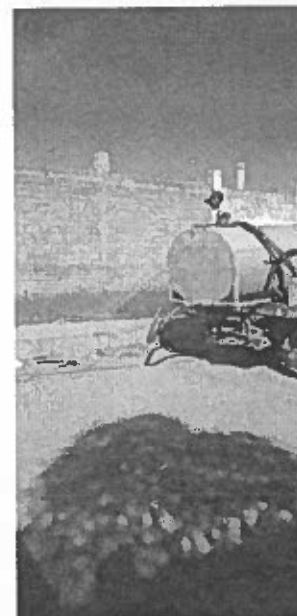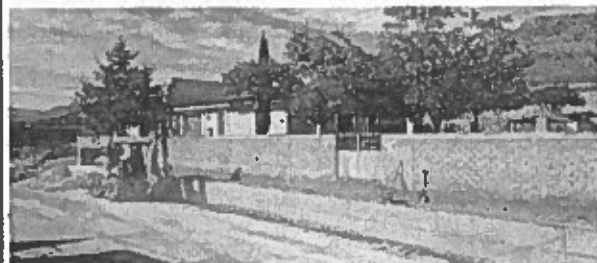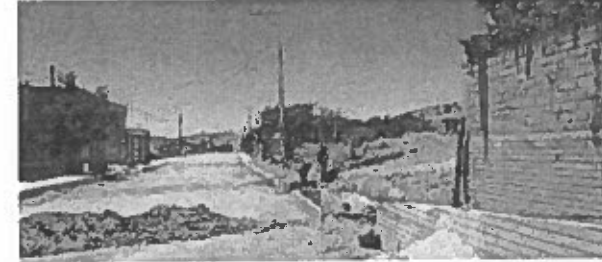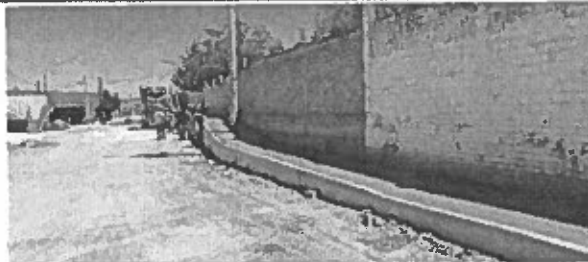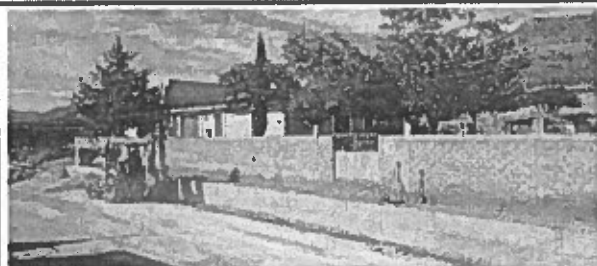

ARQ. LUIS ANTONIO BERNIZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS SERVICIOS DEL REAL LAGUNA
S.A. DE C.V.

000118
