



ESTIMACIÓN:		FINIQUITO	HOJA 1 DE 12	RESUMEN DE FINIQUITO		OBRA:	
PERIODO:		DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022		 SOMBRETERETE BUENOS RESULTADOS		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.	
MONTO CONTRATADO:		\$ 1,035,696.33				UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003				MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
FECHA:		25 DE MARZO DEL 2022				PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2022							
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
01	ELECTRICO	1	LOTE	\$ 892,841.65	\$1,035,696.33		
TOTAL FINIQUITO					\$1,035,696.33		
						FINIQUITO \$892,841.65 IVA 16% \$142,854.68 SUBTOTAL \$1,035,696.33 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00	
ANTICIPO OTORGADO		\$ 310,708.90					
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$ 310,708.90					
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$ -					
SALDO POR AMORTIZAR		\$ -					
						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA ESTIMADO A LA FECHA: \$1,035,696.33 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00 SALDO POR EJERCER \$0.00	
 LUIS ANTONIO BENITEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION			

00115

ESTIMACIÓN:		FINIQUITO	HOJA 2 DE 12		RESUMEN DE FINIQUITO 			OBRA:		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.	
PERIODO:		DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022		UBICACIÓN:				EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)			
MONTO CONTRATADO:		\$ 1,035,696.33		MUNICIPIO:				SOMBRETERE, ZAC.			
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003		PROGRAMA:				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
FECHA:		25 DE MARZO DEL 2022						EJERCICIO FISCAL 2022			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO		
01	ELECTRICO										
04-ELECT-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS URBANA SLIM LED 100W SMD 2835 200PCS AC85-265V 50/60 HZ 11000 LM 1051M/W6500 K RA>70 PF>.95 IP67 surge:4kv CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, TRASLADOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	PZA	150.00	150.00	0.00	150.00	\$ 4,360.79	\$ -	\$ 854,118.50		
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	150.00	150.00	0.00	150.00	\$ 292.59	\$ -	\$ 43,888.50		
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	150.00	150.00	0.00	150.00	\$ 624.74	\$ -	\$ 93,711.00		
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 5,928.40	\$ -	\$ 47,427.20		
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ML	750.00	750.00	0.00	750.00	\$ 16.65	\$ -	\$ 12,487.50		
04-ELECT-151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO 8/10; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 99.90	\$ -	\$ 29,970.00		
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,238.95	\$ -	\$ 11,238.95		
TOTAL DE ELECTRICO								\$ -	\$ 892,841.65		
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 892,841.65		
TOTAL DE FINIQUITO								\$ -	\$ 892,841.65		
ARQ. LUIS ANTONIO BENEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION					

9116

	ESTIMACIÓN:	FINQUITO	HOJA 3 DE 12	RESUMEN DE FINQUITO 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,036,896.33			MUNICIPIO:	SOMBRETE, ZAC.
	Nº. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	Nº. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS URBANA SLIM LED 100W SMD 2835 200PCS AC85-285V 50/60 HZ 11000 LM 1051MAW8500 K RA>70 PF> 95 IP67 surge 4kv CON FOTOCELDA Y DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA EXISTENTE; INCLUYE:							150.00	150.00	150.00	PZA
								TOTAL	150.00		PZA
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 28SY DESMANTELAMIENTO DE ABRAZADERA EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							150.00	150.00	150.00	PZA
								TOTAL	150.00		PZA
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 10 MTS Y DESMANTELAMIENTO DE BRAZO EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							150.00	150.00	150.00	PZA
								TOTAL	150.00		PZA
04-ELECT-052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							8.00	8.00	8.00	PZA
								TOTAL	8.00		PZA
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							750.00	750.00	750.00	ml
								TOTAL	750.00		ml
04-ELECT-151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILINDRICO 6/10; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							300.00	300.00	300.00	PZA
								TOTAL	300.00		PZA
04-ELECT-297	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO							1.00	1.00	1.00	PZA
								TOTAL	1.00		PZA

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ESTIMACIÓN:	FINQUITC	...JA 4 DE 12
PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022	
MONTO CONTRATADO:	\$	1,035,696.33
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003	
FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022	

RESUMEN DE FINIQUIT



OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA

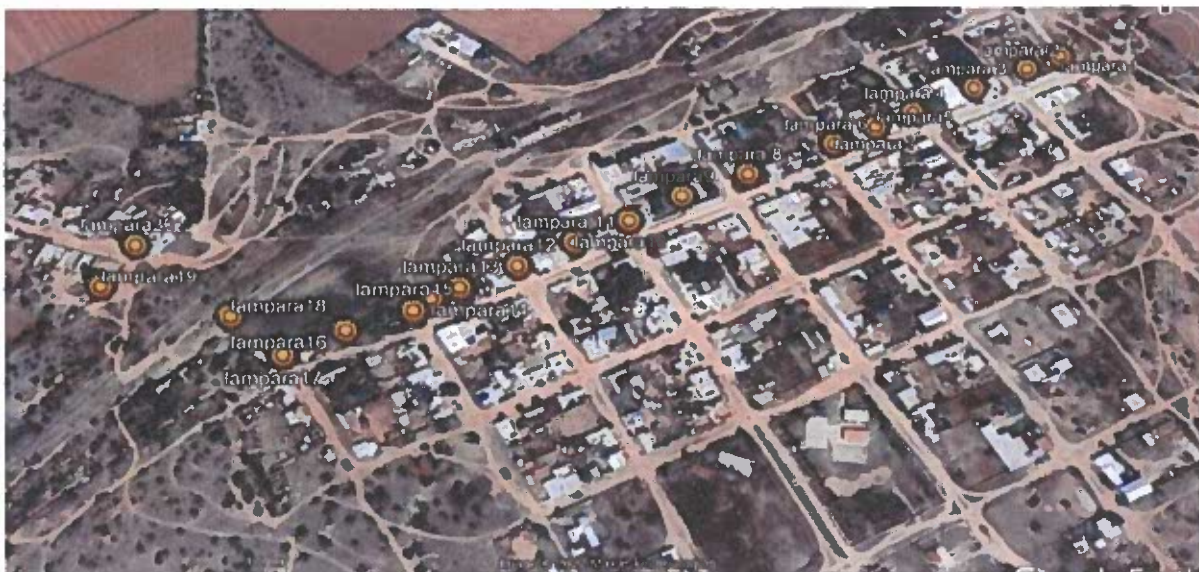

LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
1	23°37'28.90"N	103°31'38.73"O
2	23°37'28.40"N	103°31'39.99"O
3	23°37'27.65"N	103°31'41.95"O
4	23°37'26.71"N	103°31'44.19"O
5	23°37'26.17"N	103°31'45.52"O
6	23°37'25.55"N	103°31'46.96"O
7	23°37'25.55"N	103°31'46.96"O
8	23°37'24.48"N	103°31'49.87"O
9	23°37'23.72"N	103°31'52.01"O
10	23°37'22.88"N	103°31'53.70"O
11	23°37'22.16"N	103°31'55.40"O
12	23°37'21.41"N	103°31'57.16"O
13	23°37'20.71"N	103°31'58.87"O
14	23°37'20.36"N	103°31'59.70"O
15	23°37'19.99"N	103°32'0.19"O
16	23°37'19.42"N	103°32'2.10"O
17	23°37'18.69"N	103°32'3.87"O
18	23°37'20.04"N	103°32'5.53"O
19	23°37'21.23"N	103°32'9.48"O
20	23°37'22.65"N	103°32'8.69"O

00018

ABR. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L. A. Urduec
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Eduardo Rafael T.
ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	DIA 5 DE 12	RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERÍODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,036,696.33		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA



LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
21	23°37'23.05"N	103°32'9.25"O
22	23°37'23.33"N	103°32'10.18"O
23	23°37'23.78"N	103°32'11.54"O
24	23°37'23.48"N	103°32'7.02"O
25	23°37'26.54"N	103°32'7.02"O
26	23°37'30.30"N	103°31'58.78"O
27	23°37'31.31"N	103°31'59.90"O
28	23°37'31.22"N	103°31'41.73"O
29	23°37'30.50"N	103°31'43.58"O
30	23°37'29.73"N	103°31'45.41"O
31	23°37'29.04"N	103°31'47.01"O
32	23°37'28.26"N	103°31'48.83"O
33	23°37'27.70"N	103°31'49.95"O
34	23°37'27.06"N	103°31'51.43"O
35	23°37'26.56"N	103°31'53.01"O
36	23°37'25.75"N	103°31'54.94"O
37	23°37'25.11"N	103°31'56.69"O
38	23°37'24.35"N	103°31'58.42"O
39	23°37'26.43"N	103°31'59.65"O
40	23°37'18.86"N	103°31'53.88"O

611600
 ARQ. JUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUI	HOJA 6 DE 12	RESUMEN DE FINIQUI 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,035,896.33			MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				EJERCICIO FISCAL 2022
CROQUIS DE OBRA						



LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
41	23°37'19.39"N	103°31'52.48"O
42	23°37'20.23"N	103°31'50.55"O
43	23°37'21.24"N	103°31'48.38"O
44	23°37'21.57"N	103°31'47.12"O
45	23°37'22.17"N	103°31'45.80"O
46	23°37'22.95"N	103°31'44.34"O
47	23°37'23.62"N	103°31'42.54"O
48	23°37'25.20"N	103°31'38.72"O
49	23°37'23.61"N	103°31'37.78"O
50	23°37'19.17"N	103°31'43.96"O
51	23°37'18.13"N	103°31'47.10"O
52	23°37'17.02"N	103°31'49.03"O
53	23°37'16.99"N	103°31'49.12"O
54	23°37'17.04"N	103°31'49.14"O
55	23°37'16.56"N	103°31'50.95"O
56	23°37'15.29"N	103°31'53.90"O
57	23°37'11.18"N	103°31'52.18"O
58	23°37'11.78"N	103°31'50.67"O
59	23°37'12.25"N	103°31'49.26"O
60	23°37'13.02"N	103°31'47.58"O

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUI	HOJA 7 DE 12	RESUMEN DE FINIQUI 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$ 1,036,696.33			MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA



LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
61	23°37'13.64"N	103°31'46.00"O
62	23°37'13.65"N	103°31'46.59"O
63	23°37'14.45"N	103°31'43.86"O
64	23°37'15.09"N	103°31'42.20"O
65	23°37'13.54"N	103°31'41.30"O
66	23°37'15.72"N	103°31'42.32"O
67	23°37'17.32"N	103°31'43.00"O
68	23°37'20.16"N	103°31'44.56"O
69	23°37'23.91"N	103°31'46.33"O
70	23°37'26.89"N	103°31'47.76"O
71	23°37'26.07"N	103°31'51.16"O
72	23°37'25.89"N	103°31'50.96"O
73	23°37'22.81"N	103°31'49.56"O
74	23°37'19.57"N	103°31'47.91"O
75	23°37'12.47"N	103°31'44.49"O
76	23°37'9.07"N	103°31'47.32"O
77	23°37'10.66"N	103°31'48.07"O
78	23°37'15.21"N	103°31'50.18"O
79	23°37'15.32"N	103°31'50.23"O
80	23°37'17.96"N	103°31'51.37"O

ARQ. **ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ**
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. **JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS**
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. **EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ**
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	...DIA 8 DE 12
PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022	
MONTO CONTRATADO:	\$	1,036,696.33
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003	
FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022	

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MUNICIPIO:	SOMBRETERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA



LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
81	23°37'20.97"N	103°31'52.72"O
82	23°37'24.48"N	103°31'54.42"O
83	23°37'23.07"N	103°31'57.74"O
84	23°37'19.96"N	103°31'56.05"O
85	23°37'13.98"N	103°31'53.19"O
86	23°37'12.48"N	103°31'52.45"O
87	23°37'25.43"N	103°31'43.11"O
88	23°37'28.31"N	103°31'44.52"O
89	23°37'29.81"N	103°31'41.28"O
90	23°37'26.68"N	103°31'39.47"O
91	23°37'23.64"N	103°31'37.93"O
92	23°37'41.45"N	103°31'42.27"O
93	23°37'29.38"N	103°31'37.98"O
94	23°37'21.88"N	103°31'41.53"O
95	23°37'26.54"N	103°31'40.42"O
96	23°37'26.54"N	103°31'40.42"O
97	23°37'26.26"N	103°31'41.03"O
98	23°37'15.90"N	103°31'40.54"O
99	23°37'17.73"N	103°31'56.78"O
100	23°37'20.72"N	103°31'40.18"O

ARQ. LUIS ANTONIO RIVERO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 9 DE 12	RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,035,896.33		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA



LÁMPARA	COORDENADAS N	COORDENADAS O
101	23°37'15.40"N	103°31'53.82"O
102	23°37'16.73"N	103°31'59.33"O
103	23°37'24.43"N	103°31'40.90"O
104	23°37'16.70"N	103°31'59.55"O
105	23°37'16.24"N	103°32'0.68"O
106	23°37'16.12"N	103°32'1.50"O
107	23°37'16.59"N	103°31'48.02"O
108	23°37'16.59"N	103°31'49.03"O
109	23°37'16.59"N	103°31'49.03"O
110	23°37'15.14"N	103°31'51.40"O
111	23°37'15.14"N	103°31'51.40"O
112	23°37'22.38"N	103°31'51.51"O
113	23°37'18.57"N	103°32'3.88"O
114	23°37'15.79"N	103°31'40.88"O
115	23°37'13.71"N	103°31'58.00"O
116	23°37'15.26"N	103°31'46.01"O
117	23°37'29.78"N	103°31'52.71"O
118	23°37'13.79"N	103°31'49.45"O
119	23°37'25.68"N	103°31'59.24"O
120	23°37'20.72"N	103°32'0.31"O
121	23°37'19.90"N	103°31'59.92"O

ARQ. LUIS ANTONIO RIVERO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINQUIT	OJA 10 DE 13
PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022	
MONTO CONTRATADO:	\$	1,036,696.33
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003	
FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022	

RESUMEN DE FINQUIT



OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	EJERCICIO FISCAL 2022

CROQUIS DE OBRA



LAMPARA	CORDENADAS	
LAMPARA 1	23°48'8.26"N	103°34'33.93"O
LAMPARA 2	23°48'11.65"N	103°34'36.58"O
LAMPARA 3	23°48'13.72"N	103°34'36.08"O
LAMPARA 4	23°48'13.98"N	103°34'37.69"O
LAMPARA 5	23°48'15.27"N	103°34'35.54"O
LAMPARA 6	23°48'17.21"N	103°34'35.16"O
LAMPARA 7	23°48'16.95"N	103°34'34.21"O
LAMPARA 8	23°48'16.80"N	103°34'32.56"O
LAMPARA 9	23°48'17.22"N	103°34'32.60"O
LAMPARA 10	23°48'16.77"N	103°34'31.96"O
LAMPARA 11	23°48'15.44"N	103°34'33.01"O
LAMPARA 12	23°48'16.62"N	103°34'29.90"O
LAMPARA 13	23°48'16.44"N	103°34'29.54"O
LAMPARA 14	23°48'17.79"N	103°34'29.84"O
LAMPARA 15	23°48'19.05"N	103°34'29.47"O
LAMPARA 16	23°48'20.47"N	103°34'29.50"O
LAMPARA 17	23°48'21.22"N	103°34'28.68"O
LAMPARA 18	23°48'23.08"N	103°34'28.11"O
LAMPARA 19	23°48'14.41"N	103°34'29.42"O
LAMPARA 20	23°48'12.62"N	103°34'30.54"O
LAMPARA 21	23°48'11.14"N	103°34'33.87"O
LAMPARA 22	23°48'11.12"N	103°34'33.25"O
LAMPARA 23	23°48'11.53"N	103°34'35.32"O
LAMPARA 24	23°48'8.54"N	103°34'32.06"O
LAMPARA 25	23°48'7.01"N	103°34'32.73"O
LAMPARA 26	23°48'4.88"N	103°34'33.32"O
LAMPARA 27	23°48'3.38"N	103°34'34.09"O
LAMPARA 28	23°48'1.89"N	103°34'34.56"O
LAMPARA 29	23°48'1.89"N	103°34'36.26"O

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍZ HERNÁNDEZ
DISEÑADOR DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN:	FINQUITO	1 DE 13
PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022	
MONTO CONTRATADO:	\$	1,035,696.33
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003	
FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022	

RESUMEN DE FINQUITO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MUNICIPIO:	SOMBRETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	EJERCICIO FISCAL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BERNAL HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	FECHA 12 DE 13	RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
	PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022			UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
	MONTO CONTRATADO:	\$	1,035,696.33		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022				EJERCICIO FISCAL 2022
REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA						



ARQ. LUIS ANTONIO GENTIL HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE OBRA

LS.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	13 DE 13
PERIODO:	DE 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2022	
MONTO CONTRATADO:	\$	1,035,696.33
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-22-ELECT-003	
FECHA:	25 DE MARZO DEL 2022	

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) Y SANTIAGO DE LA HERRADURA.
UBICACIÓN:	EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	EJERCICIO FISCAL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

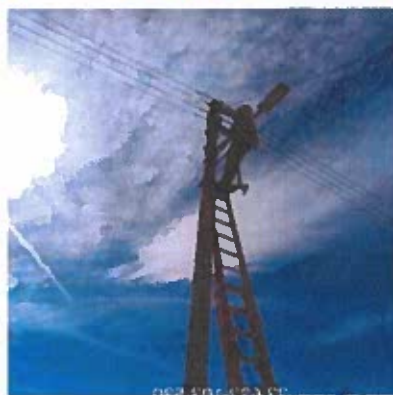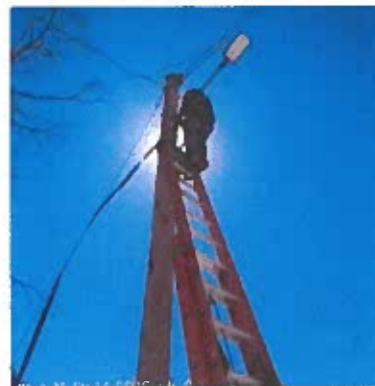

ARQ. LUIS ANTONIO BENTON HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDUARDO RAFAEL TOSCANO NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

127
