




	ESTIMACIÓN: RESUMEN HOJA 1 DE 6 PERIODO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2023 MONTO CONTRATADO: \$ 256,102.00 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001 FECHA: 15 DE MARZO DE 2023	RESUMEN DE FINIQUITO 	OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EJERCICIO: FISCAL 2023.			
CARÁTULA DE ESTIMACIÓN						
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA CENTRO SOMBRERETE, ZACATECAS.	1	LOTE	\$ 256,102.00	\$ 256,102.00	
		TOTAL		RESUMEN DE FINIQUITO		\$ 256,102.00
						ESTIMACIÓN \$220,777.59 IVA 16% \$35,324.41 SUBTOTAL \$256,102.00
						DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO TOTAL \$0.00
						SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 76,830.60			RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:		
AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 76,830.60			ESTIMADO A LA FECHA: \$256,102.00		
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	\$ -			ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -			SALDO POR ESTIMAR \$ -		
 ARQ. LUIS ANTONIO BÉNITEZ HERNÁNDEZ SUPERVISOR DE OBRA		 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ. CONTRATISTA		



ESTIMACIÓN:

FINIQUITO

H DE 6

PERIODO:

DEL

27 DE FEBRERO DE 2023

AL

15 DE MARZO DE 2023

MONTO CONTRATADO:

\$

256,102.00

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001

FECHA:

15 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA

UBICACIÓN:

CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO:

SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EJERCICIO:

FISCAL 2023.

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	6,157.00	-	18,471.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	60.00	60.00	-	60.00	375.00	-	22,500.00
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	mL	80.00	80.00	-	80.00	370.00	-	29,600.00
04-ELECT-689	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA EN 33,000 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.	pza	1.00	1.00	-	1.00	158,746.00	-	158,746.00
04-ELECT-687	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACION PARA MEDICION Y CONTROL DE SUBESTACION ELECTRICA; INCLUYE CAMBIO DE GABINETES BASE SOQUET, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ESTRUCTURA METALICA PARA FIJAR GABINETES.	lote	1.00	1.00	-	1.00	14,682.00	-	14,682.00
04-ELECT-688	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN RED ELECTRICA; INCLUYE VARILLAS DE TIERRA, BAJANTES DE COBRE Y SOLDADURA	lote	1.00	1.00	-	1.00	12,103.00	-	12,103.00

SUMA HOJA No. 2

\$

-


256,102.00

TOTAL DE RESUMEN DE FINIQUITO

\$

-

256,102.00




ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ

SUPERVISOR DE OBRA



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HORA DE 6
PERIODO: DEL 27 DE FEBR DE 2023
AL 15 DE MARZO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 256,102.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001
FECHA: 15 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EJERCICIO FISCAL 2023.

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E1					3	3.00		
								TOTAL	3.00		pza
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E3		60.00			1	60.00		
								TOTAL	60.00		mL
04-ELECT-049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE E1		80.00			1	80.00		
								TOTAL	80.00		mL
04-ELECT-689	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA EN 33,000 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E.		POSTE E1					1	1.00		
								TOTAL	1.00		pza
04-ELECT-687	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACION PARA MEDICION Y CONTROL DE SUBESTACION ELECTRICA; INCLUYE CAMBIO DE GABINETES BASE SOQUET, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ESTRUCTURA METALICA PARA FIJAR GABINETES.		POSTE E1					1	1.00		
								TOTAL	1.00		lote
04-ELECT-688	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN RED ELECTRICA; INCLUYE VARILLAS DE TIERRA, BAJANTES DE COBRE Y		POSTE E1					1	1.00		
								TOTAL	1.00		lote

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE
PERIODO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2023
AL 15 DE MARZO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 258,102.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001
FECHA: 15 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2023.

CROQUIS DE OBRA

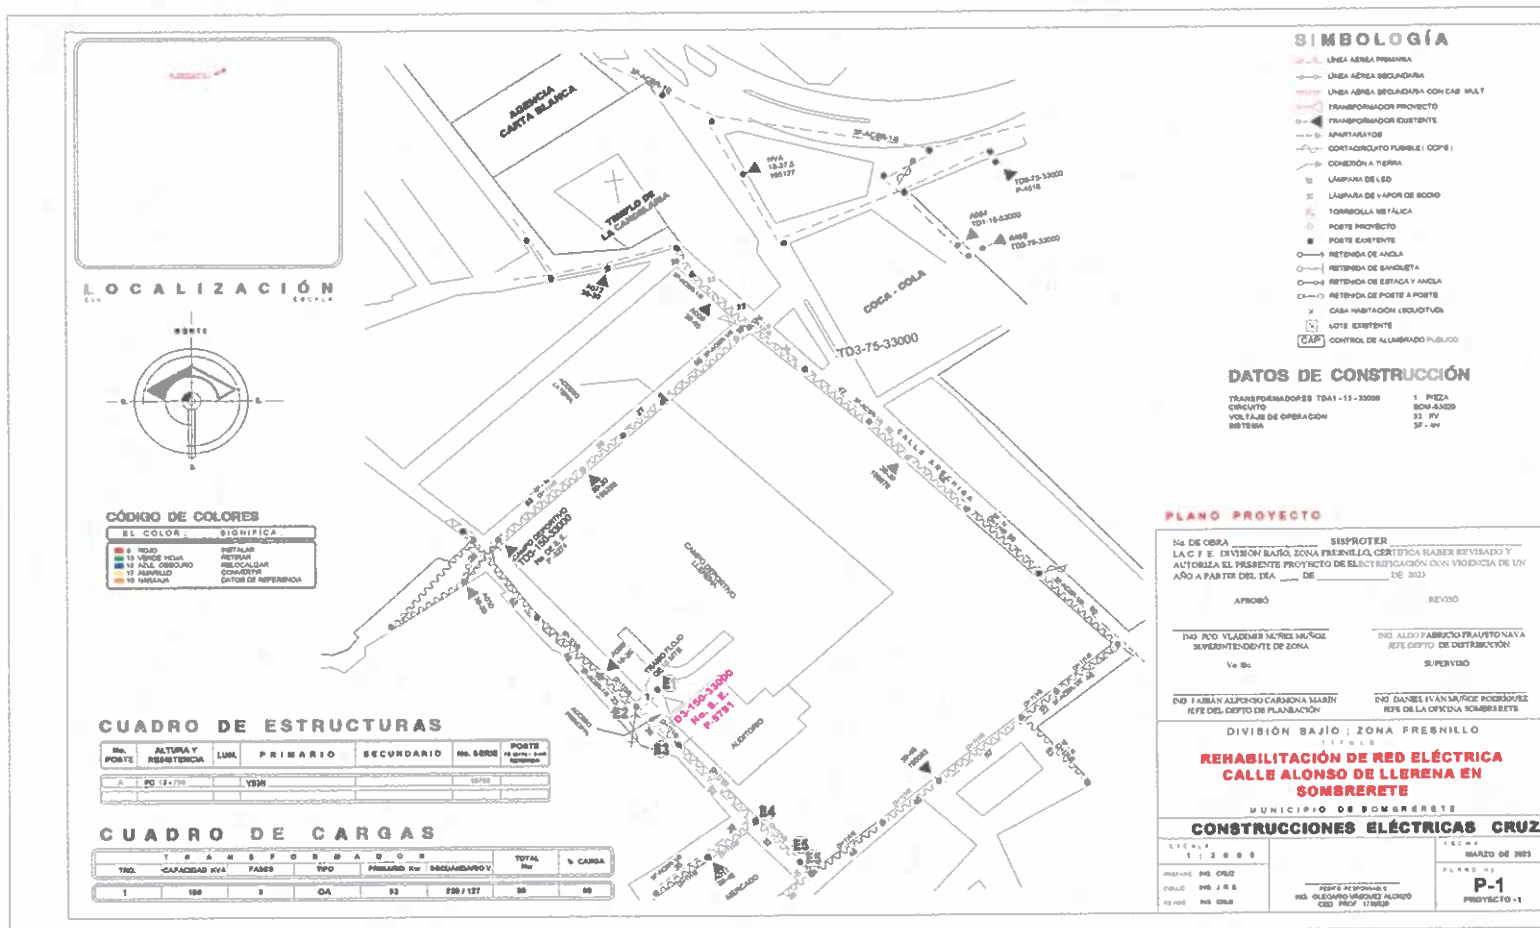

ARQ. LUIS ANTONIO BENTEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 51 6
PERIODO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2023
AL 15 DE MARZO DE 2023
MONTA CONTRATADO: \$ 256,102.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001
FECHA: 15 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 6
PERIODO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2023
AL 15 DE MARZO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 256,102.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-ELECT-001
FECHA: 15 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DE FINIQUITO



OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2023.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. LUIS ANTONIO BÉNITEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA
