

FINIQUITO	HOJAS:	01 DE 11			OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA		
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023			UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE FLORES GARCIA		
	MONTO CONTRATADO:	\$	2,239,832.54		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.		
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).		
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023						
CARATULA DE ESTIMACIÓN								
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES		
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 58,605.53	\$ 67,982.41			
02	CANCHA	1	LOTE	\$ 738,838.05	\$ 857,052.13			
03	TECHUMBRE	1	LOTE	\$ 1,082,528.07	\$ 1,255,732.56			
04	INSTALACION ELECTRICA	1	LOTE	\$ 39,818.47	\$ 46,189.43			
05	HERRERIA	1	LOTE	\$ 11,100.00	\$ 12,876.00			
		TOTAL DE FINIQUITO				\$ 2,239,832.54	FINIQUITO \$1,930,890.12	
							IVA 16% \$308,942.42	
							SUBTOTAL \$2,239,832.54	
							AMORT. DE ANTICIPO \$671,949.76	
							TOTAL	
							SUBTOTAL	
							IVA 16%	
							TOTAL	
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:								
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 671,949.76					ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 2,239,832.54	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 671,949.76	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	SALDO POR EJERCER	\$ 0.00	
SALDO POR AMORTIZAR	\$	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00			
ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN RESIDENTE DE OBRA		L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		Valerio Escobedo CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.				

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 11		CONSTRUCCION	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023		UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,239,832.54		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-007		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023			

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2. POR MEDIOS MANUALES. CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	M2	580.00	580.00	0.00	580.00	\$ 15.63	\$ -	\$ 9,065.40
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE RETIRO Y ACARREO.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 3,850.90	\$ -	\$ 30,807.20
1-PRE-OP-02	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	64.35	64.35	0.00	64.35	\$ 105.26	\$ -	\$ 6,773.48
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	64.35	64.35	0.00	64.35	\$ 185.85	\$ -	\$ 11,959.45
	TOTAL DE PRELIMINARES							\$ -	\$ 68,605.53
02	CANCHA								
03-ALB-027	CIMBRA APARENTE, CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4". INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2	115.20	115.20	0.00	115.20	\$ 285.98	\$ -	\$ 32,944.90
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	144.00	144.00	0.00	144.00	\$ 945.88	\$ -	\$ 136,206.72
1-PRE-OP-00	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 384.55	\$ -	\$ 207,657.00
03-PAVI-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F.C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE MALLA, CIMBA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 662.55	\$ -	\$ 357,777.00
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,252.43	\$ -	\$ 4,252.43
	TOTAL DE CANCHA							\$ -	\$ 738,838.05
03	TECHUMBRE								
1-E-ACERO-0	ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2", CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 27,919.48	\$ -	\$ 55,838.96
1-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8". PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO. INCLUYE: RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 12,650.66	\$ -	\$ 25,301.32

SUMA HOJA No. 01

\$

\$

797,443.57

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria Escobedo F
CONSTRUCTORA VY S. A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 11					OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA			
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023					UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA			
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,239,832.54					MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).			
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023								
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	
03	TECHUMBRE									
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt. DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	99.84	99.84	0.00	99.84	\$ 345.57	\$ -	\$ 34,501.71	
01-PRE-083	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA	M3	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 245.59	\$ -	\$ 4,420.62	
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.	M2	36.80	36.80	0.00	36.80	\$ 211.23	\$ -	\$ 7,773.26	
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCIÓN 1.20 X1.20 MTS. CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 4,250.33	\$ -	\$ 51,003.96	
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCIÓN 40 X 55CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Mt.	18.00	18.00	0.00	18.00	\$ 3,290.63	\$ -	\$ 59,231.34	
3-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 450.70	\$ -	\$ 10,816.80	
3-E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 15,983.88	\$ -	\$ 191,806.56	
3-E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL.14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	92.00	92.00	0.00	92.00	\$ 1,310.22	\$ -	\$ 120,540.24	
3-E-ACERO-0	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN SEPARADORES A CADA 80CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 39,991.55	\$ -	\$ 239,949.30	
03-ALB-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 513.93	\$ -	\$ 6,167.16	
3-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	KG	285.00	285.00	0.00	285.00	\$ 84.74	\$ -	\$ 24,150.90	
SUBTOTAL TECHUMBRE								\$ -	\$ 750,561.85	
SUMA HOJA No. 02								\$ -	\$ 942,168.41	
 ARQ. YENICA CORONADO ESTUPIÑAN RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.				

FINIQUITO	HOJAS:	04 DE 11					OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA			
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023					UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA			
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,239,832.54					MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).			
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023								
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
03	TECHUMBRE									
03-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	KG	266.00	266.00	0.00	266.00	\$ 84.59	\$ -	\$ 22,500.94	
03-E-ACERO-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO	M2	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 372.30	\$ -	\$ 201,042.00	
03-E-ACERO-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	60.00	60.00	0.00	60.00	\$ 368.94	\$ -	\$ 22,136.40	
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL. COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 445.55	\$ -	\$ 5,346.60	
	TOTAL DE TECHUMBRE						\$ -	\$ -	\$ 1,082,528.07	
04	INSTALACION ELECTRICA									
04-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS ; INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 2,451.10	\$ -	\$ 24,511.00	
04-ELECT-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,838.67	\$ -	\$ 2,838.67	
06-E-ELE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICICO TWH DEL NO. 12, 14, CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 1,246.88	\$ -	\$ 12,468.80	
	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA						\$ -	\$ -	\$ 39,818.47	
05	HERRERIA									
09-HERR-007	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2"X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 11,100.00	\$ -	\$ 11,100.00	
	TOTAL DE HERRERIA						\$ -	\$ -	\$ 11,100.00	
SUMA HOJA No. 02								\$ -	\$ 1,133,446.54	
								\$ -	\$ 1,930,890.12	
 M.D. YESICA CARRONADO ESTUPIÑAN RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  Valeria B. Becerra de F. CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.										

HOJAS: 05 DE 11

PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

RATADO: \$ 2,239,832.54

INTRATO: M50-DDS-FAISMUN-23-URB-002

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1.130 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-2	A-B		19.00	30.53			560.00	560.00	M2
							TOTAL		580.00		M2
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE RETIRO Y ACARREO.	1-2	A-B					8.00	8.00	8.00	PZA
							TOTAL		8.00		PZA
01-PRE-OP-020	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1-2	A-B		53.63	1.20			64.35	64.35	M2
							TOTAL		64.35		M2
01-PRE-013	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM. APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, Y LO NECESARIO PARA SU	1-2	A-B		53.63	1.20	1.00		64.35	64.35	M3
							TOTAL		64.35		M3
03-ALB-027	CIMBRA APARENTE, CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4". INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	1-2	A-B		100.00		1.15		115.20	115.20	M2
							TOTAL		115.20		M2
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR,CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B		100.00		1.44		144.00	144.00	M2
							TOTAL		144.00		M2
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		18.00	30.00	1.00		540.00	540.00	M3
							TOTAL		540.00		M3
03-PAVI-018	CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIAO, SECCIONADO EN	1-2	A-B		18.00	30.00			540.00	540.00	M2
							TOTAL		540.00		M2

Valeria Escobedo F.
CONSTRUCTORA WY S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	06 DE 11
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,239,832.54
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL. CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
								TOTAL	1.00		PZA
19-E-ACERO-030	ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZA
								TOTAL	2.00		PZA
19-E-ACERO-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO. SEGUN DISEÑO.	1-2	A-B					2.00	2.00		PZA
								TOTAL	2.00		PZA
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00ml. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1-2	A-B		100.00	0.80	1.25		99.84	99.84	M3
								TOTAL	99.84		M3
01-PRE-083	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION COMPACTADO CON PISON DE MADERA.	1-2	A-B		2.00	2.00	4.50		18.00	18.00	M3
								TOTAL	18.00		M3
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. REVENIMIENTO 8 A 10 CM. ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREO Y COLADO.	1-2	A-B		3.00	12.27					M2
								TOTAL	36.80		M2
02-CIM-020	ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20 X1.20 MTS. CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL	12.00		PZA
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM	1-2	A-B		18.00			18.00	18.00	18.00	ML
								TOTAL	18.00		ML

ARQ. YESICA CORTADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria E. Escobedo F.
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 11
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,239,832.54
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
19-E-ACERO-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO	1-2	A-B					24	24.00	24.00	PZA
								TOTAL		24.00	PZA
19-3-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES. DESPERDICIOS. MANO	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL		12.00	PZA
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	1-2	A-B					92.00	92.00	92.00	PZA
								TOTAL		92.00	PZA
19-E-ACERO-010	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"X2" (BLANCO) EN DIAGONALES. PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN	1-2	A-B					6.00	6.00	6.00	PZA
								TOTAL		6.00	PZA
03-ALB-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	1-2	A-B					12.00	12.00	12.00	PZA
								TOTAL		12.00	PZA
19-E-ACERO-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO	1-2	A-B					285.00	285.00	285.00	KG
								TOTAL		285.00	KG
19-E-ACERO-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	1-2	A-B					266.00	266.00	266.00	KG
								TOTAL		266.00	KG
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PLAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1" INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO	1-2	A-B		30.00	18.00			540.00	540.00	M2
								TOTAL		540.00	M2

ARACELY YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valerio Escobedo F.
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	08 DE 11
	PERIODO:	15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,239,832.54
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002
	FECHA:	01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERAD

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
19-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PUJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE: BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	1-2	A-B		60.00				60.00	60.00	ML
								TOTAL	60.00		ML
03-ALB-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUMAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B				12.00		12.00	12.00	ML
								TOTAL	12.00		ML
04-ELECT-553	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS ; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					10.00	10.00	10.00	PZA
								TOTAL	10.00		PZA
04-ELECT-554	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
								TOTAL	1.00		PZA
06-I.ELE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICO TWH DEL NO. 12, 14 CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO	1-2	A-B					10.00	10.00	10.00	PZA
								TOTAL	10.00		PZA
09-HERR-007	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2"X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZA
								TOTAL	1.00		PZA

ARQ. YERICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria Escoedo
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 09 DE 11

PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 2,239,832.54

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA:


TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CROQUIS DE OBRA

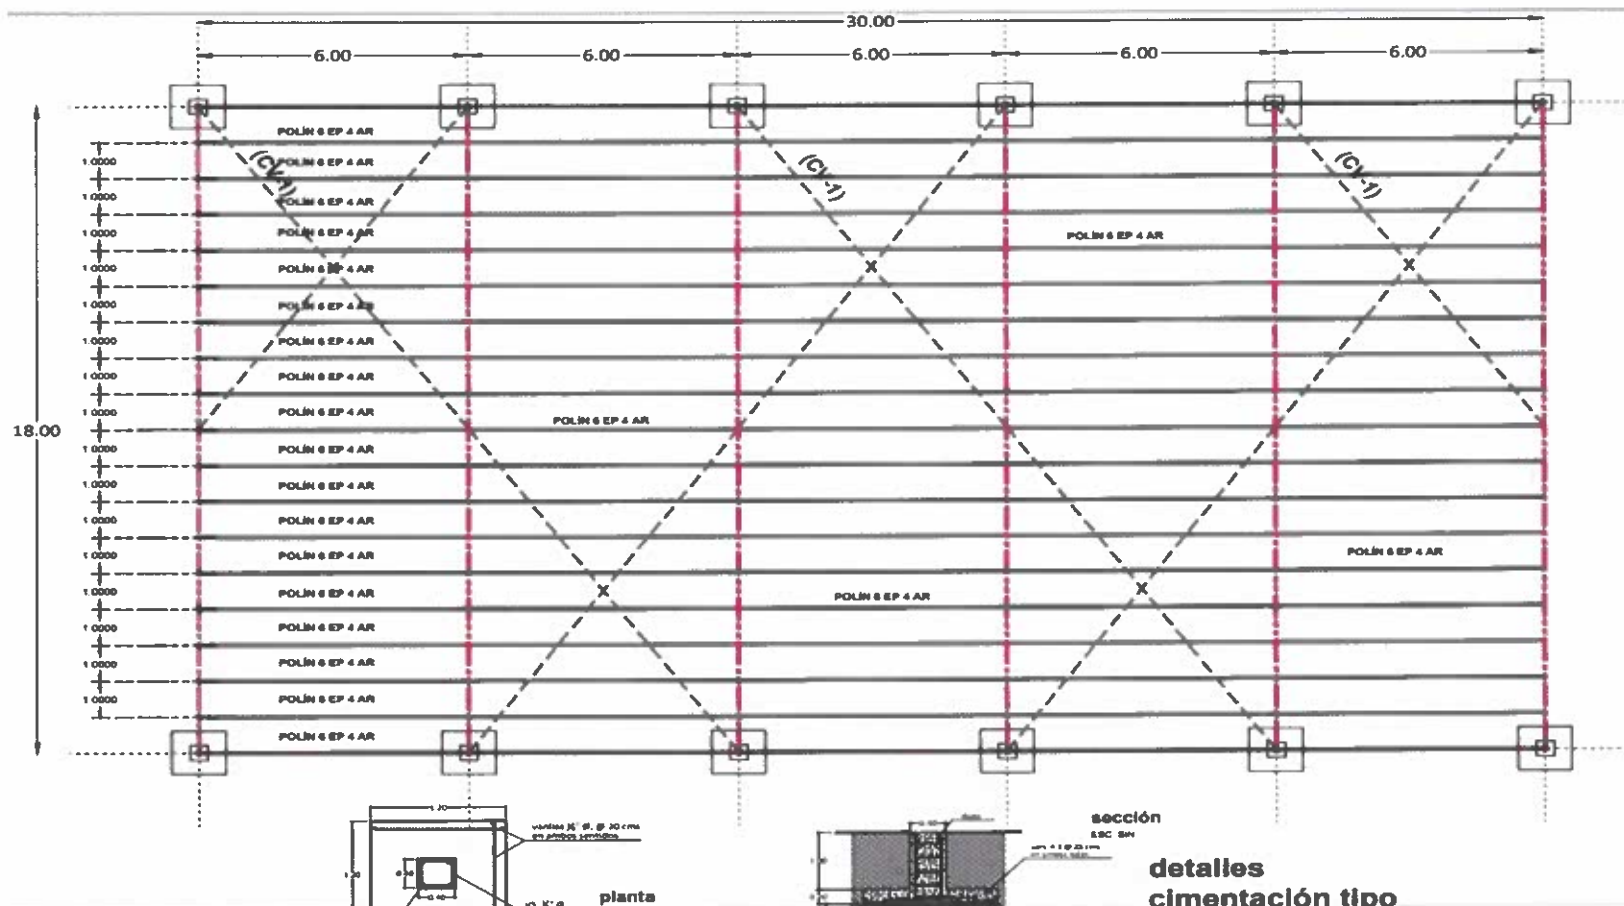

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valeria EFSLobede F
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO


HOJAS: 10 DE 11
PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 2,239,832.54
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002
FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARACELYSICA CORONADO ESTUPIÑÁN
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CENCAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

11 DE 11

PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 2,239,832.54

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-002

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE FLORES GARCIA

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Valerio Becerra de F
CONSTRUCTORA VVY S. A. DE C.V.
