


FINIQUITO	HOJAS:	01 DE 09			OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO	
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023			UBICACIÓN:	COLONIA HIDALGO	
	MONTO CONTRATADO:	\$	2,472,491.95		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), 2023	
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023					
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO		CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES		1	LOTE	\$ 141,887.99	\$ 164,590.07	
02	ALBAÑILERIA		1	LOTE	\$ 1,817,152.57	\$ 2,107,896.98	
03	HERRERIA		1	LOTE	\$ 172,418.01	\$ 200,004.89	
				TOTAL DE FINIQUITO		\$ 2,472,491.95	
						FINIQUITO	\$2,131,458.58
						IVA 16%	\$341,033.37
						SUBTOTAL	\$2,472,491.95
						AMORT. DE ANTICIPO	\$741,747.58
						TOTAL	\$1,730,744.36
						SUBTOTAL	\$1,492,021.00
						IVA 16%	\$238,723.36
						TOTAL	\$1,730,744.36
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:							
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 741,747.59						ESTIMADO A LA FECHA: \$ 2,472,491.95
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 741,747.58	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	\$ -
 ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA  L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  JESUS ROJAS Z. CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.							

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 09					CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO			
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023					UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO			
	MONTO CONTRATADO: \$	2,472,491.95					MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023			
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023								
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
1.0	PRELIMINARES									
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	192.00	192.00	0.00	192.00	\$ 20.68	\$ -	\$ 3,970.56	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D. DE O A 2 10 M DE PROFUNDIDAD.	M3	78.00	78.00	0.00	78.00	\$ 406.94	\$ -	\$ 31,741.32	
01-PRE-013	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO. SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAQUINA	M3	101.40	101.40	0.00	101.40	\$ 210.12	\$ -	\$ 21,306.17	
01-PRE-042	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA	M3/KM	101.40	101.40	0.00	101.40	\$ 19.59	\$ -	\$ 1,986.43	
03-ALB-171	BOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN DE LA CIMENTACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS, MATERIALES, FLETES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	HRS	144.00	144.00	0.00	144.00	\$ 575.58	\$ -	\$ 82,883.52	
1.0	TOTAL DE PRELIMINARES						\$ -	\$ -	\$ 141,887.90	
02	ALBAÑILERÍA									
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,	M2	71.90	71.90	0.00	71.90	\$ 283.72	\$ -	\$ 20,399.47	
03-ALB-167	CIMENTACIÓN DE PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 1.20 M. DE ANCHO, F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40% RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIO, ACARREOS, COLOCACIÓN, M. DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M3	71.10	71.10	0.00	71.10	\$ 4,097.34	\$ -	\$ 291,320.87	
03-ALB-168	PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 0.50 M. DE ANCHO, F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40%. RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIO, ACARREOS, COLOCACIÓN, M. DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	M3	45.42	45.42	0.00	45.42	\$ 4,393.38	\$ -	\$ 199,547.32	
03-ALB-169	CIMBRA METÁLICA EN PILASTRAS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE EN FORMA DE TABIQUE, INCLUYE. CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	363.40	363.40	0.00	363.40	\$ 572.25	\$ -	\$ 207,955.65	
03-ALB-170	CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO PARA LOSA EN ACABADO APARENTE INCLUYE TRATAMIENTO DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M2	114.00	114.00	0.00	114.00	\$ 678.20	\$ -	\$ 77,314.80	
1-PRE-OP-06	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	540.00	540.00	0.00	540.00	\$ 403.77	\$ -	\$ 218,035.80	
03-ALB-112	TRABE AGODA EN LOSA CON SECCION DE 0.20 X 0.40 MTS A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 , 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y 4 VARILLAS DE NO.5 CON ESTRIBOS DE NO. 3 ACADA .20 CMS INCLUYE: CIMBRA, ACABADO COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	ML	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 3,235.57	\$ -	\$ 77,653.68	
03-ALB-114	LOSA DE CONCRETO REFORZADA DE FC=250 KG/CM2 ARMADA CON DOS PARILLAS, UNA PARILLA SUPERIOR POR TEMPERATURA CON VARILLAS DEL No.4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, UNA PARILLA INFERIOR DE REFUERZO CON VARILLAS DEL No.5 @ 20 CMS LONGITUDINALES Y VARILLA DEL NO.5 @20 CM TRASVERSALES.	M2	96.00	96.00	0.00	96.00	\$ 3,656.64	\$ -	\$ 351,037.44	
SUMA HOJA No. 01							\$ -	\$ -	\$ 1,443,265.03	
 ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIMÉ ARTURO VIEDMA CECÉÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 JESUS ROJAS Z. CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.				

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 09					OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO		
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023					UBICACIÓN:	COLONIA HIDALGO		
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,472,491.95					MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.		
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004					PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023		
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023								
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
03-ALB-048	ZAMPÉO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 35 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2	M2	364.00	364.00	0.00	364.00	\$ 561.90	\$ -	\$ 204,531.60	
11-O-EXT-001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	135.10	135.10	0.00	135.10	\$ 910.95	\$ -	\$ 123,069.35	
11-O-EXT-001	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.40 CIMBRA COMÚN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	35.50	35.50	0.00	35.50	\$ 456.97	\$ -	\$ 16,222.44	
BANQ-01	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.12 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	59.50	59.50	0.00	59.50	\$ 505.28	\$ -	\$ 30,064.16	
2.0	TOTAL DE ALBAÑILERIA							\$ -	\$ 1,817,152.57	
3.0	HERRERIA									
09-HERR-001	BARANDAL PASAMANOS DE 100 M DE ALTURA, CON HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR DE 3" Y 1" 1/2 CAL. 14, VERTICALES DE PLACA DE 1/4" Y SOLERA DE 2" EN CAL. 14, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 2,845.17	\$ -	\$ 68,284.08	
09-HERR-001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2" X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 15,948.28	\$ -	\$ 15,948.28	
14-ELECT-601	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA SUBURBANA CON FOTOCELDA Y LAMPARA LED DE ULTIMA GENERACIÓN DE 75WATTS, CON POSTE CONICO Y BRAZO. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DEL CABLE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 44,092.82	\$ -	\$ 88,185.64	
SUBTOTAL DE HERRERIA									\$ 172,418.01	
SUMA HOJA No. 02							\$ -	\$ -	\$ 188,366.29	
 ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.					

FINIQUITO	HOJAS:	04 DE 09
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,472,491.95
	No. DE CONTRATO:	MSO-ODS-FAISMUN-23-URB-006
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023



OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO
UBICACIÓN:	COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	1-2	A-B		19.00	10.11			192.00	192.00	M2
								TOTAL	192.00		M2
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 418 D, DE 0 A 2 10 M DE PROFUNDIDAD,	1-2	A-B		30.00	1.00	2.60		78.00	78.00	M3
								TOTAL	78.00		M3
01-PRE-013	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. PRIMER KILOMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA. CARGA CON	1-2	A-B		9.00	12.00	0.94		101.40		M3
								TOTAL	101.40		M3
01-PRE-042	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. KILOMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.	1-2	A-B		9.00	12.00	0.94		101.40	101.40	M3/KM
								TOTAL	101.40		M3/KM
03-ALB-171	BOMBEO DE AGUA CON EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN DE LA CIMENTACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS, MATERIALES, FLETES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	1-2	A-B					144.00	144.00	144.00	HRS
								TOTAL	144.00		HRS
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.	1-2	A-B		72.00	1.00			71.90	71.90	M2
								TOTAL	71.90		M2
03-ALB-167	CIMENTACIÓN DE PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 1.20 M. DE ANCHO, F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40% RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIO.	1-2	A-B		72.00	1.00	0.99		71.10	71.10	M3
								TOTAL	71.10		M3
03-ALB-168	PILASTRAS DE CONCRETO CICLÓPEO DE 0.50 M. DE ANCHO, F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Y PIEDRA BOLA EN PROPORCIÓN 60% - 40% RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIO, ACARREOS, COLOCACION M. DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA	1-2	A-B		72.00	1.00	0.63		45.42	45.42	M3
								TOTAL	45.42		M3

ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	05 DE 09
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	2,472,491.95
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023



OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO
UBICACIÓN:	COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-ALB-169	CIMBRA METÁLICA EN PILASTRAS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE EN FORMA DE TABIQUE, INCLUYE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	1-2	A-B		72.00	5.05			363.40	363.40	M2
								TOTAL	363.40		M2
03-ALB-170	CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO PARA LOSA EN ACABADO APARENTE INCLUYE: TRATAMIENTO DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B		72.00	1.58			114.00	114.00	M2
								TOTAL	114.00		M2
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		15.00	40.00	0.90		540.00	540.00	M3
								TOTAL	540.00		M3
03-ALB-112	TRABE AGODA EN LOSA CON SECCION DE 0.20 X 0.40 MTS. A BASE DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y 4 VARILLAS DE NO.5 CON ESTRIBOS DE NO. 3 ACADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	1-2	A-B		24.00				24.00	24.00	ML
								TOTAL	24.00		ML
03-ALB-114	LOSA DE CONCRETO REFORZADA DE FC=250 KG/CM2 ARMADA CON DOS PARILLAS, UNA PARILLA SUPERIOR POR TEMPERATURA CON VARILLAS DEL No.4 @ 20 CMS AMBOS LADOS, UNA PARILLA INFERIOR DE REFUERZO CON VARILLAS DEL No.5 @ 20 CMS LONGITUDINLES Y VARILLA DEL NO.5 @20 CM TRASVERSALES	1-2	A-B		12.00	8.00			96.00	96.00	M2
								TOTAL	96.00		M2
03-ALB-048	ZAMPEO A BASE DE PIEDRA BOLA DE 35 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F' C = 250 KG/CM2	1-2	A-B		12.00	30.33			364.00	364.00	M2
								TOTAL	364.00		M2
11-O-EXT-006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C= 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	1-2	A-B		16.99	8.00			135.10	135.10	M2
								TOTAL	135.10		M2


ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CARDENHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 09	 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023		UBICACIÓN:	COLONIA HIDALGO
	MONTO CONTRATADO: \$	2,472,491.95		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	07 DE JULIO DEL 2023			

CROQUIS DE OBRA

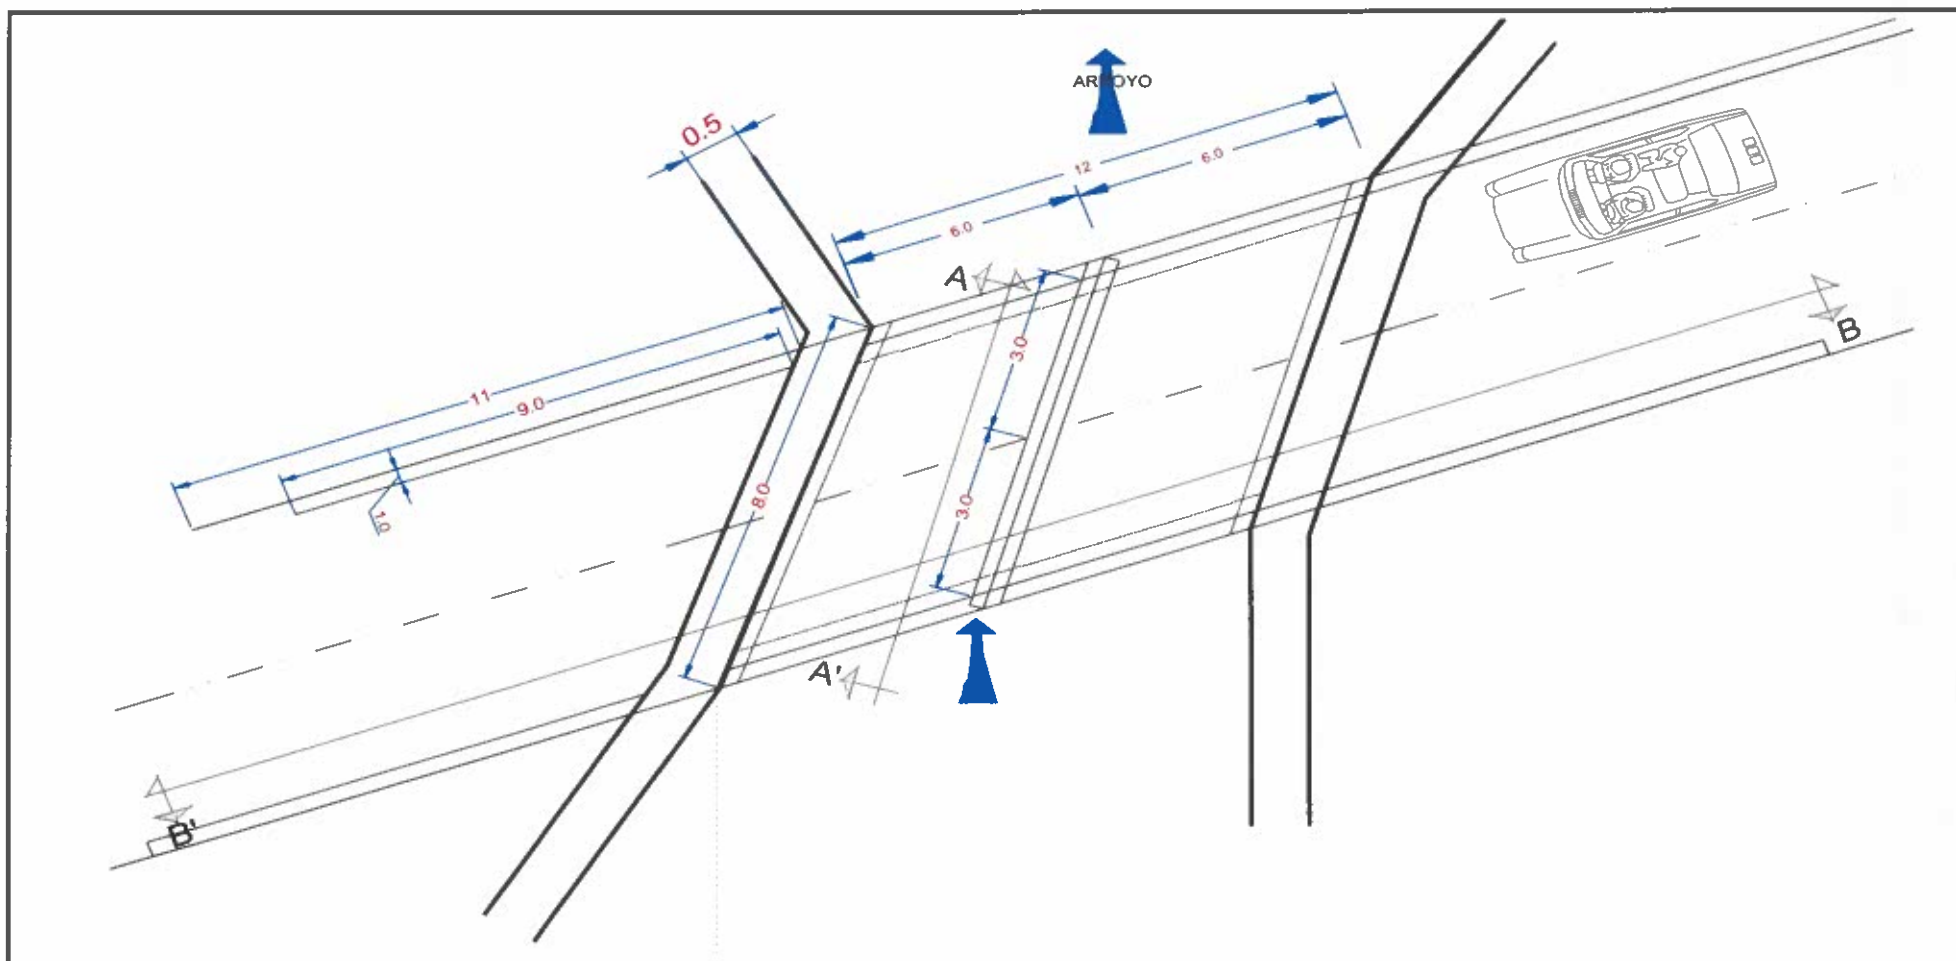

 ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 JESUS ROJAS CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
--	---	--


FINIQUITO

HOJAS: 08 DE 09
PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 2,472,491.95
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006
FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

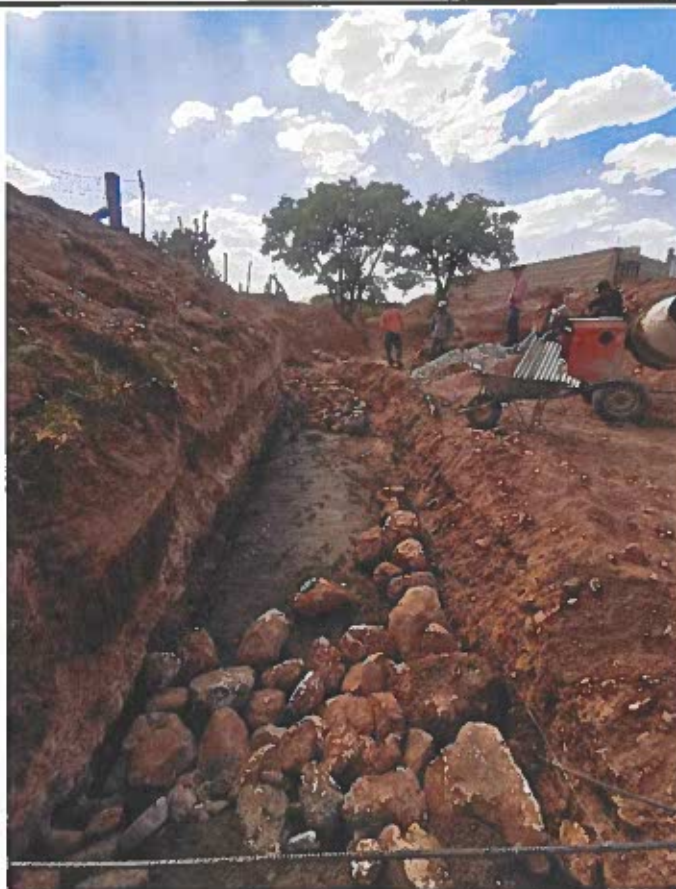



ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


JESUS ROMAS Z.
CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

09 DE 09

PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 07 DE JULIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 2,472,491.95

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-006

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2023

**SOMBRERETE**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO

UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA





ING. CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



CARDENAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
