



ESTIMACIÓN: FINIQUITO
PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 486,903.63
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023

FINIQUITO

OBRA: PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

CARATULA DE ESTIMACIÓN						OBSERVACIONES
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	
1	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 58,085.52	\$ 67,379.20	
2	CIMENTACION	1	LOTE	\$ 103,447.80	\$ 119,999.45	
3	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$ 258,211.19	\$ 299,524.98	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 486,903.63	
DEDUCCIONES:						
AMORT. DE ANTICIPO						\$146,071.09
SUBTOTAL						\$486,903.63
IVA 16%						\$67,159.12
TOTAL						
SUBTOTAL						
IVA 16%						
TOTAL						
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:						
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 146,071.09	4 AL MILLAR:	\$ -	ESTIMADO A LA FECHA:	\$486,903.63	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 146,071.09	AMORT. A LA FECHA:	\$0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -	SALDO POR EJERCER	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -			

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

Superintendente de la Empresa
LIERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINQUITO
PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 486,903.63
No. DE CONTRATO: MSD-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023

FINQUITO

OBRA: ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES									
01-PRE-023	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.	M2	645.00	645.00	0.00	645.00	18.00	\$	\$	11,610.00
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE RETIRO Y ACARREO	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	3,900.00	\$	\$	23,400.00
01-PRE-013	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	134.16	134.16	0.00	134.16	172.00	\$	\$	23,075.52
SUBTOTAL DE PRELIMINARES										
02	CIMENTACION									59,085.52
01-PRE-058	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	103.20	103.20	0.00	103.20	350.00	\$	\$	36,120.00
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO	M2	129.00	129.00	0.00	129.00	86.00	\$	\$	11,094.00
02-CIM-016	MAMPPOSTERIA EN CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.5 A 1.0 M3/M2, JUNTEANDO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA PROP. 1:4, INCLUYENDO PIEDRA DE LA REGION	M3	86.55	86.55	0.00	86.55	560.00	\$	\$	48,468.00
02-CIM-014	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P P S CON COMPACTADOR TIPO BALARINA.	M3	45.15	45.15	0.00	45.15	172.00	\$	\$	7,765.80
SUBTOTAL DE CIMENTACION										
										103,447.80

SUMA TOTAL \$ 103,447.80 \$ 103,447.80

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO
PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 486,903.63
NO. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-EDUC-002
FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2023

FINIQUITO

OBRA: ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE PRESUPUESTO	CANTIDAD DE ESTIMACIÓN	CANTIDAD DE ESTIMACIÓN	CANTIDAD DE ESTIMACIÓN	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
03	ALBANILERIA								
03-ALB-030	CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F.C. = 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 AC 20 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE	ML	215.00	215.00	0.00	215.00	196.00	\$ -	\$ 42,140.00
03-ALB-067	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:3. JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.	M2	437.50	437.50	0.00	437.50	250.00	\$ -	\$ 109,375.00
03-ALB-008	CASTILLO DE CONCRETO F.C.= 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA C/A VARILLA DEL #3 (387) FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM INCLUYE CHAFLAN, CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VATILLAS/O.	ML	266.40	266.40	0.00	266.40	185.00	\$ -	\$ 49,284.00
03-ALB-010	CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO F.C. = 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 AC 20 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE	ML	215.00	215.00	0.00	215.00	196.00	\$ -	\$ 42,140.00
9-HERR-010	LETREERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2" X 2". LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LETENDAS DE OBRA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	15,272.19	\$ -	\$ 15,272.19
SUBTOTAL DE ALBANILERIA								\$ -	\$ 258,211.19
SUMA TOTAL								\$ 258,211.19	\$ 258,211.19

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D.SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO DE MATEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO, URBANO DE 250 A 750 M2, POR
MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA.

ESTIMACIÓN PERIODO FINQUITO
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

TRAZO Y NIVELACION.



TRAZO Y NIVELACION = 215.00 ML

AREA = (215.00 X 3.00) = 645.0 M2

VOLUMEN TOTAL = 645 M2

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

Uñigüña Iborra M

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN
RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO Y ACARREO.

ESTIMACIÓN PERIODO FINIQUITO
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023


RETIRO DE ARBOLES

RETIRO DE ARBOLES

MURO 1 = 6.00

VOLUMEN TOTAL = 6 PZA


DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS


RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ. LUIS ANIBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ


SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O
DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. ESTIMACIÓN PERIODO FINIQUITO
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

ACARREO DE MATERIAL

MURO 1 215 m

VOLUMEN DEL ACARREO =		134.16	M3
LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
MURO 1 = 215.00	X 0.70	X 0.89	= 134.16

VOLUMEN TOTAL = 134.16 M3

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D. SOCIAL
ARQ. LUIS ANTONIO BERNIER HERNANDEZ

Superfina Iberr m
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ESTIMACIÓN PERIODO FINIQUITO
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

EXCAVACIÓN

MURO 1 215 ML



EXCAVACION = 215.00 ML

MURO 1 = 215.00

EXCAVACION = 103.20 M3

MURO 1 = ((10.77 + 0.60) / 2.00) X 0.70 X 215.00 = 103.20 M3

VOLUMEN TOTAL = 103 M3

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARO LOIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN FINQUITO
PERIODO 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM², AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN,

PLANTILLA

MURO 1 215.00 ML



PLANTILLA = 215.00 ML

MURO 1 = 215.00

PLANTILLA = 129.00 M³

LARGO ANCHO VOL.
MURO 1 = 215.00 X 0.60 = 129.00 M²

VOLUMEN TOTAL = 129.00 M²

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARO. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

Superintendente de la Empresa
LIERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

MAMPOSTERIA EN CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 0.5 A 1.0 M3/ML
JUNTANDO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA PROP. 1:4, INCLUYENDO PIEDRA DE LA REGION.

ESTIMACIÓN PERIODO 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
FINQUITO

CIMENTOS

MURO 1 215.0 ML



CIMENTOS = 215.00 ML

MURO 1 = 215.00

VOLUMEN DEL CIMENTO = 0.70 M3

MURO 1 = ((0.75 + 0.40) / 2.00) X 0.70 X 215.00 = 86.55 M3

VOLUMEN TOTAL = 86.55 M3

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BALARINA.

ESTIMACIÓN PERIODO FINIQUITO
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

RELLENO DE MATERIAL

MURO 1 215.00 ML



EXCAVACION = 215.00 ML

MURO 1 = 215.00

EXCAVACION = 45.16 M3

MURO 1 = ((0.20 + 0.10) / 2.00) X 0.70 X 215.00 = 22.58 X 2 = 45.16 M3

VOLUMEN TOTAL = 45.16 M3

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE O SOCIAL
ARO. LUIS ANTONIO DE NITIZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

J. Viedma

[Signature]

Urgencia

DESARROLLO SOCIAL


OBRA:

CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 15x20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY = 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 A/C 20 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE.

ESTIMACIÓN
PERIODO

CADENA DE DESPLANTE

MURRO



CIMENTOS =	215.00	ML
MURO 1 =	215.00	

MURD 1 = 215.00

VOLUMEN TOTAL

215 ML

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OBRA DE D.SOCIAL
 ARO LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINENDIENTE DE LA EMPRESA
20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

Uffink's Theorem


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

MURO DE BLOK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON
MEZCLA MORTERO ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN
HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.

MURO 1 215.00 ML

MURO DE BLOK

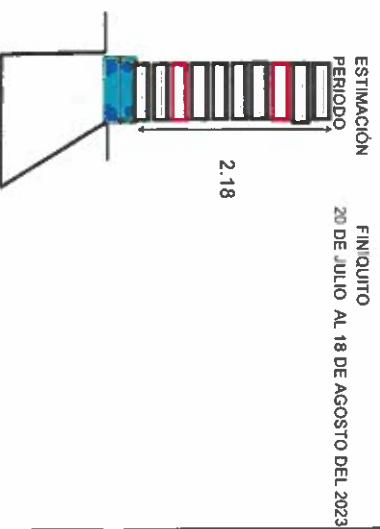

MURO DE BLOK = 215.00 ML

MURO 1 = 215.00

ESPACIO DE LOS CASTILLOS

15 ML

MURO DE BLOK = 200.89 X 2.18 = 437.50 M2

VOLUMEN TOTAL = 437.50 M2

L. A. U. A. C.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS

RESIDENTE DE OBRA DE D. SOCIAL
ARO. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

Virginia Abreu M

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 15X20 CMS ARMADA C/A VARILLA DEL #3 (3/8") F'y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM INCLUYE: CHAPLAN, CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VATILLAS/O.

ESTIMACIÓN PERIODO 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

CASTILLOS DE CONCRETO

MURO 1 215.00 ML



MURO DE BLOK = 215.00 ML
MURO 1 = 215.00

MURO DE BLOK = 215.00 ML
EN CADA SECCION DE 12 MTS / 3 MTS 12 ML = 17.97 = 179 POR LO TANTO SON 18 SECCIONES DE 12 MTS C/U
CASTILLOS CON UNA LONGITUD DE 2.96 ML 4 + 1 = 5 PZAS X 17.97 SECC = 89.856 PZA

VOLUMEN TOTAL = 286.40 ML

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAMIE ARTURO VIEDMA CECENAS

RESIDENTE DE OFICINA DE D SOCIAL
ARO LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A DE C.V

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 A/C 20 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE.

ESTIMACIÓN PERIODO FINIQUITO 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023

CADENA DE CERRAMIENTO

MURO 1 215.00 ML



CIMENTOS =	215.00	ML
MURO 1	=	215.00

VOLUMEN TOTAL	=	215	ML
---------------	---	-----	----

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS

RESIDENTE DE OBRA DE D SOCIAL
ARQ LUIS ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA
LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

[Signature]

[Signature]

Virginia Ibarra M

ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN

CONTRATO NÚMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE

ESTIMACIÓN NÚMERO: FINIQUITO

PERIODO: 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATISTA: LERGO INMOBILIARIO S.A DE C.V.



EXCAVACION



MAMPOSTERIA Y CADENA DE DESPLANTE

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA DE D. SOCIAL

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

ARG. LUIS ANTONIO BERNAL FERNANDEZ

LERGO INMOBILIARIO S.A DE C.V.

Urgencia
tharum

ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN

CONTRATO NÚMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL

SOMBRERETE

ESTIMACIÓN NÚMERO: 1 (UNO)
 PERÍODO: 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA: LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.



CADENA DE DEZPLANTE



COLOCACION DE BLOK

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA DE D. SOCIAL

SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS

ARG. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ

LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.

Uirgencia Irgans M

ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN CONTRATO NÚMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002 OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL		SOMBRERETE CONTRATISTA: LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. PERIODO: 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 ESTIMACIÓN NÚMERO: FINIQUITO	
			
CASTILLOS COLADOS		COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS		RESIDENTE DE OBRA DE D. SOCIAL ARO LUIS KINTONIC GONZALEZ HERNANDEZ	
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.		LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	

ALBUM FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN CONTRATO NÚMERO: MSO-DDS-FAISMUN-23-EDUC-002 OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE CABECERA MUNICIPAL		SOMBRERETE CONTRATISTA: LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. PERIODO: 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023 ESTIMACIÓN NÚMERO: FINIQUITO	
			
TRAMO TERMINADO		LIMPIEZA DE TRAMO	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS <i>[Signature]</i>		RESIDENTE DE OBRA DE O. SOCIAL ARO. LUIS ANTONIO BERNAL HERNANDEZ <i>[Signature]</i>	
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. <i>[Signature]</i>		SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. <i>[Signature]</i>	
