



FINIQUITO	HOJAS:	01 DE 12			OBRA:	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL	
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023			UBICACIÓN:	COLONIA LOPEZ MATEOS	
	MONTO CONTRATADO:	\$	3,853,586.83		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011			PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023	
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023					
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO		CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LO		1	LOTE	\$ 3,322,057.61	\$ 3,853,586.83	
			TOTAL DE FINIQUITO		\$ 3,853,586.83		
							FINIQUITO \$3,322,057.61
							IVA 16% \$531,529.22
							SUBTOTAL \$3,853,586.83
							AMORT. DE ANTICIPO
							TOTAL
							SUBTOTAL
							IVA 16%
							TOTAL
ANTICIPO OTORGADO: \$ 1,156,076.05							RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 1,156,073.05 AMORT. A LA FECHA 0.00							ESTIMADO A LA FECHA: \$ 3,853,586.83
AMORT. A LA FECHA 0.00							
AMORT. A LA FECHA 0.00							
AMORT. A LA FECHA 0.00							
AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00							ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00							
AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00							
SALDO POR AMORTIZAR \$ POR AMORTIZAR 0.00							SALDO POR EJERCER \$
POR AMORTIZAR 0.00							
POR AMORTIZAR 0.00							
POR AMORTIZAR 0.00							
SALDO POR EJERCER \$							
ARQ. YESICA CRONADO ESTUPIÑAN RESIDENTE DE OBRA							L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Mayre Alejandro Ibarra Lopez BOTSUANAY S.A. DE C.V.							

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 12					CONSTRUCCION			
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023					REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL			
	MONTO CONTRATADO:	\$ 3,853,586.83					UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011					MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.			
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
01-PRE-123	RETIRO DE MURO SIN RECUPERACION DE MATERIAL HECHO A BASE DE TRIPLAY, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES.	M2	298.00	298.00	0.00	298.00	\$ 96.59	\$ -	\$ 28,783.82	
01-PRE-124	RETIRO DE LAMINAS SIN RECUPERACION DE MATERIAL EN AREA DE PORTERIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES.	M2	44.80	44.80	0.00	44.80	\$ 209.20	\$ -	\$ 9,372.16	
01-PRE-125	RETIRO DE MALLA EXISTENTE EN ESTRUCTURA PERIMETRAL SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES	M2	896.00	896.00	0.00	896.00	\$ 31.55	\$ -	\$ 28,268.80	
01-PRE-126	RETIRO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL DAÑADA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APILE DE MATERIALES.	ML	42.00	42.00	0.00	42.00	\$ 51.78	\$ -	\$ 2,174.76	
01-PRE-127	RETIRO DE BANCAS DAÑADAS (AREA DE JUGADORES) SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 2,426.77	\$ -	\$ 4,853.54	
01-PRE-128	RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA CICLONICA DAÑADA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES.	M2	38.55	38.55	0.00	38.55	\$ 44.62	\$ -	\$ 1,720.10	
01-PRE-129	DEMOLICION DE BASE PARA BANCAS HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES.	M2	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 366.04	\$ -	\$ 4,392.48	
01-PRE-130	DEMOLICION DE DALA EXISTENTE HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES.	ML	38.55	38.55	0.00	38.55	\$ 120.87	\$ -	\$ 4,659.54	
01-PRE-131	DEMOLICION DE PISO FIRME HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES	M2	23.31	23.31	0.00	23.31	\$ 366.04	\$ -	\$ 8,532.39	
01-PRE-132	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 619.06	\$ -	\$ 17,333.68	
02-CIM-027	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.83	11.83	0.00	11.83	\$ 444.52	\$ -	\$ 5,258.67	
02-CIM-028	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO	M2	10.08	10.08	0.00	10.08	\$ 370.96	\$ -	\$ 3,739.28	
02-CIM-029	ZAPATA AISLADA DE 0.60X0.60 MTS, PERALTE DE 0.20 CMS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO VARILLA DEL #3 (3/8") A CADA 0.15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=250KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 1,917.45	\$ -	\$ 53,688.60	
SUMA HOJA No. 01							\$	\$ -	\$ 172,777.82	
 ARQ. YÉNICA CORONADO ESTUPIRÁN RESIDENTE DE OBRA		 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		 MAYRA ALEJANDRA IBARRA LOPEZ BOTSUANAY S.A. DE C.V.						

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 12					OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL				
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023					UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS				
	MONTO CONTRATADO: \$	3,853,586.83					MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.				
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011					PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023				
FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023										
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO		
02-CIM-030	COLUMNA DADO EN SECCIÓN DE 0.30X0.30 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=250KGS/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2") 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4"), INCLUYE MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 2,554.78	\$ -	\$ 71,533.84		
02-CIM-031	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.	M3	7.45	7.45	0.00	7.45	\$ 344.55	\$ -	\$ 2,566.90		
03-ALB-172	CADENA DE DESPLANTE SECCION 0.15X0.20 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3" F" Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2" @ 0.20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	38.55	38.55	0.00	38.55	\$ 516.97	\$ -	\$ 19,929.19		
03-ALB-173	REPOSICION DE CONCRETO F'C=250KGS/CM2 ACABADO COMUN, EN AREA DE BANCAS Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	23.31	23.31	0.00	23.31	\$ 665.23	\$ -	\$ 15,506.51		
03-ALB-174	PISO FIRME PARA CANCHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KGS/CM2, CON BOMBEO DEL 1% (11 CMS) A PARTIR DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	144.82	144.82	0.00	144.82	\$ 4,361.67	\$ -	\$ 631,657.05		
09-HERR-039	ANCLA DE 1/2", A BASE DE REDONDO USO, CON CUERDA DE 10 CMS., EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.50 MTS. DE LARGO EN EL DADO DE CONCRETO.	PZA	112.00	112.00	0.00	112.00	\$ 445.24	\$ -	\$ 49,866.88		
09-HERR-040	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.20X0.20 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN.	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 721.29	\$ -	\$ 20,196.12		
09-HERR-041	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR 3"X3" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA. MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	252.00	252.00	0.00	252.00	\$ 415.38	\$ -	\$ 104,675.76		
09-HERR-042	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE TRABESAÑOS A BASE DE PTR 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	324.00	324.00	0.00	324.00	\$ 1,478.68	\$ -	\$ 479,092.32		
09-HERR-043	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACERO CAL. 16, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	44.80	44.80	0.00	44.80	\$ 3,749.46	\$ -	\$ 167,975.81		
09-HERR-044	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJACERO, INCLUYE: POSTES DE 2.00 MTS DE ALTURA, PANEL REJACERO DE 2.00X2.00 MTS, ABRAZADERAS, KIT PLACA Y TAQUETES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	38.55	38.55	0.00	38.55	\$ 2,020.48	\$ -	\$ 77,889.50		
03-ALB175	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE CARDA Y ESMERIL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,286.00	1,286.00	0.00	1,286.00	\$ 92.96	\$ -	\$ 119,546.56		
03-ALB-176	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO COMEX 100 TOTAL EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TRIPLAY CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O POR ASPERSIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PROTECCIÓN DE ÁREA DE LOS TRABAJOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	752.32	752.32	0.00	752.32	\$ 137.82	\$ -	\$ 103,684.74		
							\$	\$	1,864,121.19		
SUMA HOJA No. 02							\$	\$	2,036,899.01		
 ARACELYS CORRALES ESTUPIÑÁN RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 MAYRA ALEJANDRA IBARRA LOPEZ BOTSUNAY S.A. DE C.V.					

FINIQUITO	HOJAS:	04 DE 12		OBRA:	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023		UBICACIÓN:	COLONIA LOPEZ MATEOS
	MONTO CONTRATADO:	\$ 3,853,586.83		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DOS-FAISMUN-23-URB-011		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023			

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
03-ALB-177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE 1/2" (HOJAS 4'X8'), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERIA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	216.00	216.00	0.00	216.00	\$ 464.46	\$ -	\$ 100,323.36
03-ALB-178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO SOLIDO TRASPARENTE DE 9.5 MM DE ESPESOR (HOJAS 1.20X2.44), INCLUYE: MATERIALES, TORNILLERIA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	63.00	63.00	0.00	63.00	\$ 4,154.06	\$ -	\$ 261,705.78
03-ALB-179	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED PERIMETRAL A BASE DE HILO NAYLON CAL. 18, TEÑIDO Y TRATADO PARA INTERPERIE CON PROTECCION U.V. Y TEJIDO TIPO ROMBO DE 4"X4" EN COLOR NEGRO PARA USO DEPORTIVO. INCLUYE: CORDON DE REFUERZO EN TODO EL PERIMETRO DE 6MM, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA E INSTALACION	M2	892.00	892.00	0.00	892.00	\$ 243.16	\$ -	\$ 216,898.72
03-ALB-180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PARA JUGADORES PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6MM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACION	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 84,472.80	\$ -	\$ 168,945.60
03-ALB-181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PARA ARBITROS PREFABRICADAS A BASE DE PTR Y POLICARBONATO DE 6MM, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS E INSTALACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 13,962.82	\$ -	\$ 13,962.82
03-ALB-182	PASTO SINTÉTICO DE POLIETILENO FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV DE 40 MM DE ALTURA Y 900 GRS X M2 CON GARANTÍA DE 9 AÑOS POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR. BASE REFORZADA RECUBIERTO DE LÁTEX APTO PARA INTERMEDIE LIENZOS DE 3.70 MT DE ANCHO, LIBRES METALES PESADOS, INCLUYE APLICACIÓN DE AGREGADOS DE ARENA SI LICA Y CAUCHO GRANULADO A PROPORCIÓN DE M2 DELINEADO OFICIAL CON PASTO BLANCO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	\$ 420.40	\$ -	\$ 504,480.00
LETR-01	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2"X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 18,842.33	\$ -	\$ 18,842.33

SUMA HOJA No. 02

\$	-	\$	1,285,158.61
\$	-	\$	3,322,057.61

ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Mayra Alejandra Ibarrera Lopez
BOTSUANAY S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	06 DE 12
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	3,853,586.83
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023



OBRA:	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN:	COLONIA LOPEZ MATEOS
MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-131	DEMOLICION DE PISO FIRME HECHO DE CONCRETO SIN RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DE MATERIALES.	1-2	A-B		0.85	0.98		26.00	23.31	23.31	M2
								TOTAL		23.31	M2
01-PRE-132	ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B		3.00	6.00	1.56		28.00	28.00	M3
								TOTAL		28.00	M3
02-CIM-027	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B		0.80	0.80	0.66	28.00	11.83	11.83	M3
								TOTAL		11.83	M3
02-CIM-028	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO	1-2	A-B		0.60	0.60		28.00	10.08	10.08	M2
								TOTAL		10.08	M2
02-CIM-029	ZAPATA AISLADA DE 0.60X0.60 MTS, PERALTE DE 0.20 CMS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO VARILLA DEL #3 (3/8") A CADA 0.15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=250KGS/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B					28.00	28.00	28.00	PZA
								TOTAL		28.00	PZA
02-CIM-030	COLUMNA DADO EN SECCION DE 0.30X0.30 CMS, A BASE DE CONCRETO F'C=250KGS/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2") 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4"), INCLUYE MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B					28.00	28.00	28.00	ML
								TOTAL		28.00	ML
02-CIM-031	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAJARINA.	1-2	A-B		0.80	0.80	11.64	1.00	7.45	7.45	M3
								TOTAL		7.45	M3

 ARQ. YEDICA CORONADO ESTUPIÑÁN RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 Mayra Alejandra Ibarra Lopez BOTSUANAY S.A. DE C.V.
---	---	--

FINIQUITO	HOJAS:	07 DE 12
	PERIODO:	28 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO:	\$ 3,853,586.83
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN
COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-ALB-172	CADENA DE DESPLANTE SECCION 0.15X0.20 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3" F Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2" @ 0.20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B		38.55				38.55	38.55	ML
									TOTAL	38.55	ML
03-ALB-173	REPOSICION DE CONCRETO F'C=250KGS/CM2 ACABADO COMUN. EN AREA DE BANCAS Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	1-2	A-B		15.54	1.50			23.31	23.31	M2
									TOTAL	23.31	M2
03-ALB-174	PISO FIRME PARA CANCHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KGS/CM2, CON BOMBEO DEL 1% (11 CMS) A PARTIR DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1-2	A-B		54.00	21.80	0.12		144.82	144.82	M2
									TOTAL	144.82	M2
09-HERR-039	ANCLA DE 1/2", A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.50 MTS. DE LARGO EN EL DADO DE CONCRETO.	1-2	A-B					112.00	112.00	112.00	PZA
									TOTAL	112.00	PZA
09-HERR-040	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.20X0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, SOLDADURA, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN.	1-2	A-B					28.00	28.00	28.00	PZA
									TOTAL	28.00	PZA
09-HERR-041	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR 3"X3" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LUADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B		252.00				252.00	252.00	ML
									TOTAL	252.00	ML
09-HERR-042	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE TRABESAÑOS A BASE DE PTR 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LUADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1-2	A-B		324.00				324.00	324.00	ML
									TOTAL	324.00	ML


 ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Mayra Alejandra Ibarra lo
 BOTSUANAY S.A. DE C.V.


 ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Mayra Alejandra Ibarra lo
 BOTSUANAY S.A. DE C.V.


 ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Mayra Alejandra Ibarra lo
 BOTSUANAY S.A. DE C.V.

FINIQUITO	HOJAS:	09 DE 12
	PERIODO:	26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
	MONTO CONTRATADO: \$	3,853,586.83
	No. DE CONTRATO:	MSO-005-FAISMUN-23-URB-011
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN
COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NÚMEROS GENERAD

[illegible]

ARQ. TESSICA CORONADO ESTUPIÑAN
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ARQ. JESSICA CORONADO ESTUPIÑÁN
 RESIDENTE DE OBRA


 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 MAYRA ALEJANDRA IBARRÉ LÓPEZ
 BOTSUANAY S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 10 DE 12

PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 3,853,586.83

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2023




OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS


MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

CROQUIS DE OBRA

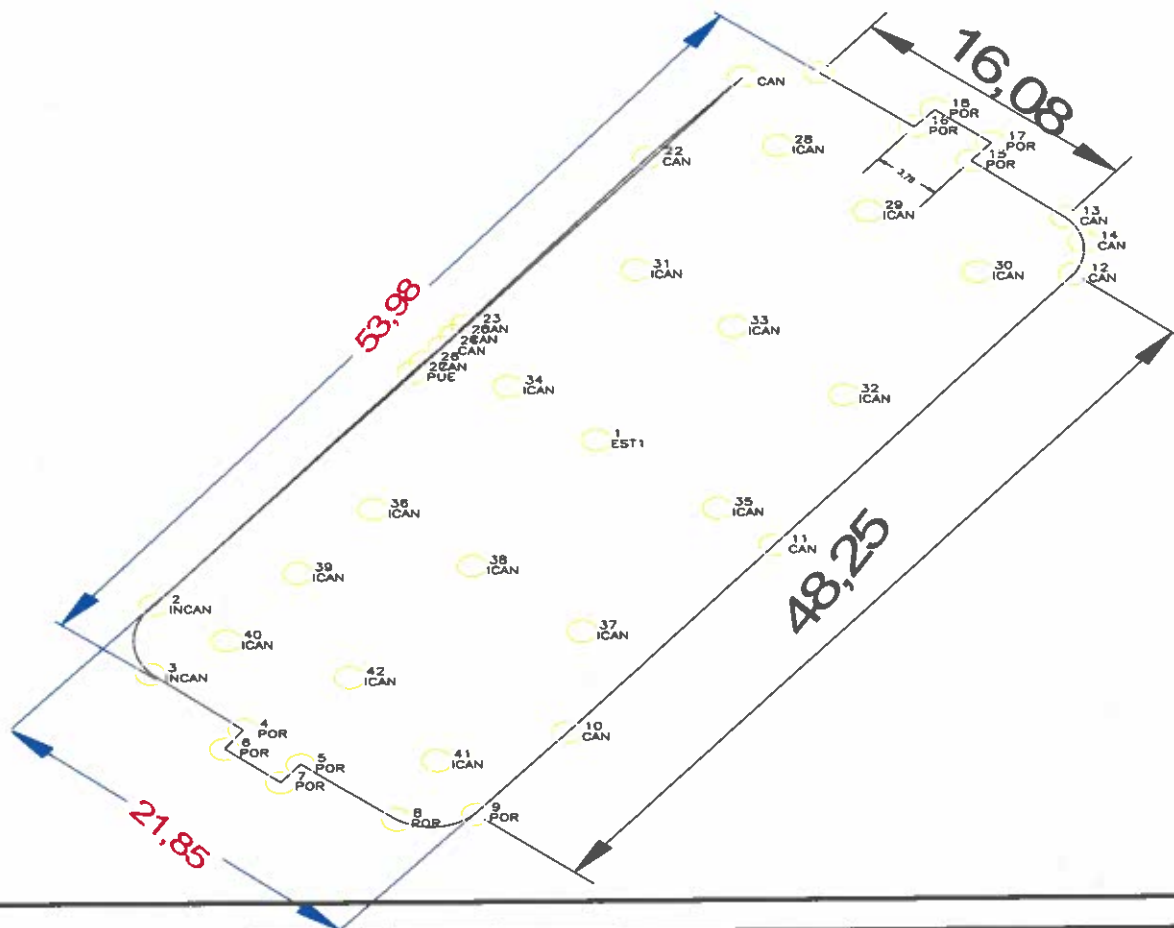


ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


MAYRA ALEJANDRA IBARRA LOPEZ
BOTSUANAY S.A. DE C.V.

FINIQUITO


HOJAS: 11 DE 12
PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 3,853,586.83
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011
FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2023



OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑÁN
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


MAYRA ALEJANDRA IZARRA LOPEZ
BOTSUANAY S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 12 DE 12

PERIODO: 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 3,853,586.83

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-011

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2023

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN
COLONIA LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN: COLONIA LOPEZ MATEOS

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. YESICA CORONADO ESTUPINAN
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

BOYSUANAY S.A. DE C.V.

Mayra Alexandra Ibarra Lopez
