

01 DE 12

PERIODO:

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL

2024

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

0.00 AMORT. A LA FECHA

0.00 POR AMORTIZAR

0.00 AMORT. EN ESTA ESTIMACION

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA:

FINIQUITO

16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS

0.00 AMORT. A LA FECHA

0.00 AMORT. EN ESTA ESTIN

0.00 POR AMORTIZAR

OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN

LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN:

PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO:

SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA:

0.00 ESTIMADO A LA FECHA:

0.00 ESTA ESTIMACIÓN:

0.00 SALDO POR EJERCER

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

CARA	TULA	DE EST	IMACIÓN

	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	O B S E R V A C I O N	E S
01	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.	= 1	LOTE	\$ 2,615,395 55	\$3,033,858.84		
						FINIQUITO	\$2,615,395
		тот	AL DE FIN	QUITO	\$3,033,858.84	IVA 16%	\$418,463.2
						SUBTOTAL	\$3,033,858
						AMORT, DE ANTICIPO	
						AMORT, DE ANTICIPO	
						TOTAL	
						TOTAL	

\$910,157.65 AMORT, A LA FECHA

\$0.00 AMORT, EN ESTA ESTIMACIC

POR AMORTIZAR

ANTICIPO AMORTIZADO A LA

SALDO POR AMORTIZAR

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA

FECHA:

ESTIMACION:

ARQ, BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINGS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

5

3,033,858.84

\$0.00

0.00

HOJAS: PERIODO:

MONTO CONTRATADO:

02 DE 12

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA:

FINIQUITO

16 DE JULIO DEL 2024

BUENOS RESULTADOS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN lA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE

SOMBRERETE.

UBICACIÓN:

PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SOCIAL INFRAESTRUCTURA

(FAISMUN) 2024

MUNICIPAL

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPO	RTE ACUMULADO
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	M2	1,051.00	1,051.00	0.00	1051.00	26.12	5	\$	27,452.12
01-PRE-OP-020	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO. ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO.	M2	753.00	753.00	0.00	753.00	156.72	s	s	118,010.16
01-PRE-027	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO.	M3	499.25	499.25	0.00	499.25	229.62	5	\$	114,637.79
01-PRE-013	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMÉTRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA. CARGA CON MAQUINA.	M3	704.03	704.03	0.00	704.03	149.83	s -	s	105,484.81
01-PRE-072	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.	мз/км	704.03	704.03	0.00	704.03	62.27	\$ -	\$	43,839.95
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE RETIRO Y ACARREO.	PZA	17.00	17.00	0.00	17.00	3,668.66	5 -	\$	62,367.22
01-PRE-007	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO . HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	МЗ	515.30	515.30	0.00	515.30	253.04	s .	\$	130,391.51
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	М3	357.65	357.65	0.00	357.65	330.25	\$	s	118,113.91
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mL DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	326.72	326.72	0.00	326.72	302.88	s .	\$	98,956.95
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	MZ	277.20	277.20	0.00	277.20	871.71	\$	s	241,638.01
04-FORE-OP-001	PLANTACIÓN Y SUMINISTRO DE ÁRBOL FLAMA CHINA O SIMILAR DE 4º INCLUYE TIERRA DE JARDÍN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	30,907.10	\$	\$	370,885.44
			SUMA HO	JA No. 01				\$.	\$	1,431,777.88

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS **DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

> Ċ,

FINIQUITO

PERIODO:

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

MONTO CONTRATADO:

3,033,858.84

03 DE 12

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE

SOMBRERETE.

UBICACIÓN:

PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO: PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA SOCIAL

MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA (FAISMUN) 2024

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRE	cio	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPO	RTE ACUMULADO
03-ALB-155	LIMPIEZA DIARIA EN OBRA ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.	M3/KM	1,051.00	1,051.00	0.00	1051.00	\$	33.59	\$	\$	35,303.09
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00ml. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	МЗ	293.00	293.00	0.00	293.00	\$	302.88	s -	\$	88,743.84
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR,CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	M2	93.00	93.00	0.00	93.00	\$	871.71	\$	\$	81,069.03
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	978.08	978.08	0.00	978.08	\$	269.64	\$	\$	263,729.49
03-PAVI-018	PISO FIRME DE CONCRETO PULIDO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.12 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE: CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA, PINTURA PARA AREA DE CANCHA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	567.00	567.00	0.00	567.00	s	677.01	\$	s	383,864.67
11-O-EXT-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FABRICACIÓN DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 14 PUNZONADA Y ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO 2/2 CAL 18 INCLUYE PROCESO DE SANDBLAST Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA INTEMPERIE. OPCIÓN DE ANCLAJE PARA ATORNILLAR, AHOGAR EN CONCRETO O MOVIBLE MEDIDAS L:150 CM AL:94 CM Y AN: 50 CM CAPACIDAD PARA TRES PERSONAS	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	S 15	5,145.20		\$	242,324.48
05-ACA-050	PINTURA EN CANCHA CON MEDIDADAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4	4,151.60		\$	4,151.60
19-E-ACERO 030	D ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2 " X 2 " . CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 24	4,633.20		s	49,266.68
9-E-ACERO-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8". PLACA ACERO DE 3/6" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	5 17	7,582.30		s	35,164.79
			SUMA HO	JA No. 01					\$	\$	1,183,617.67
			SUMA HOJA	No. 01 Y 02					\$.	5	2,615,395.55

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

04 DE 12

PERIODO:

FECHA:

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIÓ DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO	LOCALIZACION			LARCA	ANGUA	AL TO	N- DIEZAG	VOLUMEN	EJECUTADO	UNIDAE	
CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	ADINO
01-PRE-001	RE-001 TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.	1-2	A-B		30.00	35.03			1,051.00	1,051.00	M2
							TOTAL		1,0	051.00	M2
01-PRE-OP-020	P-020 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 M DE ALTURA, INCLUYE MANO DE OBRA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO.	1-2	A-B		34.50	21.83			753.00	753.00	M2
						1	TOTAL		7	53.00	M2
01-PRE-027	D1-PRE-027 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA MARTILLO), HASTA 3.5 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO	1-2	A-B		96.00	3.15	1.65		499.25	499.25	МЗ
							TOTAL		4	99.25	M3
01-PRE-013	1-PRE-013 ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATÉRIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA CARGA CON MAGLINA	1-2	A-B		16.00	18.00	2.44		704.03	704.03	МЗ
							TOTAL		7	04.03	МЗ
01-PRE-072	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B. KILOMETROS SUBSECUENTES SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA	1-2	A-B		16.00	18.00	2.44		704.03	704.03	M3/KM
	NEDWELLINGS SEEDELINES, SOUTH DIRTHING DE TENTOUENE						TOTAL		7	04.03	M3/KM
01-PRE-026	RETIRO DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE, RETIRO Y ACARREO.	1-2	A-B					17.00	17.00	17.00	PZA
							TOTAL		1	17.00	PZA
01-PRE-007	01-PRE-007 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I ZONA C A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE Q A -2.00 MTS. NO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1-2	A-B		23 00	35.00	0.64		515.30	515.30	МЗ
							TOTAL		5	15.30	M3
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		23.00	35.00	0.44		357 65	357.65	МЗ

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMANOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

PERIODO:

05 DE 12 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSQ-DDS-FAISMUN-24-URB-004

16 DE JULIO DEL 2024 FECHA:



BUENOS RESULTADOS

OBRA:

DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE

SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

CLAVE	CONCEPTO	L	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	CHO ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDA		
CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHU	ALIU	NO. PIEZAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDA		
01-PRE-073 EXCAVACION EN TERRENO TIPO "8" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt. DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	1-2	A-B		207.00	0.80	1.97		326.72	326.72	M3			
							TOTAL		3	26.72	M3		
03-ALB-063	03-ALB-063 MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8° @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B		207.00	1.34			277.20	277 20	MM2		
							TOTAL		2	77.20	M2		
4-FORE-OP-001	-FORE-OP-001 PLANTACIÓN Y SUMINISTRO DE ÁRBOL FLAMA CHINA O SIMILAR DE 4º: INCLUYE: TIERRA DE JARDÍN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1-2	A-B					12.00	12:00	12.00	PZA		
							TOTAL			12.00	PZA		
03-ALB-155	LIMPIEZA DIARIA EN OBRA ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.		1-2	1-2	A-8		33.00	31.85			1,051,00	1,051.00	M2
							TOTAL		1,	051.00	M2		
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00mt. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1-2	A-B		19.00	28.00	0.55		293.00	293 00	M3		
							TOTAL		2	193.00	МЗ		
03-ALB-063	MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8° @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	1-2	A-B		86.00	1.08			93.00	93.00	M2		
							TOTAL			93.00	M2		

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS CAMMOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS:

PERIODO:

FECHA:

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$ No. DE CONTRATO:

3,033,858.84

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

16 DE JULIO DEL 2024



DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE

SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO		LOCALIZACIÓN			LARGO ANCHO ALTO				VOLÚMEN	UNIDA	
CLAVE CONCEPTO		EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	UNID
1-PRE-OP-008 RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		30.00	35.00	0.93		978.08	978.06	M3	
							TOTAL		97	78.08	M
03-PAVI-018 PISO FIRME DE CONCRETO PULIDO FC=200 KG/CM2 AGRI MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68-10 100 MTS, INLCUYE CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, P	0.12 MTS DE	1-2	A-B		18.00	31.50			567.00	567.00	Ma
AREA DE CANCHA, HERRAMIENTA MENOR	INTOICK FACA						TOTAL		56	57.00	M
11-O-EXT-032		1-2	A-B					16.00	16.00	16.00	P2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA FABRICACIÓN DI ACERO AL CARBÓN CAL 14 PUNZONADA Y ESTRUCTURA I ACERO 2/2 CAL 16 INCLUYE PROCESO DE SANDBLAST Y TI PINTURA ÉLECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA INTEMPERIE ANCLAJE PARA ATORNILLAR, AHOGAR EN CONCRETO MEDIDAS L/150 CM AL.94 CM Y AN: 50 CM CAPACIDAD PERSONAS	DE PERFIL DE ERMINADO EN E. OPCIÓN DE O MOVIBLE										
							TOTAL		1	6.00	PZ
05-ACA-050 PINTURA EN CANCHA CON MEDIDADAS OFICIALES DE BA VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COI INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SI EJECUCION.	LOR BLANCO, DE OBRA	1-2	A-B					1.00	1.00	1.00	PZ
							TOTAL			.00	P2
-E-ACERO-030 ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2 " X 2 " CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.	AL TRABAJOS	1-2	A-B					2.00	2.00	2.00	PZ
							TOTAL		2	2.00	PZ
9-E-ACERO-031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50° DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE, RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	1-2	A-B					2.00	2 00	2.00	PZ	
	ONECESARIO										

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

07 DE 12

MONTO CONTRATADO: \$

PERIODO: 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

No. DE CONTRATO:

FINIQUITO

3,033,858.84

NTRATO:

MSO-DOS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA:

16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FAISMUN 2024

CROQUIS DE OBRA



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINOS PL GIRASOL S.A. DE C.V.

08 DE 12

PERIODO: 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA:

BUENOS RESULTADOS

OBRA:


CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

16 DE JULIO DEL 2024 CROQUIS DE OBRA

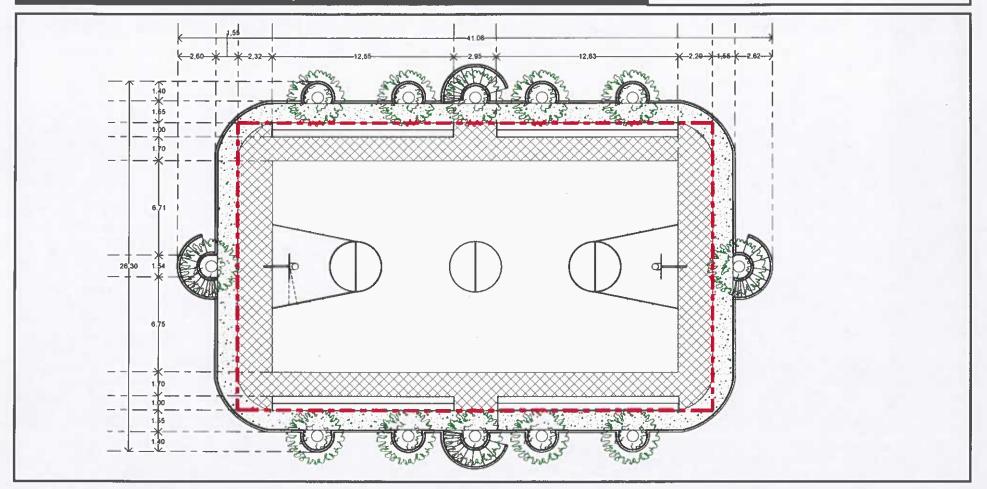

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

PERIODO:

20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

FINIQUITO

MONTO CONTRATADO:

No. DE CONTRATO:

3,033,858.84

09 DE 12

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

16 DE JULIO DEL 2024 FECHA:



BUENOS RESULTADOS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN:

PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO:

PROGRAMA:

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA















ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

OBRAS Y CAMBIOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

10 D E12

PERIODO: 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMA: SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA






















RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS YCAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

11 DE 12

PERIODO: 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2024



BUENOS RESULTADOS


CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMA: SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

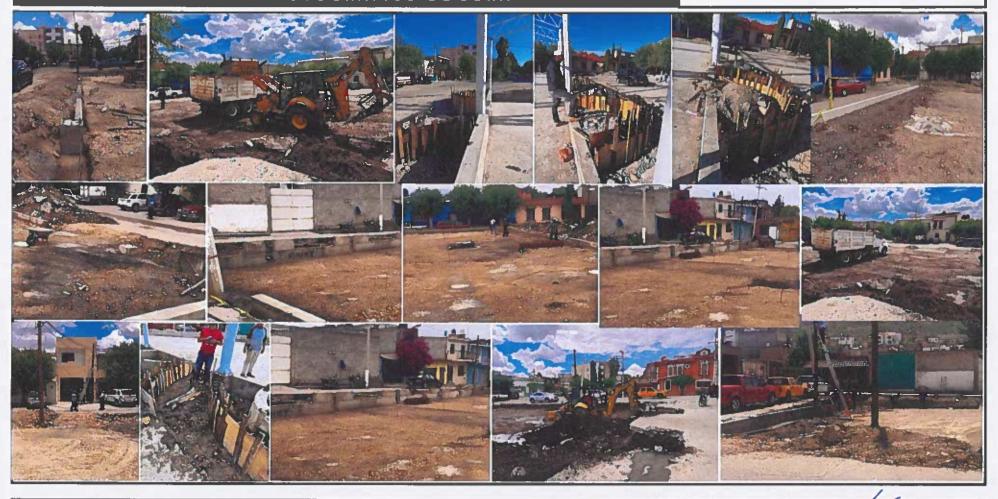

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ **RESIDENTE DE OBRA**

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.

12 DE 12

PERIODO: 20 DE MAYO DEL 2024 AL 16 DE JULIO DEL 2024

FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: \$

3,033,858.84

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-004

FECHA:

16 DE JULIO DEL 2024



CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN IA PLAZUELA DONCELES EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS **DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

OBRAS Y CAMAMOS EL GIRASOL S.A. DE C.V.
