

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
UBICACIÓN:	PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPA.	1	LOTE	\$ 2,293,437.58	\$2,660,387.60	
		TOTAL DE FINIQUITO				\$2,660,387.60
						FINIQUITO \$2,293,437.59
						IVA 16% \$366,950.01
						SUBTOTAL \$2,660,387.60
						AMORT. DE ANTICIPO
						TOTAL
						SUBTOTAL
						IVA 16%
						TOTAL
ANTICIPO OTORGADO:	\$798,116.28					RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$798,116.28	AMORT. A LA FECHA	0.00	AMORT. A LA FECHA	0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$ 2,660,387.60
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	SALDO POR EJERCER \$ -

Estefanía Avalos Gómez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

Anti-3D

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 12		OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
	PERIODO:	01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024		UBICACIÓN:	PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE
	MONTO CONTRATADO:	\$ 2,660,387.60		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006		PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024
FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2024	DESGLOSE DE ESTIMACIÓN			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
01-PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1.130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL	M2	737.00	737.00	0.00	737.00	18.96	\$ -	\$ 13,973.52
04-ELECT-268	REUBICACIÓN DE POSTE EXISTENTE DE TEMEX INCLUYE: MANIOBRAS, TRABAJOS MENORES, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	23,291.40	\$ -	\$ 23,291.40
01-PRE-OP-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P P S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	276.50	276.50	0.00	276.50	415.20	\$ -	\$ 114,802.80
03-PAVI-018	PISO FIRME DE CONCRETO PULIDO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 0.12 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA, PINTURA PARA AREA DE CANCHA, HERRAMIENTA MENOR.	M2	153.00	153.00	0.00	153.00	794.48	\$ -	\$ 121,555.44
03-ALB-182	PASTO SINTÉTICO ROJO DE POLIETILENO FIBRILADO(FB/200)DE 20 MM DE ALTURA Y UN ESPESOR DE 1020 GRS/M2 ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV, CON GARANTÍA DE 8 AÑOS POR EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR, BASE REFORZADA DURBAC PRO, RECUBRIMIENTO EN LATEX SBR APTO PARA INTEMPERIE LIENZOS DE 1.83 MTS DE ANCHO, CERTIFICACIÓN ISO Y SO 9001 2008/ISO 14001	M2	153.00	153.00	0.00	153.00	1,086.55	\$ -	\$ 166,242.15
01-PRE-073	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00ml DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M3	184.00	184.00	0.00	184.00	375.76	\$ -	\$ 69,139.84
02-CIM-005	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO,	M2	56.00	56.00	0.00	56.00	233.57	\$ -	\$ 13,079.92
02-CIM-020	ZAPATA DE 2.00 X 2.00 MTS DE 0.35 MTS DE ESPESOR CON VARILLAS DEL #5@ 0.15 MTS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL #5 @ 0.15 MTS EN EL LADO CORTO Y UNA PARRILLA SUPERIOR CON VARILLA DEL #3 @ 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, INCLUYE CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	7,044.40	\$ -	\$ 98,621.60
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.50 X 0.50 ARMADO CON 6 VARILLAS # 4 DE DIÁMETRO Y 1 ESTRIBO DEL # 2, SEPARADO @ 0.15 MTS, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	14.00	14.00	0.00	14.00	6,776.64	\$ -	\$ 94,872.96

SUMA HOJA No. 01

\$ - \$ 715,579.63

ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Estefania Ayala Gámez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

000131

FINIQUITO

HOJAS: 03 DE 12

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$ 2,660,387.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2024



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	M3	58.00	58.00	0.00	58.00	\$ 415.20	\$ -	\$ 24,081.60
19-E-ACERO-001	ANCLA DE ACERO DE ¾" A BASE DE REDONDO LISO CON CUERDA DE 0.10 MTS EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL SOLDADAS A PLACAS DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS DE LARGO DE LA COLUMNAS DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES Y SOLDADURA	PZA	112.00	112.00	0.00	112.00	\$ 923.88	\$ -	\$ 103,474.56
19-E-ACERO-002	PLACA DE ACERO DE ¾ DE 0.25X0.20 MTS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES Y SOLDADURA.	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	\$ 4,890.04	\$ -	\$ 136,921.12
19-3-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 10" CEDULA 40 (60.33 KG/M) INCLUYE: TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO, CORTES, LIJADO	KG	3,570.00	3,570.00	0.00	3570.00	\$ 84.39	\$ -	\$ 301,272.30
19-E-ACERO-042	ARMADURA LIGERA DE ESTRUCTURA DE PTR 2 1/2 X 2 1/2 METÁLICA INCLUYE FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTADORA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ACABADO EN PINTURA ESMALTE MATERIALES, MONTAJE, Y HERRAMIENTA.	KG	4,030.26	4,030.26	0.00	4030.26	\$ 84.39	\$ -	\$ 340,113.64
19-E-ACERO-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA	M2	737.00	737.00	0.00	737.00	\$ 272.69	\$ -	\$ 200,972.53
19-E-ACERO-006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	KG	3,206.24	3,206.24	0.00	3206.24	\$ 91.86	\$ -	\$ 294,525.21
04-ELECT-553	UMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 2,123.55	\$ -	\$ 25,482.60
04-ELECT-554	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR, INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,969.39	\$ -	\$ 3,969.39
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 1,430,812.95
SUMA HOJA No. 01 Y 02								\$ -	\$ 2,146,392.58



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

FINIQUITO

HOJAS: 04 DE 12

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$ 2,660,387.60

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2024



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPA.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
04-ELECT-616	SALIDA PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM CABLE THW CAL 12 CON TRES CAJAS CONDUIT T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM INCLUYE CONECTORES, COPLAS, ABRAZADERAS DE UÑA, APAGADOR Y CAJA DE ½.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 1,372.06	\$ -	\$ 16,464.72
19-E-ACERO-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL 14. INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1". INCLUYE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"X1/4". MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	67.00	67.00	0.00	67.00	\$ 255.26	\$ -	\$ 17,102.42
19-E-ACERO-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	KG	384.75	384.75	0.00	384.75	\$ 91.74	\$ -	\$ 35,296.97
19-E-ACERO-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE	KG	359.10	359.10	0.00	359.10	\$ 91.74	\$ -	\$ 32,943.83
03-ALB-155	LIMPIEZA DIARIA EN OBRA ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, KIÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA.	M2	737.00	737.00	0.00	737.00	\$ 61.38	\$ -	\$ 45,237.06
SUMA HOJA No. 01								\$ -	\$ 147,045.00
SUMA HOJA No. 01, 02 Y 03								\$ -	\$ 2,293,437.58



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



Edelfonso Ayala Gómez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

000122

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

Esteban Ayala Gomez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

FINIQUITO	HOJAS:	06 DE 12		OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	
	PERIODO:	01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024		UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRETERE	
	MONTO CONTRATADO: \$	2,660,387.60		MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006		PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2024			
NÚMEROS GENERADOS					

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
03-ALB-137	DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.50 X 0.50 ARMADO CON 6 VARILLAS # 4 DE DIÁMETRO Y 1 ESTRIBO DEL # 2, SEPARADO @ 0.15 MTS, INCLUYE TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B		1.00			14.00	14.00	14.00	ML
								TOTAL	14.00		ML
02-CIM-008	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA	1-2	A-B		2.00	2.00	1.04	14.00	58.00	58.00	M3
								TOTAL	58.00		M3
19-E-ACERO-001	ANCLA DE ACERO DE 1/2" A BASE DE REDONDO LISO CON CUERDA DE 0.10 MTS EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL SOLDADAS A PLACAS DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTS DE LARGO DE LA COLUMNAS DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. TRAZO, CORTES Y SOLDADURA	1-2	A-B					112.00	112.00	112.00	PZA
								TOTAL	112.00		PZA
19-E-ACERO-002	PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. TRAZO, CORTES Y SOLDADURA.	1-2	A-B					28.00	28.00	28.00	PZA
								TOTAL	28.00		PZA
19-3-ACERO-004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 10" CEDULA 40 (60.33 KGM) INCLUYE TRABAJOS DE TALLER, FLETE A TALLER DE OBRA, ELEVACIONES, SOLDADURA, REBABEO CORTES LUADO.	1-2	A-B					3570.00	3,570.00	3,570.00	KG
								TOTAL	3,570.00		KG
19-E-ACERO-042	ARMADURA LIGERA DE ESTRUCTURA DE PTR 2 1/2 X 2 1/2 METÁLICA INCLUYE FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTADORA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ACABADO EN PINTURA ESMALTE MATERIALES, MONTAJE, Y HERRAMIENTA.	1-2	A-B					4030.26	4,030.26	4,030.26	KG
								TOTAL	4,030.26		KG

 ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV
--	---	---

000125





SOMBRERETE
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
BUENOS RESULTADOS

Eskefania Ayala Gámez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

FINIQUITO	HOJAS:	09 DE 12	 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS	OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
	PERIODO:	01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024		UBICACIÓN:	PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE
	MONTO CONTRATADO: \$	2,660,387.60		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006		PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024
	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2024			

CROQUIS DE OBRA

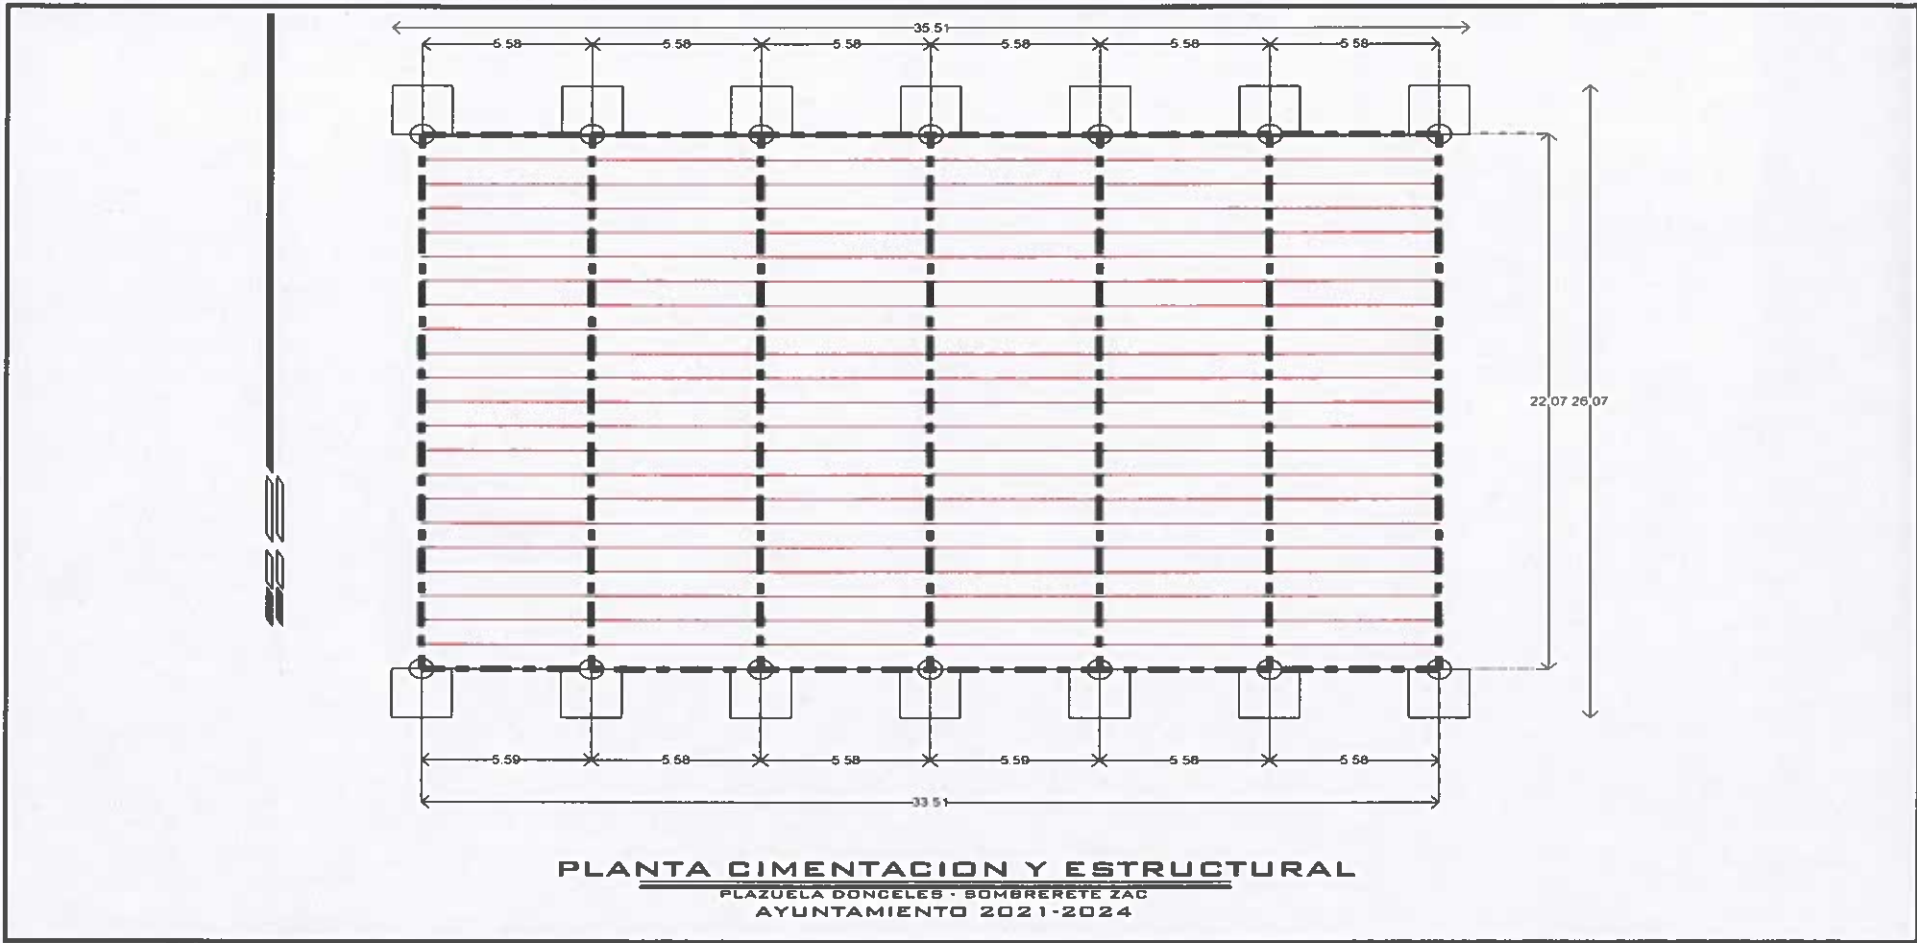

 ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 Edetania Hualar Gomez DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV
--	---	--

000138

FINIQUITO

HOJAS: 10 DE 12
PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024
MONTO CONTRATADO: \$ 2,660,387.60
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006
FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2024



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRETERE
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Esteliana Avalos Gamero
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

000137

FINIQUITO

HOJAS:

11 DE 12

PERIODO:

01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$

2,660,387.60

Nº. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006

FECHA:

06 DE AGOSTO DEL 2024

SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

BUENOS RESULTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRERETE

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Estefania Avila Gómez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

00014

FINIQUITO

HOJAS:

12 DE 12

PERIODO:

01 DE JULIO DEL 2024 AL 06 DE AGOSTO DEL 2024

MONTO CONTRATADO: \$

2,660,387.60

No. DE CONTRATO:

MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-006

FECHA:

06 DE AGOSTO DEL 2024



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

UBICACIÓN: PLAZUELA DONCELES, SOMBRETERE

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ARQ. BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Estefania Avalos Gámez
DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV

000121
