



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**N° de oficio:** DOP-020/2026

**Asunto:** Informe de actividades

Sombrerete, Zacatecas, 13 de ENERO del 2026

**TEC. HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO**  
**JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarla y desearle éxito en sus actividades diarias, y así mismo hacerle entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **NOVIEMBRE del 2025** en el Departamento de Obras públicas.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



**OBRAS PÚBLICAS**  
**SOMBRERETE**  
**ING. JAVIER ESTRADA HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

C.C.P.A.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA

FECHA:

lunes, 3 de noviembre de 2025

CUADRILLA HECTOR, JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se sondeo línea y quedó funcionando, solo falta abrir con retro.
2. Se liberó línea que se encontraba tapada por exceso de raíces y ropa interior en tubería de drenaje.
3. Se continua con la excavación de zanja con las personas de drenajes de obras públicas.
4. Se apoyó a persona de la tercera edad para revisión y liberación de su línea de drenaje.

#### UBICACIÓN

1. Cerrito de Guadalupe
2. Calle Joel Ochoa
3. Privada Donceles
4. Privada Donceles por arroyo

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

martes, 4 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizan sondeos localizando toma particular que se encuentra pasada hacia la línea general lo que provocaba los taponamientos, fue necesario cortar tubo para luego reinstalar y se deja trabajando la línea.
2. Se atiende reporte de línea tapada, las varillas no se logran introducir, para lo cual se hacen sondeos, pero no se localiza el tubo, queda pendiente.
3. Se atiende reporte en Hotel Fundación 1555, el problema fue tubo tapado dentro del hotel, se libera y queda trabajando.

#### UBICACIÓN

1. Cerrito de Guadalupe
2. Huertas Grandes
3. Hotel Fundación 1555

#### REPORTE FOTOGRAFICO





# BITACORA MUNICIPAL

## DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO GOMEZ	FECHA:	miércoles, 5 de noviembre de 2025
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la Comunidad de González Ortega para atender reporte de drenaje tapado, lo que estaba provocando escurrimiento de aguas negras a un costado del Bachillerato, siendo este un foco de infección para los alumnos que transitan por ahí. Se limpiaron 4 registros, cabe mencionar que en esta línea se encuentra con poca pendiente y se encuentra sedimentada.</p> <p>2. Se liberó línea de drenaje de 4" y queda trabajando, se encontro registro cuadrado lleno de raices.</p>		<p>1. Col. González Ortega a un costado del Bachillerato</p> <p>2. Calle Azucena Huertas Grandes</p>	

### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR: JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA

LUGAR:

SOMBRERETE

FECHA:

6 de noviembre de 2025

CUADRILLA: HECTOR, JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO FAVELA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se brinda sugerencia para llevar a cabo recorrido de tubería para que de esta forma fluya mas el agua.  
Se lleva acabo la liberación de línea de 4" debido a esto, la tubería queda trabajando, sin embargo cuenta con muchas raíces.  
Mediante una solicitud por parte de los habitantes de la loma colorada se corrige fuga en línea de 8" la cual estaba dañada debido al trafico por que esta muy encima, para dar solución se realiza encasquillado de tubo y se encofra con cemento.

#### UBICACIÓN

1. Privada del cobre
2. Avenida Aréchiga
3. Loma Colorada

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR: JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA

LUGAR:

SOMBRERETE

FECHA:

7 de noviembre de 2025

CUADRILLA

HECTOR, JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO FAVELA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Atendiendo solicitud por parte de los ciudadanos de la colonia Loma Colorada ,se realiza revisión y 3 reparaciones en diferentes calles de la colonia brindando solucion a la problemática.

Se lleva acabo la liberación de tapon que es causado por raices las cuales estan obstruyendo la tuberia queda solucionada, mas sin embargo se necesita cambio de tuberia.

#### UBICACIÓN

1. Colonia Loma Colorada

2. Calle Himno Nacional

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

lunes, 10 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se liberó temporalmente línea oriente del peñasco que tenía brote por casas de Calle Joel Ochoa, ahí se ocupa realizar sondeo con retroexcavadora para buscar tubo lleno de raíces.
2. Se comenzó a realizar sondeo de tubería que se encontraba muy dañada, se ocupan 4 tramos de tubos de 8" para llevar a cabo la rehabilitación, así como la retro para abrir zanja.
3. Se continua trabajando para liberar tubería llena de basura, se desagua y localiza tubo de 4".

#### UBICACIÓN

1. Calle Joel Ochoa Barrio el Peñasco
2. Sombreretillo, costado del Salon Ejidal.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

martes, 11 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se revisa línea de drenaje de la Escuela, lo cual se detecta que todo está en funcionamiento, el agua que se encuentra tirada es derivado del regado que se realiza en las áreas verdes.
2. Se localizó un registro el cual no se subió y quedo bajo concreto que se realizó en la Calle, se ocupan 5 coples, 1 tapón, pegamento, 1 segueta 2 metros de tubo de 4" para poder realizar la reparación de esa área.
3. Se checo línea la cual se encontraba obstruida por un tapón frente al registro que está en la rejilla pluvial, se limpia registro y queda trabajando línea.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60.
2. Privada Donceles
3. Calle Mina frente a Panaderia.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

martes, 11 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

4. Se destapó línea de drenaje de baños de oficinas directivas de la institución, la línea se encontraba obstruida por raíces la cual estaban provocando el taponamiento y al mismo tiempo que estas se comenzaran a meter a la tubería.

**UBICACIÓN**

4. Cobach

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 12 de noviembre de 2025
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se trabaja localizando taponamiento, el cual es provocado por raíces, se libera lo más que se pueda de raíces que se encuentran dentro del tubo de 8", se encasquilla tubo y se rellena zanja con tierra de banco.		1. Calle Los Angeles frente a CONAFE.	

**REPORTE FOTOGRAFICO**

1





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

jueves, 13 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acudió a la comunidad de Estación Frio para revisar línea de drenaje, ya que se encontraba derramando aguas negras sobre el camino fue necesario realizar la limpieza de 3 registros, se liberó agua y queda fluyendo, esta línea se encuentra muy vertical con poca pendiente y ensolvada.
2. Se acudió a la Comunidad del Arenal en donde se realizó la limpieza de 3 registros, no se logra liberar ya que la línea se encuentra muy ensolvada.

#### UBICACIÓN

1. Estación Frio
2. El Arenal

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



# BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 14 de noviembre de 2025
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se revisó línea de drenaje general de Av. Hidalgo detectando que la falla es al interior de un domicilio en casa de los Valles. 2. Se comenzó a encofrar tubo de 8" el cual se encuentra en el interperie y corre el riesgo de dañarse por las inclemencias del tiempo o bien que sea aplastado y quebrado por los vehiculos que transitan. 3. Se trabajó en la escuela Primaria de la Comunidad liberando taponamiento de baños que era provocado por raíces y queda trabajando la línea.		1. Avenida Hidalgo  2. Calle el Venado.  3. San Jose de Félix	

## REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

martes, 18 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se trabajó tratando de liberar la línea principal de drenaje de la Colonia la Perla, ya que se encuentran escurrimientos de aguas negras y acumulamiento de desechos lo que provoca malos olores y fuente de infección para quienes viven y transitan por ese lado. Fue necesario realizar bombeo y se metieron las varillas en varias ocasiones, pero no se logró que el agua corriera.

#### UBICACIÓN

1. Colonia la Perla

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

miércoles, 19 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se amaciza tubo de 8" que corre sobre la pared, el cual se le da nivelación para que fluya el agua.

2. Se trata de liberar línea de drenaje que se encuentra aplastado derivado de que es un camino muy transitado y se llevó a cabo el sondeo.

#### UBICACIÓN

1. Tras casa de cultura

2. Frente a hotel San Roman

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

jueves, 20 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se libera línea de drenaje de casa que se encontraba sin habitar por mucho tiempo el cual se encontraba la línea y registros tapada por mucha basura acumulada, la línea se quedó trabajando.
2. Se libera línea que se tapa porque algunos coches que transitan por ese camino tumbaron la tapa de registro y se comienza a dañar, es necesario colocar una tapa nueva.
3. Se liberaron líneas y se acoplaron tubos de drenaje y pluvial queda trabajando la línea, cabe mencionar que el daño de tubería es derivado del tráfico que pasa por esa área.

#### UBICACIÓN

1. Calle Francisco Arce Col. El Coronel

2. Salida a Chalchihuites

3. Carretera Panamericana

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

viernes, 21 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se instaló tubo de 8" que cruza de arroyo de presa San Salvador, se realizó el encofrado de tubería con cemento.
2. Se libera la línea el cual estaba se encontraba tapada por acumulación de toallitas húmedas.
3. Se reparó tubo que se encontraba quebrado el cual se encuentra muy superficial, se le colocó 1 mts de tubo de 8" y cemento.

#### UBICACIÓN

1. Puente de los Ramírez
2. Frente a casa de Cultura Aurorita Cordero
3. Calle Los Verdes Rumbo a las Escobillas.

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO GOMEZ**FECHA:**

lunes, 24 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se liberó frente a hotel Santo Domingo en Calle del Jardín Zaragoza, en Calle Colon donde se trabaja destapada línea de drenaje 30 mts aproximadamente por el registro del jardín y no se logra liberar, en calle Colon 20 mts y tampoco se libera, cabe mencionar que el taponamiento se encuentra frente a carnicería.

**UBICACIÓN**

Hotel Santo Domingo

**REPORTE FOTOGRAFICO**

1



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

martes, 25 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se checó línea general que va por arroyo y se libera en esa área los registros no tienen brocal ni tapas 3".
2. Se libera línea la cual se bloquea por raíces, cabe mencionar que es necesario realizar el cambio de tubería.
3. Se libera línea general, la obstrucción de dicha línea es derivado de la acumulación de fibras y raíces que se quedan prensadas en tubería.
4. Se checa línea y se encuentra trabajando bien, los desechos que se encontraron en la calle es derivado de una fuga en manguera de agua , se repara con cámara de 2 fugas ya que las mangueras están muy encima del camino.

#### UBICACIÓN

1. Tras del Cbtis #104
2. Calle Himno Nacional
3. COBACH La Blanca
4. Calle Papanton "El Rancherito"

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1





**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO GOMEZ

**FECHA:**

miércoles, 26 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continua con encofrado en puente de los Ramírez.  
Encofrado de tubo a base de piedra y concreto con  
250kg/Cm° .

**UBICACIÓN**

Puente de los Ramírez

**REPORTE FOTOGRAFICO**

1



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO GOMEZ

FECHA:

jueves, 27 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con el encofrando de tubería del puente.
2. Se liberó linea general la cual se encontraba tapada por un garrafón de 10 lts dentro de la línea.
3. Loma colorada están saliendo muchas estopas y rebabas de metal un taller de los Cuevas

#### UBICACIÓN

1. Puente de los Ramírez
2. Comunidad de Villa Insurgentes
3. Calle Benito Juarez Loma colorada

#### REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3





**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO GOMEZ

**FECHA:**

**viernes, 28 de noviembre de 2025**

**CUADRILLA** JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, JUAN Y PABLO.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se liberó línea que se encontraba tapada por acumulación de raíces, la línea queda funcionando correctamente.
2. Se acudio a la Comunidad de Gonzalez Ortega para atender solicitud realizada por eldelegado de dicha comunidad, en donde se trabajó en 2 puntos para poder liberar la línea, el registro se encuentra muy retirado, para lo cual se ocupa realizar sondeos.

**UBICACIÓN**

**EST # 8**

**2. Colonia Gonzalez Ortega**

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**1**



**2**



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

lunes, 3 de noviembre de 2025

CUADRILLA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se retiran los vidrios de la sala de juntas el campo deportivo Olvera.
2. Se realiza mantenimiento en baños de obras públicas se destapan mangueras.

#### UBICACIÓN

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 4 de noviembre de 2025

CUADRILLA MIGUEL, NAZARIO, MANUEL

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza demolición de brocal de concreto con rotomartillo y se cambia por otro brocal de concreto, se instala con concreto.

#### UBICACIÓN

Col. López Mateos

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 5 de noviembre de 2025

CUADRILLA SAMUEL, JOSE, OSCAR Y JUAN.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza la compactación con compactadora del material de banco colocado, queda compactado el material de banco colocado.
2. Se realiza la afiliación y compactación del relleno producto de la excavación, se humedece y se coloca grava para compactar

#### UBICACIÓN

1. Calle alameda
2. Calle Adolfo López Mateos

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 6 de noviembre de 2025

CUADRILLA SAMUEL, JOSE Y JUAN ANDRADE

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizó mantenimiento sobre la calle Allende, donde se abre una parte una parte hundida con rotomartillo y se tapa con concreto un área de 2.70\*1.60.

#### UBICACIÓN

1. Col. Centro Calle Allende

#### REPORTE FOTOGRAFICO



**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

viernes, 7 de noviembre de 2025

**CUADRILLA****ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se realizó la instalación de 13 bollas en calle allende, se colocan con ayuda de taladro. De la Calle Gustavo Diaz Ordaz se retiraron 13 bollas.

**UBICACIÓN**

1. Calle Allende atrás del sindicato de minero

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

lunes, 10 de noviembre de 2025

**CUADRILLA****ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continúa con la instalación de bollas, se colocan 13 bollas más y se finaliza tope.

Se continúa en la calle Zacatecas del barrio la pila una bolla retirada.

Calle Zacatecas barrio la pila

Se instalan 2 bollas y se ajustan otras bollas sueltas

**UBICACIÓN**

1. calle Allende

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!  
OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

martes, 11 de noviembre de 2025

**CUADRILLA****ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se atiende solicitud realizada por el sindicato de Sombrerete SUBSEMOP, donde se iniciaron trabajos de rehabilitación de pintura, solo se alcanzó a pintar la mitad del salón y se sellaron grietas.

**UBICACIÓN**

Salon SUBSEMOP

**REPORTE FOTOGRAFICO**



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 12 de noviembre de 2025

CUADRILLA SAMUEL, JULIO Y JAVIER.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la rehabilitación de pintura en el salón del SUBSEMOP, donde se termina de pintar las paredes y se continua con la colocación de pintura de aceite en puertas y líneas.

#### UBICACIÓN

1. SUBSEMOP

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



## SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

### ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 13 de noviembre de 2025

CUADRILLA ROBERTO, JOSE, MARTIN Y JUAN

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con el colado de piso en la E.S.T #60, donde se  
cuela una área de:

$6.25 * 7.86 \text{ m} = 49.12 \text{ m}^2$

Se terminó de colar todo el firme con una área total de:

$9.52 * 7.81 \text{ m} = 74.35 \text{ m}^2$

#### UBICACIÓN

López Mateos

#### REPORTE FOTOGRAFICO





**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO

**FECHA:**

**viernes, 14 de noviembre de 2025**

**CUADRILLA**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se inician trabajos de construcción de aula de clases en Escuela Belem Mata donde se comienza por la excavación manual para cimientos se avanzan 14 ml de 20 cm de profundidad por 60 cm de ancho.

**UBICACIÓN**

1. Escuela Belén mata

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

martes, 18 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** SAMUEL, MANUEL U JUAN ANDRADE.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continua con la excavación de zanja, se avanza otros 14 ml de 30 cm de profundidad por 60 cm de ancho.

**UBICACIÓN**

1. Escuela Belén mata

**REPORTE FOTOGRAFICO**



# BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

## REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 19 de noviembre de 2025

CUADRILLA SAMUEL, JOSE, JUAN Y MANUEL.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con la excavación de zanja en donde se demuele con rotomartillo Se trae un avance final de 12 ML con 50cm, de profundidad por 60 de ancho.

### UBICACIÓN

1. Escuela primaria Belén mata

## REPORTE FOTOGRAFICO



**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO

**FECHA:**

jueves, 20 de noviembre de 2025

**CUADRILLA**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó la limpieza de baches para poder ser rehabilitados, se escarbó y retiró el escombros, se limpio en total 1.4 km.

**UBICACIÓN**

Colonia Industrial.

**REPORTE FOTOGRAFICO**





**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO

**FECHA:**

**viernes, 21 de noviembre de 2025**

**CUADRILLA** SAMUEL, JOSE

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continua con la excavación de zanja para la colocación de cimientos donde se da un avance de 9ml por 50 cm de profundidad.

**UBICACIÓN**

Col. Sombreretillo. Escuela Belem Mata.

**REPORTE FOTOGRAFICO**





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!****OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

lunes, 24 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** MIGUEL, JAVIER, JUAN, NAZARIO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se iniciaron los trabajos de enjarre en la Escuela Secundaria #8 dentro de un taller de clases, donde se enjarro 12m3 y queda pendiente darle flota.

**UBICACIÓN**

Escuela Secundaria #8

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

martes, 25 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** MIGUEL, JAVIER, JUAN Y NAZARIO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continua con el enjarre de la Escuela Secundaria #8, donde se avanza un total de 13m2 de enjarre finalizado.

**UBICACIÓN**

Escuela Secundaria #8

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

jueves, 27 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** MIGUEL, JUAN, NAZARIO Y OSCAR**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continua con el enjarre de bardas en Salón de clases de la Escuela Secundaria #8, donde se da un avance de 12m2.

**UBICACIÓN**

Escuela Secundaria #8

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

viernes, 28 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** MIGUEL Y NAZARIO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó la construcción de un registro de drenaje en Plaza Ismael Murillo, de .60\*1 m. Se realizó la conexión de tubería en áreas dañadas con tubo de 4" y se rellenó zanja con material producto de excavación.

**UBICACIÓN**

Plaza Ismael Murillo (Donceles).

1 BULTO

**REPORTE FOTOGRAFICO**

## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



## SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

### ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 3 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, JULIO, MARTIN, SAMUEL, MANUEL, ANGEL, EMMANUEL, JUAN MARCOS Y OSCAR

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa levantando muros para cuarto en Estación de Ferrocarril.
2. Se realizó la colocación de cuello de cera en 2 tazas de UBR.
3. Se cargan 2 viajes de tierra de banco en camioneta y traila para relleno de bacheen calle Alameda. Terminándolo de rellenar, solo falta la compactación del mismo.
4. Se reciben 770 tabiques.

#### UBICACIÓN

1. Estación de Ferrocarril
2. UBR

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



## SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

### ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 4 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, SAMUEL, ROBERTO, JULIO, MARTIN, MANUEL, JUAN MARCOS, ANGEL Y OSCAR.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua en la estación de Ferrocarril con el cuarto para los compañeros soldadores, se cuela marco de la puerta.
2. Se cortaron ramas que estorbaban para continuar con el levantamiento de paredes.
3. Se quita tapanco del Campo Olvera, para después proceder a cargar material a bodega de estación.
4. Se arrimó brocal y tapa para colocar la línea de drenaje. Así como también arena, grava y 1 bulto de cemento.

#### UBICACIÓN

1. Estación de Ferrocarril.
- 
3. Campo Olvera
4. Calle Niños Heroes.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 5 de noviembre de 2025

CUADRILLA ROBERTO, JAVIER, MARTIN, JULIO, MANUEL, MIGUEL, NAZARIO Y EMMANUEL.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se quitan bollas de Calle Gustavo Díaz Ordaz y se arriman a Calle los Ángeles "la Pila" y Calle Piña.
2. Se recoge escombros de Calle Reforma, Col. Centro y Puente de Peñoles.
3. Se terminó de enrasar cuarto de estación.

#### UBICACIÓN

1. Col. Sombreretillo
2. Calle Reforma

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 6 de noviembre de 2025

CUADRILLA ROBERTO, JUA CARLOS, JAVIER, JULIO, MANUEL, MIGUEL, NAZARIO, OSCAR, MARTIN Y EMMANUEL

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se terminó de colocar bollas en Calle Piña.
2. Con ayuda del rotomartillo se realizaron hoyos para colocar rieles como protección en dormitorios de Protección Civil, donde se escarbo aproximadamente 40 cm de profundidad.
3. Se comenzó a demoler piso y firme en salón de Escuela Secundaria #60 con ayuda del Roto.

#### UBICACIÓN

1. Barrio la Pila, Calle Piña.
2. Protección civil.
3. Escuela Secundaria #60

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 7 de noviembre de 2025

CUADRILLA MIGUEL, NAZARIO, OSCAR, EMMANUEL, MARTIN, JAVIER, JULIO, MANUEL.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua tumbando piso y firme con ayuda del rotomartillo y sacando el escombros del salón.
2. Se continua con la colocación de rieles como protección en instalaciones de Protección Civil. (1 bulto)
3. Se cargan 50 sillas y se llevan a casa de Cultura.
4. Se recoge parte de la estructura del tapanco de Casa de Cultura a Estación de Ferrocarril.
5. Se realizó la colocación de dispensador de servilletas en Tesorería Municipal.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60
2. Proteccion civil
5. Tesoreria Municipal.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 10 de noviembre de 2025

CUADRILLA MIGUEL, MARTIN, NAZARIO, OSCAR, JAVIER, EMMANUEL, MARCOS, MANUEL, JOSE ANTONIO

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua rompiendo piso y sacando escombros y se termina de sacar el escombros, así como también se comienza a meter tierra de banco para rellenar partes hundidas y para compactar piso.
2. Se rompe concreto con rotomartillo para realizar sondeo en Calle.
3. Se recogen 2 viajes de escombros.
4. Se revisan los baños de hombres del DIF Municipal, derivado de que había fuga y tiradero de agua.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60.
2. Calle Andador Manuel Clouthier.
3. Calle Allende
4. DIF Municipal

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 11 de noviembre de 2025

CUADRILLA MIGUEL, NAZARIO, OSCAR, MARTIN, ANGEL, ROBERTO, JULIO, SAMUEL, JAVIER, EMMANUEL,

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con el relleno de tierra de banco el salón de la Técnica, lo cual se terminó de compactar, comenzando a colocar malla electro soldada.
2. Se comenzó con la rehabilitación del salón de SUTSEMOP.
3. Se realizó el cambio de 2 llaves mezcladoras, se colocaron 2 llaves estoperas, 4 alimentadores y se cambiaron 2 cespel de lavamanos de los baños de hombres del DIF Municipal.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60.
2. Salón de SUTSEMOP
3. Dif Municipal

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 12 de noviembre de 2025

CUADRILLA CARLOS, MANUEL, ROBERTO, MIGUEL, OSCAR, MARTIN, ANGEL, NAZARIO, EMMANUEL Y MARCOS.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con la rehabilitación del aula de la secundaria, en donde se comenzó a colocar el firme.
2. Se atendió solicitud realizada por el DIF Municipal, el cual se comenzó a realizar la rotulación del logo a las afueras del DIF.
3. Se rellenó de tierra la zanja que se encuentra arriba de Seguridad Publica.
4. Se recogieron mesas y sillas para luego llevarse al auditorio Municipal.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60.
2. DIF Municipal.
3. Seguridad Publica

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 13 de noviembre de 2025

CUADRILLA EMMANUEL, OSCAR Y MANUEL

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa rellenando zanja de drenaje que se encuentra arriba de Seguridad Publica.
2. Se terminó de hacer la rotulación en DIF Municipal.
3. Se arrimó cemento de bodega de la Secundaria para salón y así colocar el firme.

#### UBICACIÓN

1. Arriba de Seguridad Publica
2. DIF Municipal
3. Escuela Secundaria Técnica #60.

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 14 de noviembre de 2025

CUADRILLA: MANUEL, JUAN CARLOS, JAVIER, JULIO, MIGUEL, NAZARIO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se comienza con la segunda rotulación de logo en DIF Municipal.
2. Se continúa rellenando zanja que se encuentra en la Calle arriba de Seguridad Publica.
3. Se continua con la rehabilitación de pintura en el salón del SUTSEMOP. Terminando de pintar puertas, moldura, mamparas de los baños y portón.

#### UBICACIÓN

1. DIF Municipal
2. Calle arriba de Seguridad Publica.
3. Salón del SUTSEMOP.

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 18 de noviembre de 2025

CUADRILLA: MANUEL, ROBERTO, JAVIER, MIGUEL, NAZARIO Y JULIO

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se comenzó con la colocación de vitropiso al interior del salón.
2. Se continua con la rehabilitación de pintura del salón del SUBSEMOP, esta vez la pintura se colocó en los exteriores, así como también se retiraron las mallas de ventanas para pintarlas.
3. Se comenzó con la rotulación del logo del SUBSEMOP.
4. Se recogieron 22 mesas de Plaza San Francisco y se resguardan en patio de Presidencia.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Técnica #60.
2. Salón del SUBSEMOP.
3. Salón del SUBSEMOP.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 19 de noviembre de 2025

CUADRILLA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua colocando vitropiso en el salón de la Escuela. Asi como tambien se arrimo el pega piso y cajas de vitropiso para ser colocadas.
2. Se terminaron de pintar ventanas y porton en el salon sel SUTSEMOP.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Técnica #60.
2. SUTSEMOP

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 21 de noviembre de 2025

CUADRILLA MIGUEL, NAZARIO, MANUEL, SERGIO, NOE, MARTIN, FRANCISCO, JOSE Y OSCAR.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se comenzó con la rehabilitación de bacheo en carretera salida a chalchihuites, se cargaron 3 viajes de asfalto y se utilizó compactadora.

#### UBICACIÓN

Carretera chalchihuites

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 24 de noviembre de 2025

CUADRILLA MANUEL, JOSE, FRANCISCO, NOE, SERGIO, OSCAR Y MARTIN

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la rehabilitación de bacheo en carretera salida a chalchihuites, se acarrearón 2 viajes de asfalto y se compacta con camioneta.

#### UBICACIÓN

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 25 de noviembre de 2025

CUADRILLA MANUEL, MARTIN, SERGIO, NOE, EMMANUEL, OSCAR, JUAN CARLOS, ROBERTO Y JULIO

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se termino de bachear en boulevard el minero y el campesino en donde se utiliza compactadora.
2. Se comenzó con el bacheo en libramiento donde se cargaron 3 viajes de asfalto.
3. Se continua con la colocación de vitropiso en el salón de la Secundaria #60.
4. Se terminó de pintar las 2 oficinas del DIF Municipal.

#### UBICACIÓN

1. Boulevard el minero y el Campesino.
2. Libramiento
3. Escuela Secundaria Tecnica #60.
4. DIF Municipal

#### REPORTE FOTOGRAFICO



# BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 26 de noviembre de 2025
CUADRILLA	MANUEL, EMMANUEL, NOE, MARTIN, JUAN CARLOS, FRANCISCO, ROBERTO, JAVIER Y JULIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continua con el bacheo en libramiento, donde se barren y riegan los baches para que el asfalto se compacte correctamente. Fue necesario cargar 4 viajes de asfalto y se utilizó compactadora.		1. Libramiento	
2. Se continua con la colocación de vitropiso en el salón de la Escuela Secundaria Técnica #60.		2. Escuela Secundaria Tecnica #60.	

## REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



## SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

## OBRAS PÚBLICAS

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 27 de noviembre de 2025

CUADRILLA MANUEL, FRENCISCO, SERGIO, NOE, MARTIN, JAVIER Y JULIO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con la rehabilitación de bacheo en donde se barren los baches y se carga tierra de banco para rellenar baches profundos en libramiento.
2. Se da seguimiento en la colocación de vitropiso del salón en EST#60.

#### UBICACIÓN

1. Libramiento
2. Escuela Secundaria Tecnica #60.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 28 de noviembre de 2025

CUADRILLA JAVIER, JULIO, JUAN CARLOS, MANUEL, MARTIN, MARCOS, OSCAR.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua colocando vitropiso en salón de Secundaria #60.
2. Se comienza con registro de drenaje en Calle arriba de seguridad pública.
3. Se continua pintando rotulo en Seguridad vial.
4. Se recoge escombros de Calle Niños Héroes.

#### UBICACIÓN

1. Escuela Secundaria Tecnica #60.
2. Arriba de Seguridad Publica.
3. Seguridad Publica.
4. Calle Niños Héroes.

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



## SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

### ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 3 de noviembre de 2025

CUADRILLA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acarrean tarimas y se desarma estructura de tapango para luego proceder a llevar todo a la estación.
2. Se rehabilita un bolardo caído en puente de las cadenas, queda soldado.
3. Se agregan soportes a barandales de jardín Juárez. Quedan rehabilitados 9 barandales.

#### UBICACIÓN

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 4 de noviembre de 2025

CUADRILLA CARLOS. SERGIO, NOE Y FRANCISCO.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se arrima a la Estación de Ferrocarril 30 llantas para pintarse y luego proceder a instalarse en los módulos de los juegos.
2. Se acudió a la Comunidad de Salas Pérez para realizar la instalación de tubos galvanizados para la colocación de malla perimetral.

#### UBICACIÓN

2. Comunidad de Salas Pérez.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** ADOLFO MENA

**FECHA:**

**miércoles, 5 de noviembre de 2025**

**CUADRILLA**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se instala malla perimetral en salas Pérez, se termina la mitad con la malla que se contaba, se restira con ayuda de camioneta y gata.

**UBICACIÓN**

1. Salas Perez

**REPORTE FOTOGRAFICO**



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 6 de noviembre de 2025

CUADRILLA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la rehabilitación del área de juegos en donde se podaron huisaches y árboles que se encontraban en esa área verde. Así como también se comenzó a sacar piedra y basura, para luego proceder a colocar tubos galvanizados faltantes.

#### UBICACIÓN

1. Salas Perez

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 7 de noviembre de 2025

CUADRILLA CARLOS, SERGIO, FRANCISCO, SAMUEL, LUIS ANGEL, CARLOS Y NOE.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se terminó de despedrar el área en el que serán colocados los juegos infantiles, se sacar parte de la arena, y se procede a cambiar de lugar el pasamanos.

#### UBICACIÓN

1. Salas Perez

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 10 de noviembre de 2025

CUADRILLA SERGIO, FRANCISCO, NOE, CARLOS, SAMUEL Y LUIS ANGEL.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se llevó a cabo la reforestación de árboles en la Comunidad de Salas Pérez, se colocaron en el área donde serán instalados los juegos, para esto fue necesario realizar una zanja para instalar tubería para línea de agua potable y así regar los arbolitos.

#### UBICACIÓN

1. Salas Perez

#### REPORTE FOTOGRAFICO





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**

martes, 11 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** SERGIO, FRANCISCO, VALENTIN, CARLOS Y NOE.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se instaló portón en el Campo Llerena, se cortaron 10 cm de cada hoja para poder colocarlo.
2. Se acudió a la Colonia Hidalgo para llevar tapanco que fue solicitado por la delegación para llevar a cabo la coronación de Reyna de las fiestas de dicha comunidad .
3. Se recogieron 20 arbolitos de la Comunidad de Salas Pérez así como también se regaron algunos.

**UBICACIÓN**

1. Campo Deportivo Llerena
2. Colonia Hidalgo.
3. Salas Perez

**REPORTE FOTOGRAFICO**

## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 12 de noviembre de 2025

CUADRILLA VALENTIN, CARLOS, SERGIO, FRANCISCO Y NOE.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con el acarreo del material faltante para el tapanco en la Colonia Hidalgo.
2. Se acudió al Rastro Municipal para arreglar caballetes y barandales, se instalaron 4 ángulos de 23\*16" en pilares.

#### UBICACIÓN

1. Colonia Hidalgo
2. Rastro Municipal.

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 13 de noviembre de 2025

CUADRILLA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se terminó de soldar áreas del Rastro.
2. Se acudió a la Colonia Hidalgo para llevar a cabo el armado de estructura y entarimado, así mismo se realizó el punteo con soldadura de la estructura.

#### UBICACIÓN

1. Rastro Municipal
2. Colonia Hidalgo

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 14 de noviembre de 2025

CUADRILLA FRANCISCO, CARLOS, SERGIO, VALENTIN Y NOE

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se terminó de soldar la placa en el Rastro Municipal así como también se reforzó defensa de la camioneta de la misma área.
2. Se soldó portón en el capo Llerena.
3. Se recogió tierra para aguas pluviales enfrente del Cbtis.
4. Se arregla escalera y se usa en tapanco.

#### UBICACIÓN

1. Rastro Municipal
2. Campo Llerena
3. Frente al Cbtis

#### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 18 de noviembre de 2025

CUADRILLA SERGIO, CARLOS, FRANCISCO Y SERGIO HDZ.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acudió a la Colonia Hidalgo para recoger mobiliario que se había prestado para evento de coronación de dicha comunidad así como desmontar el tapanco para luego traerlo de regreso a la estación de Ferrocarril donde se resguardo.

#### UBICACIÓN

1. Coloia Hidalgo

#### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 19 de noviembre de 2025

CUADRILLA SERGIO, CARLOS, FRANCISCO Y SERGIO HDZ.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se armó tapanco enfrente de la parroquia, mismo que será utilizado para presenciar el desfile conmemorativo al 20 de noviembre.

#### UBICACIÓN

#### REPORTE FOTOGRAFICO





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**

jueves, 20 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** SERGIO, CARLOS, FRANCISCO Y SERGIO HDZ.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se lleva a cabo la rehabilitación de caminos salida a Chalchihuites, donde se realizó el barrido con escoba de dichos baches para luego proceder al relleno con asfalto y comprimir.

**UBICACIÓN**

Salida a Chalchihuites

**REPORTE FOTOGRAFICO**

**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!  
OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**

lunes, 24 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** SERGIO, FRANCISCO Y SERGIO ORTIZ**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se cargó asfalto en camioneta 108 para continuar con el bacheo en salida a Chalchihuites.

**UBICACIÓN**

De Estación de Ferrocarril a Salida a Chalchihuites

**REPORTE FOTOGRAFICO**



## BITACORA MUNICIPAL

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 25 de noviembre de 2025


CUADRILLA FRANCISCO, CARLOS

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se quitó tapanco que se encontraba instalado en frente de la parroquia y se lleva a Estación de Ferrocarril.

#### UBICACIÓN

#### REPORTE FOTOGRAFICO

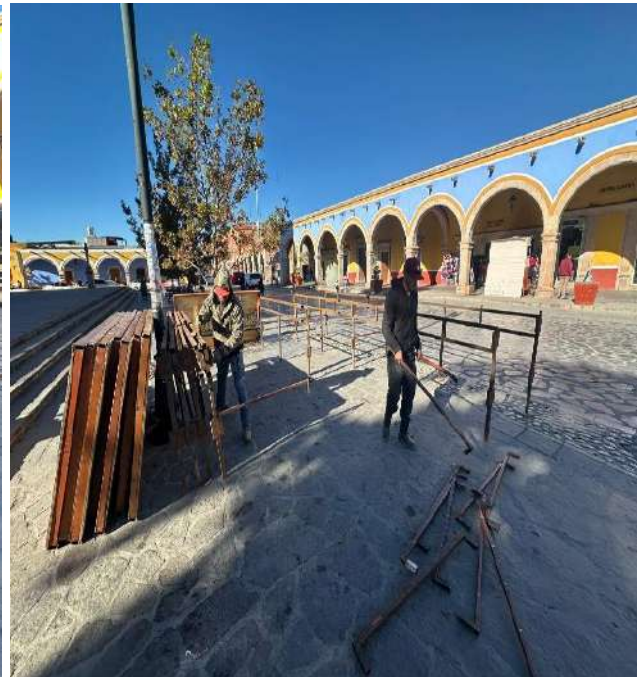

**BITACORA MUNICIPAL**

**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**LUGAR:**

**SOMBRERETE**

**SUPERVISOR:** ADOLFO MENA

**FECHA:**

**miércoles, 26 de noviembre de 2025**

**CUADRILLA** SERGIO ORTIZ Y CARLOS JAQUEZ

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se soldaron patas de base para pino de navidad que será instalado en Presidencia Municipal, así como también se elaboró pino realizado de alambrón para el departamento de Obras Públicas.

**UBICACIÓN**

**REPORTE FOTOGRAFICO**





**BITACORA MUNICIPAL****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**


viernes, 28 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** SERGIO, FRANCISCO, CARLOS, NOE Y EMMANUEL.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se cargó asfalto para bachear carretera salida a Chalchihuites donde se cargan 3 camionetas y se bachea aproximadamente 1 km.

**UBICACIÓN**

Salida a Chalchihuites

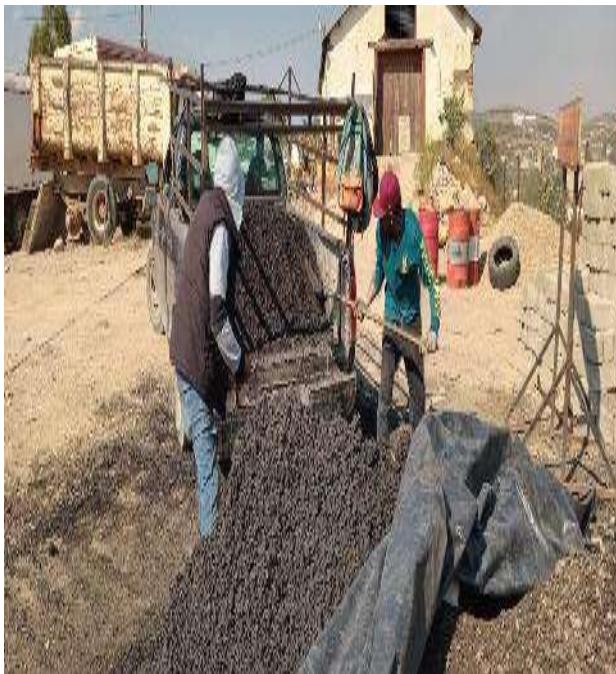**REPORTE FOTOGRAFICO**

## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

lunes, 3 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA 100 LITROS AL CAMION 100 A LA EXAVADORA, FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO, DEL KILOMETRO 6+800 AL 7+000, LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

martes, 4 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA PARA LA FORMACION DE 260 METROS LINEALES DE CUNETAS Y TERRAPLEN PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO DEL KILOMETRO 6+40AL 7+000 PARA RECIBIRE MATERIAL DE BANCO 9 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO A UNA DISTANCIA MAYOR DE 4 KILOMETROS DEDISTANCIA DE LA OBRA EN EL CAMION DE VOLTEO EXCAVADORA CARGAR MATERIAL DE BANCO Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

miércoles, 5 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA PARA LA FORMACION DE 150 METROS LINEALES DE CUNETAS Y TERRAPLEN PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO DEL KILOMETRO 6+250 AL 7+6+400 PARA RECIBIRE MATERIAL DE BANCO 13 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO A UNA DISTANCIA MAYOR DE 4 KILOMETROS DEDISTANCIA DE LA OBRA EN EL CAMION DE VOLTEO EXCAVADORA CARGAR MATERIAL DE BANCO Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

jueves, 6 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA 100 LITROS AL CAMION 100 A LA EXAVADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MIVIMIENTO DE TIRERA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 6+000 AL 7+250 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO Y ACARREO DE 06 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO POR QUE EL CAMION DE POCHO DE UNA LLANTA TRASERA

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

viernes, 7 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

MOTOCONFORMADORA SE PONCHO DE LA LLANTA DENANTERA TENDIDO DEL AMERIAL DE BANCO E LOS PRIMEROS 200 METROS DEL KILOMETRO 6+800 LA 7+000 Y ACARREO DE 11 VIAJES DE NMATERIAL DE BACO EN CAMION DE VOLTEO EXCABADORA ABUNDAMIENTO DE MATERIAL Y CARGAR CAMIONES LA MAQUINARIA TRABAJA DE 7 DE LA MAÑANA A LAS 6 DE LA TARDE DE LUNAES A JUEVES Y VIERNES DE 7 A 3 DE LA TARDE

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

martes, 11 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 6+500 AL 6+650 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 12 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+900 AL 6+720 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

miércoles, 12 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 6+300 AL 6+500 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 15 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+720 AL 6+620 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





**BITACORA MUNICIPAL DE OBRA****DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****COLONIA CUAHUTEMOC****SUPERVISOR:** JESUS MADERA ALBA**FECHA:**

martes, 18 de noviembre de 2025

**CUADRILLA** MAQUINARIA**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 5+300 AL 8+520 ASI COMO EL TENDIDO DE METRIAL DE BANCO EN CAPAS DE 15 CM DE 400 METROS LINEALES LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+300 A 6+560 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

**REPORTE FOTOGRAFICO:**

## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

miércoles, 19 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER 200 LITROS DE DIESEL A LA MOTOCONFORMADORA PARA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 5+000 AL 5+300 ASI COMO EL TENDIDO DE METRIAL DE BANCO EN CAPAS DE 15 CM DE 600 METROS LINEALES LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+200 A 6+300 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

jueves, 20 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA 100 LITROS AL CAMION 100 A LA EXAVADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 4+750 AL 5+000 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 12 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+200 AL 6+300 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

lunes, 24 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA 100 LITROS AL CAMION 100 A LA EXAVADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 4+400 AL 4+700 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 13 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 5+900 AL 6+000 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

martes, 25 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 4+100 AL 4+400 ASI COMO EL TENDIDO DE METRIAL DE BANCO EN CAPAS DE 15 CM DE 400 METROS LINEALES LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+200 A 6+300 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

miércoles, 26 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER 200 LITROS DE DIESEL A LA MOTOCONFORMADORA PARA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DEL KILOMETRO 3+800 AL 4+100 ASI COMO EL TENDIDO DE METRIAL DE BANCO EN CAPAS DE 15 CM DE 600 METROS LINEALES LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+100 A 6+200 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

jueves, 27 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA 100 LITROS AL CAMION 100 A LA EXAVADORA FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR EN EL CAMINO CUAUHTEMOC A FLORES MAGON DEL KILOMETRO 0+000 AL 2+000 LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 10 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 6+200 AL 6+300 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS LAS MAQUINAS Y OPERADORES TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

#### REPORTE FOTOGRAFICO:



## BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

### DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

#### REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

COLONIA CUAHUTEMOC

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

viernes, 28 de noviembre de 2025

CUADRILLA MAQUINARIA

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

FORMACION DE TERRACERIAS EN ARROYO VEHICULAR CON MOVIMIENTO DE TIERRA DE LOS LATERALES DEL CAMINO DPARA LA FORMACION DE CUNETAS ASI COMO EL TENDIDO DE METRIAL DE BANCO EN CAPAS DE 15 CM DE 500 METROS LINEALES LA EXCAVADORA ABUNDO MATERIAL EN EL BANCO ACARREO DE 6 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KILOMETRO 4+700 A 4+800 A UNA DISTANCIA DE 5 KILOMETROS ,TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA PARA EL COMUNIDAD DE LA SOLEDAD

#### REPORTE FOTOGRAFICO:





## BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

**SUPERVISOR** SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA

**REPORTE DE ACTIVIDADES** NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO

**LUGAR:** SOMBRETERE

**FECHA:** jueves, 6 de noviembre de 2025

**BULLDOZER: #99** OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

**HORA DE INICIO:** 8:00 am

**HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se traslada bulldozer D7H a bordo de lobo de las instalaciones de parque vehicular a relleno sanitario para mantenimiento de relleno sanitario

### REPORTE FOTOGRAFICO



## BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

**SUPERVISOR** SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA

**REPORTE DE ACTIVIDADES** NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO

**LUGAR:** SOMBRERETE

**FECHA:** jueves, 6 de noviembre de 2025

**BULLDOZER: #99** **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

**HORA DE INICIO:** 8:00 am

**HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento a relleno sanitario con bulldozer D7H  
Se cargó diesel 200 litros

### REPORTE FOTOGRAFICO





## BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!**  
**MAQUINARIA PESADA**

SUPERVISOR: **SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA**

REPORTE DE ACTIVIDADES: **NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO**

LUGAR: **SOMBRERETE**

FECHA: **viernes, 7 de noviembre de 2025**

BULLDOZER: #99 OPERADOR: **JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ**

HORA DE INICIO: **8:00 am**

HORA DE TERMINO: **15:00 pm**

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento a relleno sanitario con bulldozer D7H se cargó diesel 200 litros

### REPORTE FOTOGRAFICO

