

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 1 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a realizar trabajos de desazolve y destape de la línea de drenaje, la cual se encontraba saturada, provocando escurrimientos de aguas residuales y la generación de malos olores en el área. Mediante las labores de limpieza y desobstrucción se restableció el flujo adecuado de la red de drenaje, eliminando el problema de acumulación y mejorando las condiciones sanitarias del sitio. 2. Se continúa trabajando en la calle Fundidora. Como parte de las actividades programadas, es indispensable realizar trabajos de excavación para localizar el tramo de tubería dañado y determinar el alcance de la afectación, con el fin de proceder posteriormente a su reparación.		1. Campo Olvera 2. Calle Fundidora 3. Buena Vista	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1  2  3 			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 2 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se acudió a la colonia Industrial para llevar a cabo la rehabilitación de una línea de drenaje, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red sanitaria y beneficiar a la ciudadanía. Como parte de los trabajos realizados, se efectuó la sustitución e instalación de 30 metros lineales de tubería nueva de 8 pulgadas de diámetro, restableciendo las condiciones adecuadas para la conducción de aguas residuales.		Colonia Industrial	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 3 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
1. Se realizó el desazolve y destape de la línea de drenaje que se encontraba obstruida, restableciendo el flujo adecuado dentro de la red sanitaria. 2. Se acudió a la comunidad de González Ortega para atender diversos reportes de drenaje obstruido. Esta situación estaba afectando a la población debido al derrame de aguas residuales y a los malos olores generados, problemática que se intensifica durante la temporada de lluvias. Se realizaron las acciones correspondientes para restablecer el adecuado funcionamiento de la red de drenaje.		UBICACIÓN 1. Calle Joel Ochoa, Barrio de el peñasco. 2. González Ortega	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

jueves, 4 de junio de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continúan los trabajos de liberación y limpieza de líneas de drenaje en la colonia González Ortega, debido a que se encuentran considerablemente azolvadas. Durante la inspección se detectó la necesidad de sustituir un tramo de tubería ubicado en la calle Niños Héroes de la misma colonia, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Asimismo, se realizaron los trabajos de encofrado y protección de la tubería que sufrió una ruptura el día anterior, con el propósito de evitar el ingreso de residuos y materiales que pudieran obstruir nuevamente la línea de drenaje.

UBICACIÓN

1. González Ortega

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 5 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se acudió a la comunidad de González Ortega para llevar a cabo la sustitución de un tramo de tubería ubicado en la calle Niños Héroes, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la red de distribución. Con esta intervención se mejora la continuidad y eficiencia del servicio, beneficiando directamente a los habitantes de la localidad.		Colonia Gonzalez Ortega	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 8 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos de encofrado de la tubería ubicada en Calle Piña, con el propósito de brindar protección estructural a la instalación y asegurar su correcto funcionamiento			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 9 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos de encofrado de la tubería ubicada en Calle Piña, con el propósito de brindar protección estructural a la instalación y asegurar su correcto funcionamiento. Durante la jornada se realizaron las actividades necesarias para el confinamiento y refuerzo del tubo.		calle piña	
		2. Calle ejército Mexicano	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continuó con los trabajos de encofrado de la tubería ubicada en el Arroyo de San Judas, con el propósito de brindar protección estructural a la instalación y asegurar su correcto funcionamiento. Durante la jornada se realizaron las actividades necesarias para el confinamiento y refuerzo del tubo			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 10 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa trabajando en el arroyo de San Judas, donde se realizó el encofrado de protección para la tubería de drenaje de 16", utilizando piedra y cemento. Estos trabajos se ejecutaron con la finalidad de brindar mayor estabilidad, protección y resistencia a la tubería, garantizando su adecuado funcionamiento y durabilidad.		1. Arroyo de San Judas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 11 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió al Rastro Municipal para atender un reporte de obstrucción en un ducto. Se realizaron las labores necesarias para destaparlo, restableciendo el correcto flujo de aguas en el sistema. 2. Se acudió a la comunidad de Ex Hacienda Zaragoza para atender un reporte por derrame de aguas residuales ocasionado por el taponamiento de una línea de drenaje, situación que afectaba a varios domicilios aledaños. Tras realizar la inspección correspondiente, se determinó que la obstrucción era provocada por la acumulación de raíces en el interior de la tubería. Se efectuaron las labores de desazolve necesarias, logrando liberar la línea y restablecer el funcionamiento normal del sistema de drenaje			
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 12 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a la comunidad de Ejido Independencia, donde se realizaron trabajos de desazolve y liberación de la línea general de drenaje, restableciendo su correcto funcionamiento. 2. En la comunidad de Charco Blanco, se llevaron a cabo labores de revisión, limpieza y liberación de diversas líneas de drenaje que se encontraban obstruidas por acumulación de raíces, mejorando el flujo y la operación de la red sanitaria.		1. Ejido Independencia 2. Charco Blanco	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 15 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de sondeo y verificación de la red mediante inyección de agua a presión con punta de aguja, utilizando camión Vactor para la localización y evaluación de posibles obstrucciones en la infraestructura hidráulica/sanitaria. Los trabajos se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad, específicamente sobre la Avenida Hidalgo, frente a la tienda Fragua, en las inmediaciones de la Chatarrera Zaldívar y frente a las instalaciones de Grúas Lerma. Las actividades permitieron inspeccionar las condiciones de la red y determinar la continuidad del flujo en los tramos intervenidos.			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 16 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
		1. Detrás de CFE	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN ! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se atendió un reporte de drenaje en el Campo Olvera, donde se detectó escurrimiento de aguas residuales sobre el camino, situación que generaba malos olores y molestias para los habitantes y personas que transitan por el área. Se realizaron las labores correspondientes para corregir la problemática y restablecer condiciones adecuadas. 2. Asimismo, se acudió a la comunidad de Barajas para atender un reporte relacionado con la red de drenaje, realizando las labores correspondientes para identificar y solucionar la problemática reportada.		UBICACIÓN 1. Campo Olvera 2. Barajas	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			
			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 18 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos para liberar una línea de drenaje en una calle que se encontraba obstruida por acumulación de grasa y residuos. 2. Se continuó trabajando en el área afectada; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible liberar completamente la línea de drenaje debido al grado de obstrucción existente. 3. Se acudió a la comunidad de Zaragoza para atender un reporte de drenaje. Se realizaron dos sondeos en la línea, logrando restablecer su funcionamiento de manera satisfactoria.		1. Allende 2. Calle Miguel Hgo	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 22 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la liberación de la línea de drenaje ubicada en Prolongación Javier Mina, restableciendo su funcionamiento. 2. Se atendió un reporte de drenaje en la colonia Cuauhtémoc. Durante la intervención se detectó un severo problema de taponamiento en la línea. Se efectuaron diversos sondeos y maniobras de desazolve; sin embargo, no fue posible liberar la tubería, por lo que el problema permanece pendiente de una intervención adicional.		1. Prolongación Javier Mina 2. Colonia Cuauhtemoc	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
 		  	

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 23 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1 Se realizó la limpieza de la rejilla ubicada a un costado de Protección Civil, retirando los residuos acumulados para mantener el adecuado flujo del sistema de drenaje. 2 Asimismo, se acudió a la comunidad de Cuauhtémoc para iniciar los trabajos de sustitución de la tubería de drenaje; sin embargo, no fue posible llevarlos a cabo debido a que la tubería disponible era de 12 pulgadas, cuando la instalación requería tubería de 8 pulgadas. Para la ejecución de la obra se requieren 12 metros de tubería con las especificaciones correctas, por lo que los trabajos quedaron pendientes hasta llevar el material adecuado.		1. Protección civil 2. Colonia Cuauhtémoc	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 24 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se acudió nuevamente a la colonia Cuauhtémoc para continuar con los trabajos de sustitución de la línea de drenaje, la cual se encontraba totalmente azolvada, provocando taponamientos constantes que afectaban a la ciudadanía. Con el propósito de evitar que esta problemática continuara, se realizó el reemplazo de 18 metros lineales de tubería nueva. Asimismo, se efectuó el acomodo de la cama de tierra para la correcta nivelación de la tubería y se llevó a cabo el encofrado correspondiente para asegurar su adecuada instalación.		UBICACIÓN	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
3 TUBOS Y 1 BULTO DE CEMENTO			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 25 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de liberación en la línea de drenaje ubicada en la calle Jalisco, con el objetivo de eliminar la obstrucción y restablecer el flujo adecuado del sistema. 2. Se inició la liberación de un registro en la línea de drenaje. Durante los trabajos se detectó que el taponamiento se desplazaba a lo largo de la tubería, por lo que fue necesario revisar y sondear varios registros hasta localizar y eliminar por completo la obstrucción, logrando restablecer el flujo normal del drenaje.		1. calle Jalisco 2. Frente SUTSEMOP	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 26 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron sondeos en la línea de drenaje para lograr su liberación y restablecer el flujo adecuado, eliminando la obstrucción existente 2. Se atendió un reporte de drenaje a un costado de la Casa de Cultura. Fue necesario destapar la rejilla para realizar la liberación del flujo, ya que presentaba una acumulación de desechos que obstruía el paso del agua.		1. Calle Sierra de Organos 2. un costado de Casa de cultura	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 29 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa trabajando en las comunidades, brindando apoyo en el desazolve de fosas sépticas, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los servicios de drenaje en beneficio de la ciudadanía.			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 29 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevó a cabo la fabricación de tres tapas y un brocal para el mantenimiento y la reposición de registros de drenaje que se encuentren dañados.		UBICACIÓN	
MATERIAL UTILIZADO 3 BULTOS DE CEMENTO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 30 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Liberación de línea general en la comunidad de La Tapia. 1. Se llevaron a cabo los trabajos de liberación de la línea general en la comunidad de La Tapia, realizando las actividades necesarias para retirar obstrucciones, acondicionar el área de trabajo y dejar la infraestructura lista para las siguientes etapas del proyecto, conforme a las especificaciones establecidas. 2. Liberación de línea general en la calle Santa Rosa. Se ejecutaron los trabajos de liberación de la línea general sobre la calle Santa Rosa. Al término de la jornada, el tramo intervenido quedó en condiciones de continuar con las actividades programadas.		1. La Tapia 2. calle Santa Rosa	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 -2027 ¡ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 1 de junio de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, TELLEZ, ROBERTO, SAMUEL, VICTOR, FELIPE, FCO, DANIEL, SERGIO Y VICTOR CARDONA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con el avance de los trabajos de soldadura en los VIP. Asimismo, se concluyen los trabajos de entarimado en la planta alta y se continua trabajando el entarimado en la parte baja.			
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 2 de junio de 2026
CUADRILLA	MANUEL, VÍCTOR, NOE, VILLA, ROBERTO, JUAN MARCOS, MARTIN, DANIEL, SERGIO, SAMUEL, FCO, JOSÉ ÁNGE		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de ensamble y montaje de la zona VIP destinada a los eventos conmemorativos del aniversario de Sombrerete, realizando el armado y ajuste de los elementos estructurales.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 3 de junio de 2026
CUADRILLA	MANUEL, VÍCTOR, NOE, VILLA, ROBERTO, JUAN MARCOS, MARTIN, DANIEL, SERGIO, SAMUEL, FCO, JOSÉ ÁNGE		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se continuaron los trabajos de soldadura del barandal del Primer VIP. Se inició el entarimado de la planta baja del Segundo VIP. Se concluyeron los trabajos de planta alta del Segundo VIP. Se comenzó la fabricación e instalación mediante soldadura del barandal del Segundo VIP. Se inició la colocación de paredes en el área VIP. Se inició la fabricación y soldadura de soportes para amacizar las zonas del Segundo VIP, con el fin de reforzar y dar estabilidad a la estructura.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 3 de junio de 2026
CUADRILLA	MANUEL, VÍCTOR, NOE, VILLA, ROBERTO, JUAN MARCOS, MARTIN, DANIEL, SERGIO, SAMUEL, FCO, JOSÉ ÁNGE		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se recibieron 500 pijas provenientes de Ferretería de con Hector Bonilla Caldera para su utilización en los trabajos de instalación y acondicionamiento de la Zona VIP, como parte de la infraestructura preparada para la celebración del 471.º Aniversario de Sombrerete. El material será empleado en labores de fijación y ensamble de los elementos estructurales que conforman dicha área. 2. Se trasladaron y acomodaron 45 piezas de PTR de 1 1/2" en el área de trabajo.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 4 de junio de 2026
CUADRILLA	MANUEL, VÍCTOR, NOE, VILLA, ROBERTO, JUAN MARCOS, MARTIN, DANIEL, SERGIO, SAMUEL, FCO, JOSÉ ÁNGEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de soldadura de PTR para el amacizado y refuerzo de las áreas VIP. Se continúa con la instalación y soldadura de barandal en el segundo nivel del área VIP. Se realiza una segunda aplicación de diésel a las tarimas nuevas para su conservación y se colocan tarimas adicionales como refuerzo estructural. Se concluyen los trabajos de soldadura del barandal y de los soportes correspondientes al segundo nivel del área VIP. Se lleva a cabo la limpieza de los PTR nuevos del barandal mediante la remoción de residuos y preparación de la superficie. Se finaliza la colocación de vallas de protección y de malla ciclónica en las áreas programadas.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 5 de junio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, OSCAR, FRANCISCO, DANIEL HERNANDEZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga y traslado de 0.4 m³ de gravarena, así como de un brocal y una tapa destinados a los trabajos de mantenimiento e infraestructura en el Arroyo del Diezmo. 2. Se realizaron trabajos de preparación para el encofrado de las descargas de drenaje en el Arroyo del Diezmo, con el objetivo de garantizar su adecuada protección estructural y correcto funcionamiento. Para la ejecución de estos trabajos se utilizó 1 1/2 bultos de cemento.		1. Arroyo del Diezmo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 5 de junio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, OSCAR, FRANCISCO, DANIEL HERNANDEZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se realizaron trabajos de colocación de brocal en el registro ubicado en Arroyo del Diezmo. Para la fijación y nivelación del elemento se utilizó 1/2 bulto de cemento, quedando el registro en condiciones adecuadas para su funcionamiento.		2. Arroyo del Diezmo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 8 de junio de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, DANIEL, FRANCISCO, SAMUEL Y FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos de encofrado de las líneas de descarga de drenaje ubicadas en el Arroyo del Diezmo, con el objetivo de proporcionar protección estructural a las tuberías y garantizar su correcto funcionamiento. Durante la jornada se realizó el encofrado de 8 líneas de descarga de drenaje. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron los siguientes materiales: 3 bultos de cemento. 0.40 m³ de grava. 0.20 m³ de arena.		1. Arroyo del Diezmo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 8 de junio de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, DANIEL, RANCISCO, SAMUEL Y FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se continúa con los trabajos de desmontaje en el área de VIP. Durante la jornada se realizó el retiro completo del entarimado correspondiente a un módulo VIP, así como el desmontaje de la malla ciclónica instalada en dicha área. El material retirado fue acarreado y concentrado en la estación designada para su resguardo y posterior disposición.		Campo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 9 de junio de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, MARCOS, MARTIN, OSCAR, ROBERTO, SAMUEL, VICTOR, FELIPE, FRANCISCO Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con el desmontaje y retiro del entarimado ubicado en el área de Segundo VIP. Se inicia el acarreo y traslado de tarimas desde el área de Segundo VIP hacia la bodega de la estación para su resguardo. 2. Se continúa con los trabajos de encofrado en Arroyo del Diezmo, utilizando 2 bultos de cemento y 0.40 m³ de gravarena para la ejecución de las actividades programadas. 3. Se entregaron 5 bultos de cemento a la cuadrilla de drenajes para la ejecución de los trabajos de encofrado de tubo en el área de Arroyo del Diezmo.		1. Campo Llerena 2. Arroyo del Diezmo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 10 de junio de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, FRANCISCO, DANIEL, OSCAR, JUAN MARCOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos de encofrado en las descargas de las líneas de drenaje ubicadas en Arroyo del Diezmo, finalizando los trabajos de encofrado en el arroyo del Diezmo, empleando 2 bultos de cemento y 0.40 m ³ de gravarena para la elaboración del concreto. Adicionalmente, se efectuó el acople y aseguramiento de una tubería que presentaba desprendimiento.		1. Arroyo del Diezmo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 11 de junio de 2026
CUADRILLA	MARCOS, OSCAR, ROBERTO, VICTOR, FRANCISCO Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se concluyeron los trabajos de encofrado en el área del arroyo del diezmo. Posteriormente, se realizó el colado y relleno de los elementos encofrados, utilizando 1 bulto de cemento y 0.20 m³ de gravarena, logrando la conformación y acabado requerido de la sección intervenida.		1. Arroyo del Diezmo	
2. Se iniciaron los trabajos de demolición de concreto deteriorado en la Calle Zacatecas, utilizando rotomartillo para la remoción controlada de las secciones dañadas. La actividad se realizó con el objetivo de retirar el material en mal estado y preparar el área para su posterior rehabilitación y reposición de concreto.		2. Calle Zacatecas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 11 de junio de 2026
CUADRILLA	MARCOS, OSCAR, ROBERTO, VICTOR, FRANCISCO Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se iniciaron trabajos de inspección y diagnóstico de tubería obstruida en las instalaciones de la Guardería Municipal. Se realizó la revisión física de la línea para identificar el punto de taponamiento, verificando las condiciones de operación y el estado general de la tubería, con el fin de determinar las acciones correctivas necesarias para restablecer el flujo adecuado.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 12 de junio de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, DANIEL, OSCAR, MANUEL SEGOVIA		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continuó con la demolición y retiro de concreto dañado mediante el uso de rotomartillo en la calle Zacatecas, colonia Ampliación López Mateos, como parte de los trabajos de rehabilitación de la superficie. 2. Se acudió a la Guardería Municipal para realizar trabajos de destape y limpieza de las líneas de conducción de agua, restableciendo su correcto funcionamiento.		UBICACIÓN 1. Calle Zacatecas 2. Guarderia Municipal	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 15 de junio de 2026
CUADRILLA	MARTIN, ROBERTO, VICTOR MANUEL, DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Demolición de pavimento de concreto: Se continuó con los trabajos de demolición de pavimento de concreto mediante el uso de rotomartillo en el área de intervención ubicada en la Calle Zacatecas, Col. Ampliación López Mateos. Asimismo, se inició el levantamiento y retiro de las secciones de concreto fracturadas utilizando retroexcavadora, facilitando la extracción y limpieza del área de trabajo. De manera simultánea, se mantuvieron las labores de rompimiento de concreto con rotomartillo en los tramos pendientes, con el propósito de avanzar en la preparación de la superficie para las siguientes etapas de		1. Calle Zacatecas, Col. Ampliación López Mateos	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 16 de junio de 2026
CUADRILLA	MARTIN, ROBERTO, VICTOR MANUEL Y DANIEL HDZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevaron a cabo trabajos de demolición de banquetta mediante el uso de rotomartillo, en el cruce de Calle Aréchiga con Calle Nueva. La actividad se realizó con el objetivo de habilitar el área para la construcción de una rampa de acceso. 2. Se continúa con los trabajos de demolición de pavimento en Calle Zacatecas mediante el uso de rotomartillo. Asimismo, se realiza el levantamiento y acopio del escombros generado durante las actividades de demolición, manteniendo el área de trabajo limpia y en condiciones adecuadas para la continuidad de los trabajos. 3. Se dio inicio a los trabajos de pintura y señalización del área destinada para personas con discapacidad en la UBR, aplicando el recubrimiento correspondiente para su correcta identificación y delimitación.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** OSIEL FERNANDEZ**FECHA:**

miércoles, 17 de junio de 2026

CUADRILLA VICTOR MANUEL**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Reporte de recepción de materiales – Ferretería El Ángel Importadora: Se recibió material de ferretería correspondiente a los siguientes conceptos:

5.00 m de manguera anillada.

3 abrazaderas.


1 niple de 2" de diámetro x 4" de longitud.

1 marro de 4 lb. Se continúa pintando cajón para discapacitados en UBR

2. En la UBR se finalizaron los trabajos de rotulación del primer cajón destinado a personas con discapacidad. Asimismo, se avanzó en la ejecución del segundo cajón, alcanzando un progreso aproximado del 95% de su totalidad.

UBICACIÓN

2. UBR

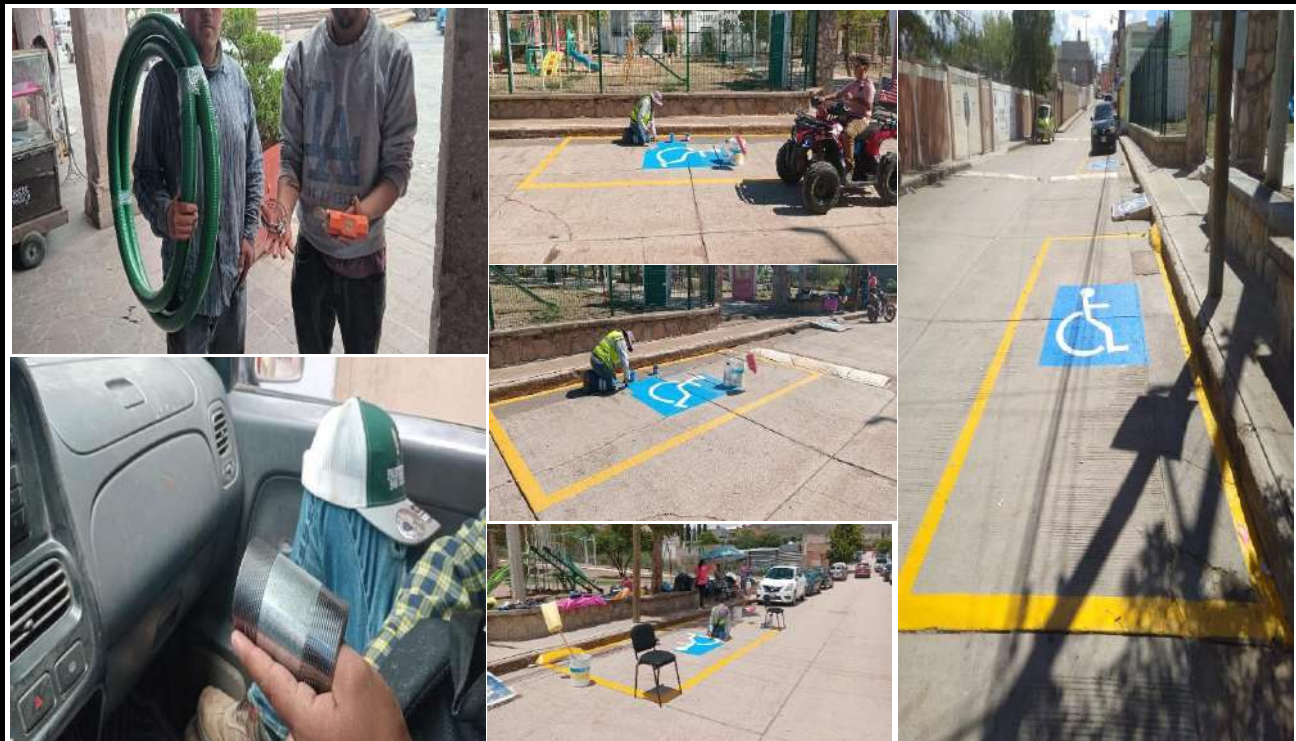REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 18 de junio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, ROBERTO, FRANCISCO Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se concluyeron los trabajos de construcción de la rampa ubicada en la Av. Aréchiga, dejando la superficie terminada y lista para su uso. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 4 bultos de cemento.		Av. Aréchiga	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 19 de junio de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, DANIEL Y FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de afinado y preparación de la superficie para la colocación de escalones. Asimismo, se concluyó la construcción y acabado de los escalones en la Avenida Aréchiga, empleando 1 bulto de cemento y 0.20 m³ de arena para la elaboración del mortero y los acabados correspondientes. De igual manera, se efectuó la recolección y retiro de escombros y piedra sobrante generados durante los trabajos, dejando limpia y libre de materiales la rampa ubicada en la Avenida Aréchiga. 2. Se iniciaron los trabajos de demolición en la Avenida Aréchiga, esquina con calle Progreso, con el fin de preparar el área para la construcción y colocación de una nueva rampa.		Av. Aréchiga 2. Avenida Aréchiga, esquina con calle Progreso	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 22 de junio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, SAMUEL, VICTOR, FRANCISCO Y JUAN DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos de demolición y levantamiento de concreto de banqueteta para la construcción de una rampa en la Av. Aréchiga. Asimismo, se concluyeron los trabajos de afinado y se inició la colocación de piedra para la conformación de la rampa, utilizando 2 bultos de cemento y 0.40 m³ de arena. 2. Se llevó a cabo la limpieza del alcantarillado en las instalaciones de Protección Civil, localizándose la tubería de desagüe para su posterior intervención. 3. Se realizó la limpieza del techo de la Oficina de Migrantes. Adicionalmente, se efectuó el reemplazo del empaque esponjoso del tanque del sanitario ubicado en el área de Gestión Social.		1. Av. Aréchiga. 2. Protección Civil 3. Oficina de Migrantes y Gestion Social	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO

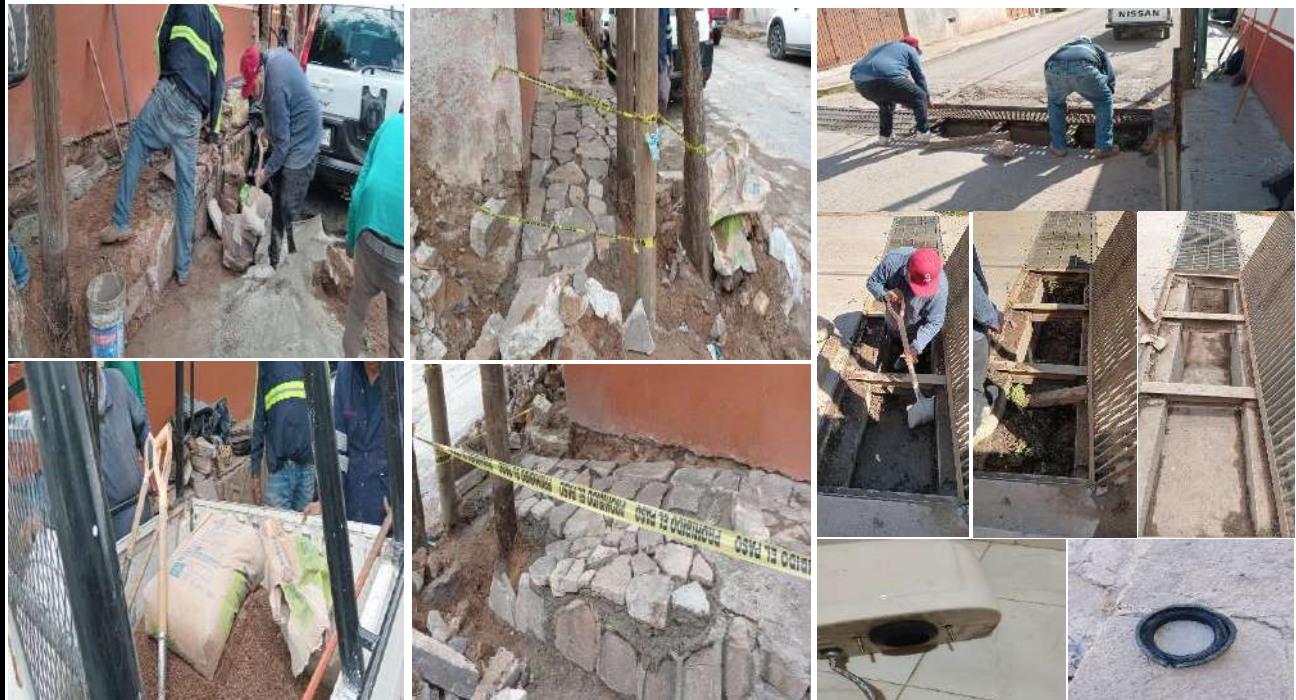

BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS		
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE		
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 23 de junio de 2026		
CUADRILLA	JUAN MARCOS, ROBERTO, VICTOR MANUEL, FRANCISCO Y JUAN DANIE.				
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN			
Se realiza la carga de arena y cemento para la construcción de rampa en Av. Aréchiga, así como suministro de arena para la Casa del Día. Se concluyen los trabajos de rampa en Av. Aréchiga esquina con calle Progreso, utilizando 2 bultos de cemento y 0.40 m³ de arena. Asimismo, se realiza el retiro de 3 viajes de escombros, dejando el área limpia.		Av. Aréchiga			
REPORTE FOTOGRAFICO					
     					

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 24 de junio de 2026

CUADRILLA JOSE TELLEZ, ROBERTO, VICTOR MANUEL, ERNESTO Y FCO JAVIER.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se entregan 3 tramos de tubo de 8" a personal del área de drenajes para su utilización en las actividades correspondientes.
2. Se realiza la carga de arena del arroyo de la comunidad de San Juan de la Tapia para su uso en trabajos programados.
3. Se realizan trabajos de rehabilitación mediante bacheo en la carretera de la comunidad de San Juan de la Tapia, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vialidad y beneficiar a la ciudadanía que transita por dicha vía. Para la ejecución de estos trabajos se utilizan 10 bultos de cemento

UBICACIÓN

2. San Juan de la Tapia

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

10 BULTOS DE CEMENTO

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 25 de junio de 2026

CUADRILLA MARTIN, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO Y JUAN DANIEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se suministra arena y cemento para la construcción de un pozo de visita en el arroyo de San Judas. Asimismo, se lleva a cabo la elevación de 1.00 metro de altura de un registro de drenaje ubicado en dicho arroyo.
2. Se realiza la excavación de 8.00 metros lineales de zanja para la cimentación de un muro de protección. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 2 bultos de cemento, 105 piezas de tabique y 0.40 m³ de arena.

UBICACIÓN

1. Arroyo de San Judas
2. Protección civil

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 26 de junio de 2026

CUADRILLA MARTIN, FRANCISCO, FELIPE

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizó la carga y traslado de arena y cemento para los trabajos en Protección Civil. Y se avanzó con la excavación de la zanja en Protección Civil. Asimismo, se inició la cimentación para la bodega, utilizando 2 bultos de cemento y 0.4 m³ de arena.

UBICACIÓN

1. Protección civil

REPORTE FOTOGRAFICO





BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 24 de junio de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, JOSE TELLEZ, ROBERTO, VICTOR MANUEL, ERNESTO Y FCO JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se recibieron 320 bultos de cemento provenientes de con os Lares, los cuales fueron resguardados en la bodega de almacenamiento para su posterior utilización en las actividades y obras a cargo del departamento.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 1 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL Y NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se recibió material y herramienta de trabajo provenientes de la Ferretería El Ángel, los cuales serán utilizados para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación de la Casa del Día. El suministro recibido consiste en: una cortadora de diamante para vitropiso, dos llanas, 200 separadores, dos rodilleras, dos cintas para medir y cinco discos para corte de vitropiso. Durante la jornada se realizó la colocación de 9.54 m² de piso, empleándose un total de cinco bultos de adhesivo para piso (pega piso) para la ejecución de esta actividad.		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 2 de junio de 2026

CUADRILLA MIGUEL Y NAZARIO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se dio continuidad a los trabajos de colocación de piso en las áreas programadas. Se alcanzó un avance de 16.50 m² de piso colocado, utilizando 9 bultos de adhesivo para piso (pega piso). Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones establecidas.

UBICACIÓN

1. Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 3 de junio de 2026

CUADRILLA MIGUEL Y NAZARIO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se dio continuidad a los trabajos de colocación de piso. En el transcurso de la jornada se realizó la colocación de 14 m² de piso en casa habitación, utilizando un total de 6 bultos de adhesivo (pega piso) para su correcta instalación y nivelación.

UBICACIÓN

1. Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 4 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continúan los trabajos de colocación de piso en la casa del día. Durante la jornada se logró un avance de 10 m ² de colocación de piso, realizando diversos cortes para el ajuste y relleno de las áreas requeridas. Para la ejecución de estos trabajos se utilizaron 4 bultos de adhesivo para piso.		UBICACIÓN 1. Casa del día	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
4 bultos de pega piso			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 5 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se avanzó con la instalación de 8 m² de piso, efectuando los cortes necesarios para el ajuste y terminación del área programada. Durante la actividad se consumieron 4 bultos de pegapiso, quedando concluida la zona intervenida.		1. Casa del día	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 8 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de habilitación de áreas para la colocación de piso, realizando cortes en el firme para la instalación de zoclo en las zonas correspondientes. Asimismo, se efectuó el movimiento, selección y acomodo de piezas de piso para su posterior colocación. Durante la jornada se logró un avance de 8.60 m² de colocación de piso Para la realización de estas actividades se utilizaron 4 bultos de adhesivo para piso (pega piso).		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 9 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO, SERGIO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En la Casa del Día se continúan los trabajos de colocación de piso en las áreas programadas. Durante la jornada se realizaron cortes y ajustes de piezas para la instalación de chaflanes, con el fin de garantizar un adecuado acabado y correcta transición entre superficies. Se realizó la colocación de 17 m² de piso y la ejecución de 3 metros lineales de chaflán. Para el desarrollo de estas actividades se utilizaron 7 bultos de pega piso		1. En la Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 10 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO Y MARTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se efectuó la recepción de 20 bultos de mortero, suministrados por Aceros de Sombrerete, verificando la cantidad entregada y procediendo a su resguardo en las oficinas de Casa del Día, para su posterior utilización en las actividades de obra. 2. Se recibió la primera entrega de tabiques (875), mismos que fueron descargados y resguardados en las instalaciones de Casa del Día.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 10 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO Y MARTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Casa del Día – Avance de actividades Se realizó la colocación de 11 m² de piso. Se ejecutaron 13 m lineales de chaflán. Para la instalación del piso se utilizaron 6 bultos de adhesivo (pega piso). Observación: Los trabajos se llevaron a cabo conforme a lo programado, empleando los materiales requeridos para garantizar la correcta colocación y fijación del recubrimiento.		1. En la Casa del Día	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
6 bultos de pega piso			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 11 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO Y MARTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se ejecutó un avance de 17.00 m ² de colocación de piso cerámico, incluyendo cortes y ajustes necesarios para su correcta instalación en áreas perimetrales y encuentros. Para la colocación se utilizaron 7 bultos de adhesivo para piso (pegapiso), garantizando la adecuada adherencia y nivelación de las piezas		1. En la Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 12 de junio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, MIGUEL, NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continuó con la colocación de piso cerámico, logrando un avance de 3.00 m ² durante la jornada. Asimismo, se concluyó la instalación de piso en dos baños con superficies de 3.50 m ² y 2.12 m ² , realizando los cortes necesarios para su correcta colocación y ajuste. Para estos trabajos se emplearon 8 bultos de adhesivo para piso (pegapiso).		1. En la Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO

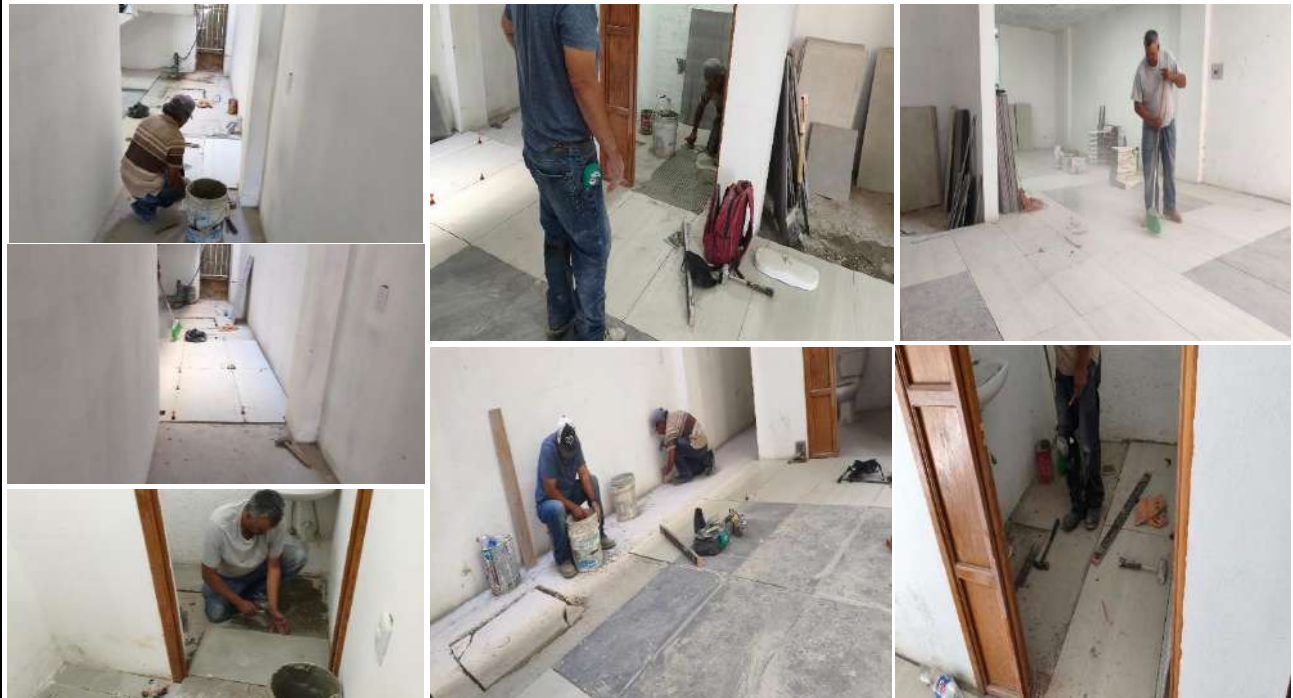

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 15 de junio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO, SAMUEL, JAVIER Y JUAN MARCOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se ejecutó un avance de 10.00 m ² en la colocación de piso. Como parte de los trabajos, se realizaron diversos cortes y ajustes de piezas para su correcta instalación y para la continuidad del acabado en áreas perimetrales. Se colocaron 12.50 metros lineales (ML) de zoclo, efectuando los cortes necesarios para su adecuado ajuste y alineación. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 10 bultos de adhesivo para piso (pega piso)		1. En la Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRETERE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 16 de junio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, NAZARIO Y MIGUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con los trabajos en la Casa del Día, alcanzando un avance de 5.68 m² en la colocación de piso, para lo cual se utilizaron 5 bultos de pegapiso. 2. Se realizó la recolección de 2 piezas de armex con el proveedor Bonilla. Asimismo, se recibieron 125 tabiques correspondientes al material pendiente de entrega.		1. En la Casa del Día	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 16 de junio de 2026

CUADRILLA SAMUEL, NAZARIO Y MIGUEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se dio inicio a los trabajos de levantamiento de muro en la Casa del Día, ejecutándose la colocación de 1.00 m² de pared. Para esta actividad se emplearon tabiques y 1 bulto de mortero como material de unión. Asimismo, se instaló 1 pieza de armex como elemento de refuerzo estructural para la correcta ejecución y estabilidad del muro.

UBICACIÓN

1. En la Casa del Día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 17 de junio de 2026

CUADRILLA SAMUEL, FRANCISCO, MIGUEL, NAZARIO, JUAN MARCOS Y ROBERTO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Durante la jornada se avanzó con la colocación de 9.00 m² de piso, empleando 5 bultos de adhesivo para piso. Asimismo, se construyeron 2.50 m² de muro y se realizó el colado de 1.70 ML de castillo. Para la ejecución de estos trabajos se consumió 1 bulto de mortero.
2. En la calle Aréchiga se realizaron trabajos de nivelación de la rampa y se efectuó el colado de 1.00 m² de concreto. Para estas actividades se consumió 1 bulto de cemento.

UBICACIÓN

1. En la Casa del Día
2. Calle Arechiga

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 18 de junio de 2026
CUADRILLA	MARTIN, SAMUEL, NAZARIO Y MIGUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó un avance de 7.00 m² en la colocación de piso, utilizando 1 bulto de adhesivo para piso (pega piso). Asimismo, se ejecutó la construcción de 1.28 m² de muro, y se llevaron a cabo los trabajos de habilitado y colocación de cimbra para castillo y dala, quedando preparados para su posterior colado. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 2 bultos de mortero y 0.50 m³ de arena.		Casa del día	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 19 de junio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, SAMUEL, MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la colocación de 4.00 m² de piso, utilizando 2 bultos de pega piso. 2. Se ejecutó la construcción de 1.00 m² de muro. 3. Se concluyó la cimbra del castillo y de la dala. 4. Se llevó a cabo el colado de 5.50 metros lineales (ml) de castillo.		Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

lunes, 22 de junio de 2026

CUADRILLA NAZARIO, SAMUEL, MIGUEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizó la colocación de 25.50 metros lineales de zoclo, incluyendo cortes de ajuste de 8 cm según requerimientos de la instalación.
Para esta actividad se utilizaron 2 bultos de adhesivo para piso (pega piso).
Se ejecutó la colocación de 1.00 m² de muro.
Se iniciaron los trabajos de enjarre exterior, aplicando mortero en las áreas programadas.
Materiales utilizados en el enjarre:
1 bulto de mortero.
0.30 m³ de arena.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 23 de junio de 2026

CUADRILLA NAZARIO, SAMUEL, MIGUEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos en la Casa del Día, avanzando en las actividades de enjarre y colocación de boquilla. Durante la jornada se realizó un avance de 35.00 m² en la colocación de boquilla y se efectuaron los cortes necesarios para la elaboración de las piezas del zoclo.

Asimismo, se ejecutó el enjarre en ambos lados de un muro, con un avance de 7.80 m², quedando pendiente la aplicación del acabado con flota.

Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 1 bulto de mortero y 0.30 m³ de arena.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 25 de junio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, SAMUEL, MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos en la Casa del Día. Durante la jornada se realizó un avance de 40.00 m² en la colocación de boquilla, de acuerdo con el programa de obra establecido.		Casa del día	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 26 de junio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, SAMUEL, MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se concluyó la aplicación de boquilla en el piso previamente instalado.		Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO

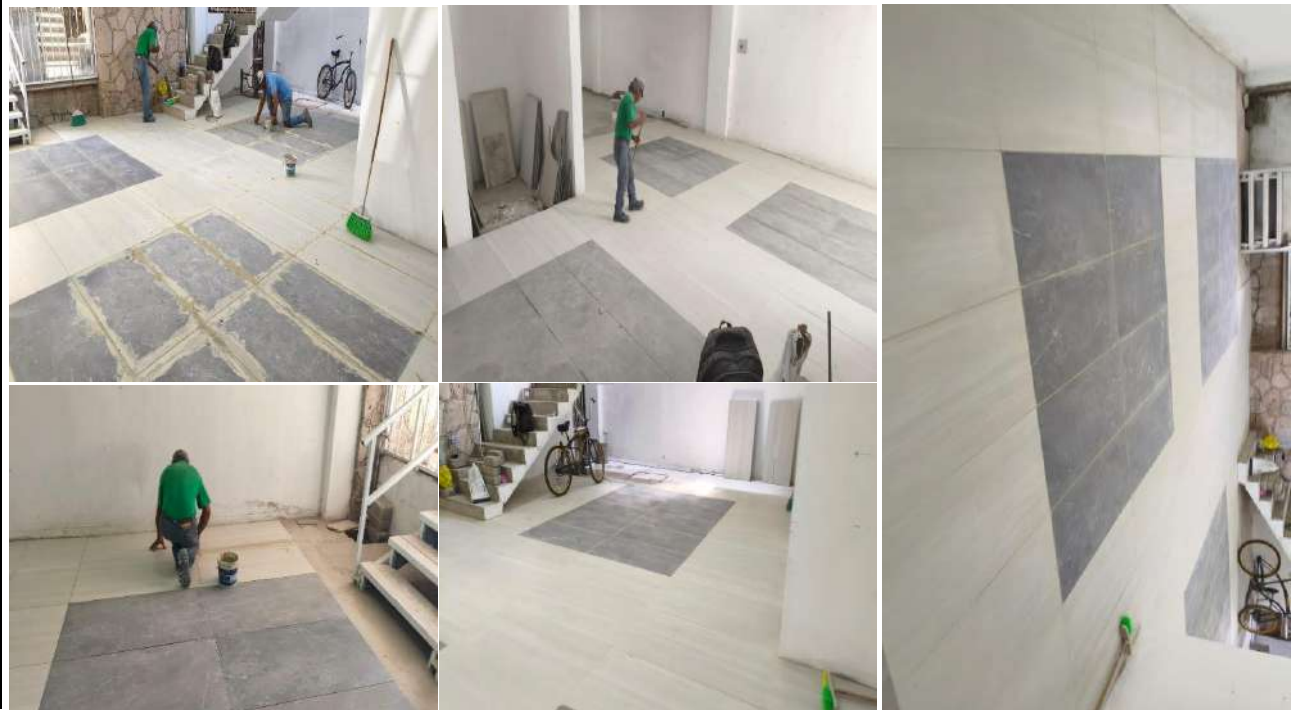

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 29 de junio de 2026
CUADRILLA	DANIEL, MARTIN, MIGUEL, NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se iniciaron los trabajos de rehabilitación del techo. * Se llevó a cabo la demolición del chaflán. * Se realizó el acarreo de arena al área de trabajo. * Se aplicó impermeabilizante CR-66 en las juntas de la losa.		Gimnasio de Box	
2. Se continuó con los trabajos de demolición para la instalación de una puerta. Se realizó la demolición de un tramo de barda para la colocación de la puerta, en un área de 0.60 x 0.60 m y 0.40 x 0.40 m.		2. Casa del Día	
3. Se realizó el acarreo de material para continuar con la construcción del cimiento. Se construyeron 2.25 m³ de cimiento. Se colocaron 3 m² de plantilla en la zapata.		3. Protección Civil	

REPORTE FOTOGRAFICO

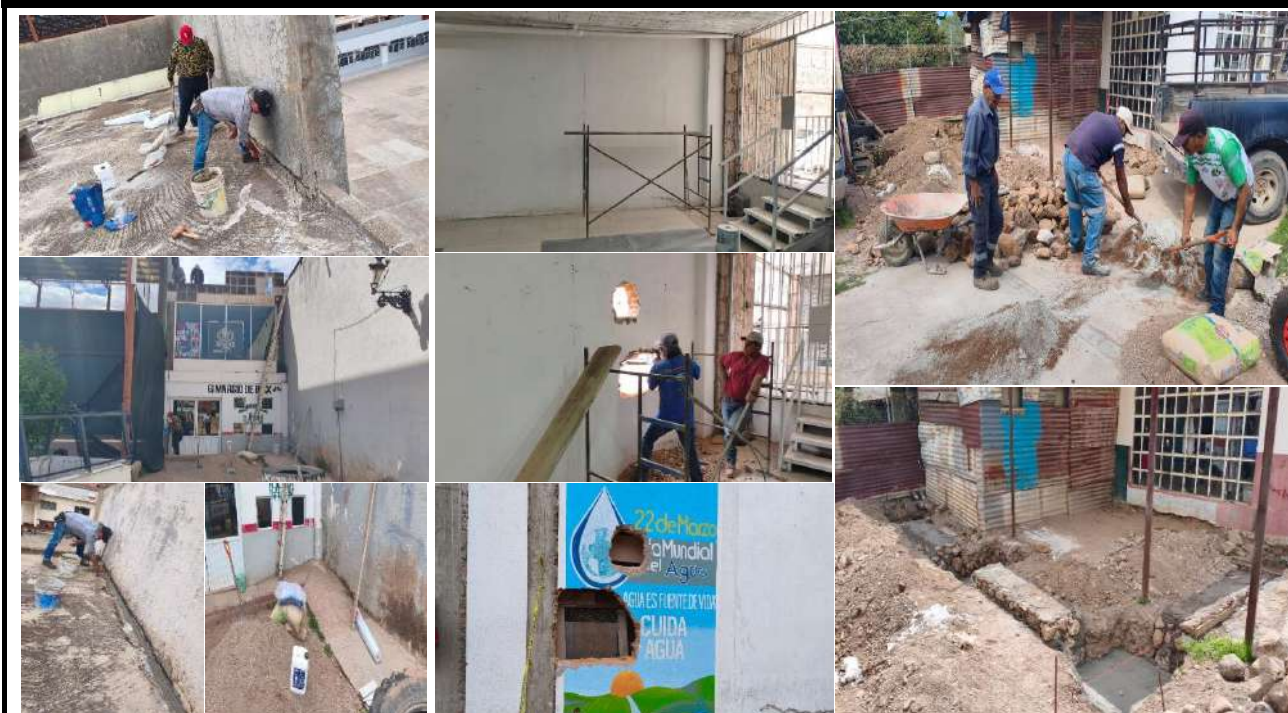

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 30 de junio de 2026

CUADRILLA ROBERTO, DANIEL, MARTIN, MIGUEL Y NAZARIO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se concluyen los trabajos de demolición del área destinada para la instalación de una puerta con dimensiones de 2.20 m de altura $\times$ 1.50 m de ancho, dejando el vano preparado para su colocación.
2. Se ejecuta el entortado en la cubierta (techo) en un área de 5.50 m $\times$ 2.00 m, equivalente a 11.00 m², con un espesor promedio de 3 cm.
Para la ejecución de esta actividad se emplearon 3 bultos de cemento y 0.50 m³ de arena.

UBICACIÓN

1. Casa del Día
2. Gimnasio de Box

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 1 de junio de 2026

CUADRILLA CARLOS, OSCAR Y VICTOR MANUEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúan los trabajos de soldadura en la estructura del Turibús. Como parte de las actividades realizadas, se fabrica la pala frontal tipo tren y se efectúa el corte de lámina lisa para su posterior instalación mediante pijas en la parte trasera de la unidad.

Asimismo, se reconstruyen los largueros que servirán de soporte para la estructura de madera, permitiendo el desmontaje y montaje de las llantas. De igual manera, se colocan refuerzos tipo "pata de gallo" para mejorar la estabilidad y resistencia estructural del conjunto.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 2 de junio de 2026

CUADRILLA ERNESTO, CARLOS, OSCAR.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizó el reemplazo del asiento del Turibús.
2. Se instalaron escuadras metálicas para la fijación de elementos de madera.
3. Se colocó PTR adicional en la estructura de la plataforma (pala) del Turibús para reforzamiento.
4. Se instaló un escalón en la puerta de acceso para mejorar la seguridad y funcionalidad de ingreso.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 5 de junio de 2026

CUADRILLA PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos de acondicionamiento del Toribús; en esta etapa se realiza la aplicación de pintura en la parte exterior de la estructura, con el fin de mejorar su acabado y protección.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO





BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 5 de junio de 2026
CUADRILLA	CARLOS, OSCAR Y VICTOR MANUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se finalizaron los trabajos de fabricación del toribús, incluyendo la instalación de vinil en los laterales, logrando una mejor apariencia visual y una presentación más uniforme de la estructura.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 4 de junio de 2026

CUADRILLA PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos de acondicionamiento del Toribús; en esta etapa se realiza la aplicación de pintura en la parte exterior de la estructura, con el fin de mejorar su acabado y protección.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, ERNESTO Y VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el cierre y reparación de los orificios presentes en la pipa mediante trabajos de soldadura. Se efectuó el pulido de las áreas intervenidas y la resoldadura de las uniones para garantizar una mayor fijación y resistencia estructural. Se instalaron soportes tipo pata de cilindro en los puntos requeridos. Se eliminó el material deteriorado y la pintura desprendida en las zonas con porosidad; posteriormente se aplicó tratamiento correctivo y repintado de las superficies intervenidas. Se realizaron barrenaciones para la colocación de tornillería, permitiendo el desmontaje y mantenimiento de			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 11 de junio de 2026
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, ERNESTO Y VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realiza la recepción de 74 bultos de cemento de 50 kg, suministrados por Los Valles, para su uso en actividades de obra. 2. Se realiza la aplicación de una segunda capa de pintura al cilindro. De igual manera, se lleva a cabo la fabricación de una tapadera para el mismo, con el objetivo de mejorar su protección y conservación. Se realizó la instalación de tubo PVC de 2" de diámetro, colocado en posición vertical como registro de acceso para la colocación de llave de paso. Asimismo, se efectuó el acoplamiento y fijación mediante roscado de una pipa de extensión, destinada a funcionar como punto de acceso para futuras labores de desazolve y mantenimiento de las fosas sanitarias.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 12 de junio de 2026

CUADRILLA CARLOS, VICTOR Y ERNESTO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se suministró e instaló una llave de paso en la pipa, verificando su correcto funcionamiento y ausencia de fugas. Se efectuó el relleno de aceite lubricante de la motobomba hasta alcanzar el nivel recomendado por el fabricante, dejando el equipo en condiciones adecuadas de operación.
2. Se realizó la remoción de pintura correspondiente a las letras de Sombrerete, dejando la superficie limpia para su posterior acondicionamiento o repintado.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO





AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE FOTOGRAFICO

A collage of 12 photographs documenting the construction of a large red and black 'M' sculpture. The images show workers in various settings: a workshop with a red and white vehicle, painting the sculpture, and the final assembly outdoors. The sculpture is a large, stylized 'M' with a red body and black outlines. The construction process involves painting, welding, and assembly. The final image shows the completed sculpture in an outdoor setting.



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 15 de junio de 2026
CUADRILLA	CARLOS, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Recepción de materiales: Se recibieron 7 m ³ de grava y 7 m ³ de arena en la estación de ferrocarril, realizando su descarga y almacenamiento para su posterior utilización en los trabajos programados de bacheo y demás actividades contempladas en el programa de obra.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 16 de junio de 2026

CUADRILLA FELIPE, VICTOR, GUSTAVO Y CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con los trabajos de desmontaje de VIP, realizando el retiro de elementos estructurales.
De manera complementaria, se efectúa la extracción de largueros, llevándose a cabo su desensamble y retiro controlado para su posterior resguardo o disposición según corresponda. Se realizó la carga y traslado de materiales metálicos a la bodega de la estación para su resguardo y almacenamiento.

2. Se continuó con los trabajos de despintado de las letras del sombrero, mediante la remoción de pintura deteriorada para su posterior preparación y acabado.

Se recibió material para las actividades de mantenimiento consistente en 4 litros de removedor automotriz para pintura, 1 litro de removedor de pintura para madera, así como discos de lija azul,

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 18 de junio de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, VICTOR, CARLOS Y FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con la aplicación de removedor automotriz sobre las letras del sombrero, con el fin de realizar el despintado y retiro de la pintura existente. Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación y remodelación de las mismas, garantizando una adecuada preparación de la superficie para los acabados finales. 2. Se recibió un candado por parte de Osiel			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 19 de junio de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos de despintado de letras en la estación de ferrocarril.
Se realiza la fabricación de mamparas con dimensiones de 3.00 m x 2.00 m.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 22 de junio de 2026

CUADRILLA VICTOR, FELIPE Y CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se iniciaron los trabajos de lijado en las letras monumentales, con la finalidad de retirar la pintura existente y preparar la superficie para su posterior rehabilitación.
2. Se recibieron 4 litros de removedor de pintura provenientes de la ferretería El Ángel Importadora, material que será utilizado para continuar con los trabajos de despintado de las letras de Sombrerete.
3. Se realizaron maniobras de desagüe en la cisterna de drenaje. Inicialmente se intentó extraer el líquido mediante una motobomba, debido a que la bomba eléctrica no lograba succionar a través del tubo de acceso existente. Como resultado de las maniobras, se logró extraer

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 23 de junio de 2026
CUADRILLA	VICTOR, FELIPE, BRAYAN Y CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos con pipa en la localidad de Barajas, efectuando la extracción de 5 pipas de agua, las cuales fueron descargadas en el arroyo.		Barajas	
Asimismo, se concluyó el despintado de las letras con la leyenda "Sombrerete".		Estación de Ferrocarril	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 24 de junio de 2026

CUADRILLA VICTOR, FELIPE, BRAYAN Y CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se lleva a cabo el acomodo de tarimas al interior de la bodega, con el propósito de facilitar la organización del material y proceder posteriormente a la extracción de las nuevas tarimas.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 25 de junio de 2026
CUADRILLA	VICTOR, FELIPE, BRAYAN Y CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realiza el lijado de la letra "R" de la palabra "Sombrerete" con el propósito de preparar la superficie para la aplicación de fondo. Posteriormente, se efectúa la limpieza con thinner y se procede a la aplicación de fondo. Se realiza el lijado de 3 letras y media con lija número 100, con el propósito de preparar la superficie para la aplicación de fondo.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 26 de junio de 2026
CUADRILLA	CARLOS, VICTOR Y ERENESTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Material recibido: 6 bisagras de libro. 20 kg de soldadura 60/13. 50 discos de corte. 2 tramos de perfil P-400 y 3 tramos de solera. Trabajos realizados: Se llevó a cabo la rehabilitación de la rejilla de desagüe ubicada en Av. Hidalgo, debido a que presentaba desprendimiento por falta de soldadura. Se retiró la parrilla de la rejilla para realizar barrenaciones y colocar anclas por la parte interior. Se soldaron las anclas desde el interior al ángulo de la rejilla. Se colocó varilla de 5/8" para reforzar y amacizar la estructura. Se instalaron las anclas en las varillas previamente barrenadas, garantizando una adecuada fijación y reforzamiento de la rejilla.			

REPORTE FOTOGRAFICO

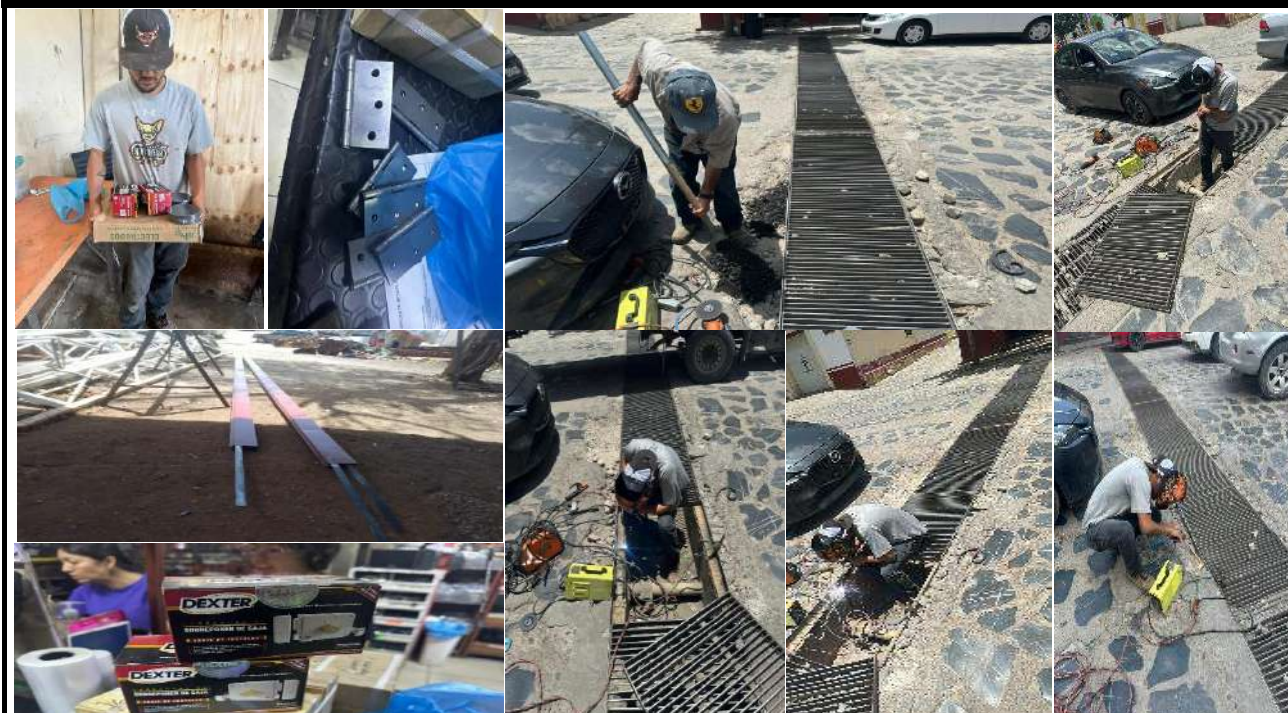



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 29 de junio de 2026
CUADRILLA	VICTOR, FELIPE, BRAYAN Y CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo la fabricación de la estructura para las puertas que serán instaladas en las oficinas de la Casa del Día. 2. Se continuó con el avance en la elaboración de las letras; únicamente queda pendiente el lijado de una letra y media para concluir esta etapa del trabajo.		1. Casa del día 2. Estación de Ferrocarril	

REPORTE FOTOGRAFICO

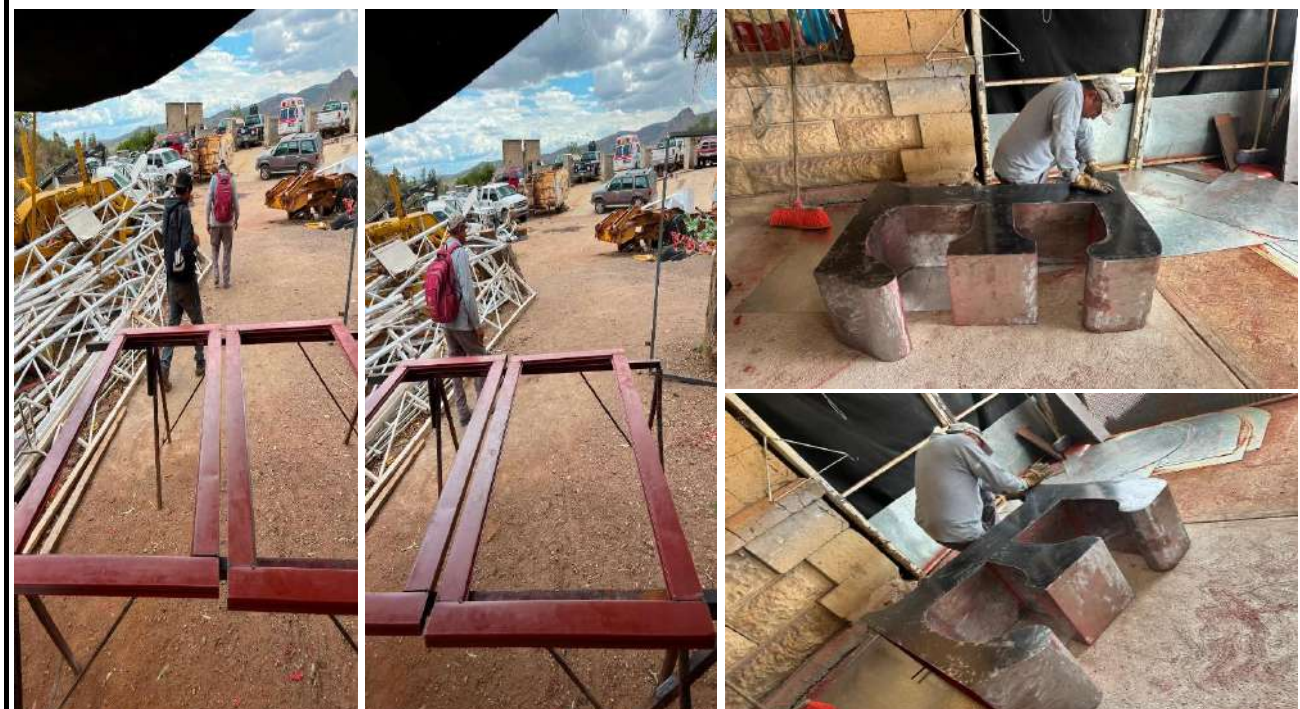

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 30 de junio de 2026
CUADRILLA	VICTOR, FELIPE, BRAYAN Y CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se instalaron las bisagras en el marco de la puerta, verificando su correcta alineación y funcionamiento para garantizar una apertura y cierre adecuados. Se colocó la chapa en la puerta, realizando los ajustes necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y seguridad. Se instalaron soleras metálicas en el marco de la puerta como elemento de refuerzo y tope, con el propósito de evitar la apertura no deseada de la puerta y mejorar su estabilidad. Para la ejecución de estos trabajos se utilizaron 8.35 metros lineales de solera.			
Bisagras, soleras, chapa.			

REPORTE FOTOGRAFICO

