

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL MES DE JULIO

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 1 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se dio continuidad a la fabricación de tapas y brocales para pozos de visita. Durante esta actividad se utilizó 1 bulto de cemento para la elaboración de los elementos. 2. Se acudió a la comunidad de El Saucillo para realizar la revisión de una línea de drenaje. Como parte de los trabajos, se instaló 1 tramo de tubería de 6 pulgadas de diámetro con el propósito de mejorar el flujo de las aguas residuales. Posteriormente, se procedió al recubrimiento y anclaje de la tubería con concreto, a fin de evitar su desplazamiento por la corriente del arroyo y garantizar la estabilidad de la instalación.		1. Estacion de Ferrocarril 2. El Saucillo	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 2 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a la comunidad de Bañuelos Nuevo para atender un reporte de drenaje obstruido. Durante la inspección de la línea se detectó la acumulación de una gran cantidad de fibras, las cuales ocasionaban el taponamiento. Se realizaron las labores de limpieza y desazolve correspondientes, logrando restablecer el flujo normal de la red de drenaje. 2. Asimismo, se atendió un reporte en la colonia Hidalgo, donde se llevó a cabo la inspección de la línea de drenaje sanitario. Durante la revisión se verificaron 89 registros, detectándose que la línea se encuentra completamente obstruida, por lo que será necesario programar trabajos de desazolve y mantenimiento para restablecer su		1. Bañuelos Nuevo 2. Colonia Hidalgo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 3 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se iniciaron los trabajos de reparación de tubería en la calle Miguel Hidalgo. Para la ejecución de esta actividad fue necesario realizar la demolición del concreto existente mediante el uso de cortadora y rotomartillo, con la finalidad de liberar el área de trabajo y permitir el acceso a la zona afectada. Asimismo, se solicitó el apoyo de la retroexcavadora para realizar las excavaciones correspondientes y localizar la línea de drenaje, facilitando así la identificación y reparación de la tubería.		1. Calle Miguel Hidalgo col el sombreretillo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 6 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se da continuidad a los trabajos de reparación de tubería en la calle Miguel Hidalgo, realizando las actividades necesarias para el seguimiento de la obra y la atención de la línea de drenaje previamente localizada, con el objetivo de restablecer su correcto funcionamiento.		UBICACIÓN 1. Calle del Sombreretillo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1 			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 7 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Durante el tercer día de trabajos en la calle Miguel Hidalgo, se continuó con las labores de reparación de la tubería, utilizando apoyo de rotomartillo para realizar los trabajos de demolición y liberación del área necesaria para continuar con la intervención de la línea de drenaje.		1. Calle del Sombreretillo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 8 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Calle Miguel Hidalgo, Col. El Sombreretillo – 4.º Día de Trabajo		1. Calle Miguel Hidalgo, colonia El Sombreretillo.	
Se dio continuidad, por cuarto día consecutivo, a los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario. Durante la jornada se realizaron actividades de demolición del concreto existente en las áreas programadas, con el fin de liberar el tramo donde se efectuará la sustitución de la tubería.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

jueves, 9 de julio de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continuó con los trabajos correspondientes al quinto día consecutivo de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario sobre la calle Miguel Hidalgo, colonia El Sombreretillo. Durante la jornada se llevaron a cabo las actividades de instalación de dos tramos de tubería de 12 pulgadas de diámetro, siguiendo el alineamiento, nivelación y especificaciones establecidas. Como parte de las actividades complementarias, se utilizaron dos bultos de cemento para la elaboración del encofrado de la tubería, con el propósito de proporcionar soporte, estabilidad y protección a las uniones y a los tramos instalados, asegurando su correcta fijación y reduciendo el riesgo de

UBICACIÓN

1. Calle Miguel Hidalgo, colonia El Sombreretillo.

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 10 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la liberación de la línea general de drenaje en la calle Bracho, frente a la Tortillería Flores, restableciendo el flujo normal del sistema.		1. Calle Bracho	
2. Se efectuó un sondeo en la línea de drenaje, logrando restablecer temporalmente el flujo del agua; sin embargo, durante la inspección se detectó la necesidad de sustituir un tramo de tubería debido a las condiciones en que se encuentra.		2. Calle palma Lomas de el consuelo	
3. Se realizó la liberación de la línea general de drenaje en la comunidad de San Antonio del Cerrito. Asimismo, se determinó la necesidad de construir un registro para facilitar el acceso y mantenimiento de la red.		3. San Antonio del Cerrito	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 13 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la liberación de una línea de drenaje que se encontraba obstruida, restableciendo su funcionamiento. Asimismo, fue necesaria la colocación y fijación de la tapa del pozo de visita con mortero de cemento, a fin de evitar su desplazamiento o levantamiento y garantizar la seguridad de la infraestructura. 2. Se acudió a la comunidad de El Saucillo para atender un reporte por obstrucción en la red de drenaje sanitario. Durante la inspección y los trabajos realizados no fue posible liberar la obstrucción, por lo que se determinó la necesidad de efectuar un sondeo para localizar el punto de taponamiento y proceder con su		1. Frente a tortillería las flores 2. El Saucillo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
   			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 14 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a la comunidad de Bañuelos Nuevo para atender un reporte realizado por el delegado de la localidad. Durante la visita se efectuó el sondeo de la línea de drenaje para liberar la obstrucción, detectándose que esta se encuentra saturada por acumulación de azolve, lo que provoca que el flujo del agua sea muy lento. 2. Se realizó una inspección de la línea general de drenaje en la colonia González Ortega, en la parte posterior de las bodegas de Conasupo. Se constató que la línea presenta una importante acumulación de azolve, ocasionando que, durante las lluvias, el drenaje se desborde y afecte las viviendas cercanas.		1. Bañuelos Nuevo 2. Colonia Gonzalez Ortega	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			
			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 15 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se atendió un reporte en la calle José María Morelos, colonia La Blanca, donde se realizó el desazolve de una línea de drenaje que se encontraba saturada por acumulación de escombro. Asimismo, se atendió un reporte en CONAFE, efectuando la limpieza de una línea de drenaje obstruida por raíces. De igual forma, se brindó atención a un reporte en la comunidad de San Francisco de Órganos, realizando las acciones correspondientes para restablecer el funcionamiento del sistema.		1. Calle José María Morelos 2. CONAFE 3. San Francisco de Organos	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 16 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de liberación de la línea de drenaje a un costado del Banco del Bienestar y en el área contigua a Liconsa. Asimismo, se instaló 1 metro lineal de tubería de 4 pulgadas. Como actividad pendiente, queda el encofrado del tramo donde se colocó la tubería para concluir los trabajos		1. Sombrerete	
2. Se acudió a la comunidad de Estación Frío para atender un reporte por obstrucción en la red de drenaje sanitario. Durante la inspección se detectó que la línea se encontraba severamente azolvada, por lo que se realizaron trabajos de desazolve mediante la introducción de varillas a través de un registro alterno, con el fin de restablecer el flujo adecuado del drenaje.		2. Estación Frío	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 17 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se atendió un reporte de drenaje en la comunidad de Ex Hacienda Zaragoza. Se efectuaron los sondeos necesarios para desazolver la línea, restableciendo su funcionamiento y dejándola operando correctamente.		Ex Hacienda Zaragoza	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 20 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó sondeo y desazolve de coladera pluvial, retirando material acumulado y basura que obstruía la rejilla. Se dejó funcionando y con flujo libre 2. Drenaje tapado frente a DICONSA: Se acudió a revisar taponamiento reportado. Al realizar excavación, se detectó que la tubería de 6" se encuentra colapsada / aplastada, lo que obstruye el flujo. Para su rehabilitación se requiere el suministro de 3.00 mts. de tubo de 6" y 1 cople de 6". Contando con el material, el tramo queda terminado el día de hoy.		1. Frente a Gimnasio 2. frente a DICONSA	

REPORTE FOTOGRAFICO

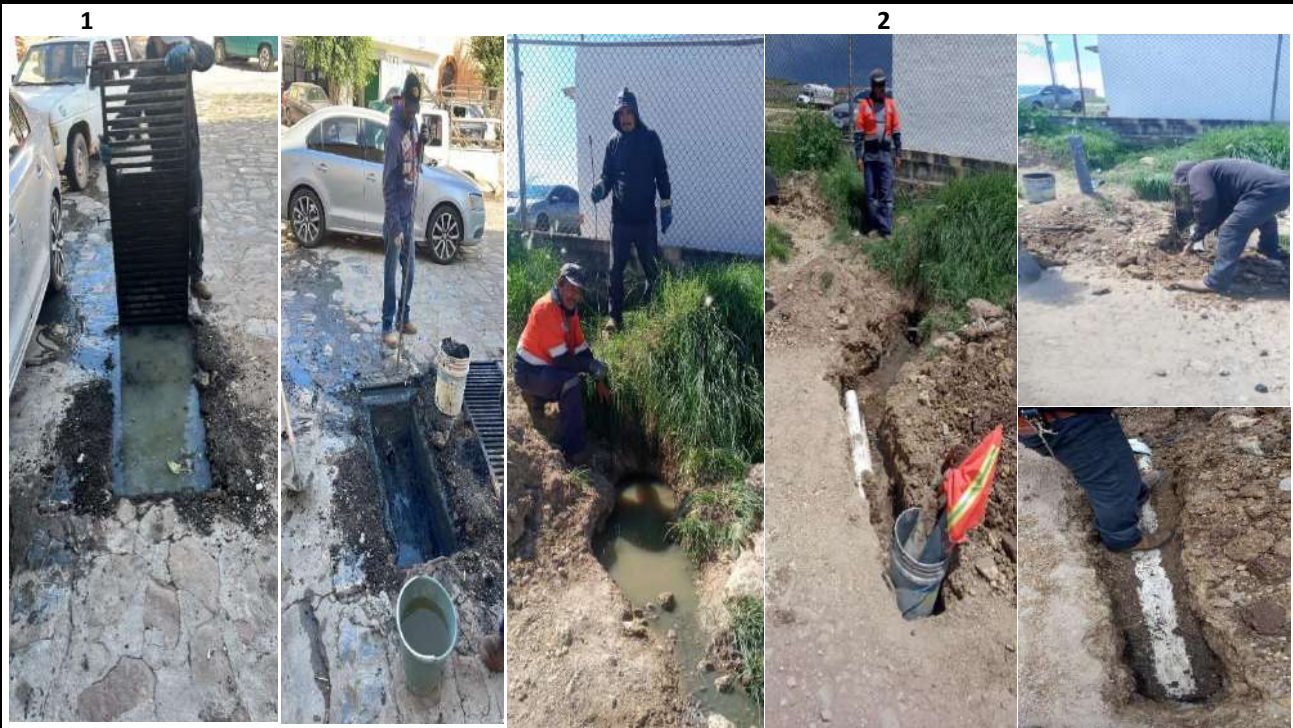

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 21 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendió un reporte de drenaje, realizando las labores necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de la línea. 2. Se realizó la liberación de la línea de drenaje ubicada frente al CONAFE, eliminando la obstrucción existente y restableciendo su correcto funcionamiento. 3. Durante la inspección se detectó que la tubería de drenaje presenta una saturación considerable por raíces, por lo que se recomienda su sustitución para restablecer el funcionamiento adecuado del sistema y prevenir futuras obstrucciones. 4. La conexión de el sombrero frente a la quinta la rosita está funcionando bien		1. Calle Morelos Colonia La Blanca 2. Aún lado de el conafe 3. Aún lado de EST 4. Frente a quinta Rosita	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 22 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a la comunidad de El Saúz del Terrero para realizar una inspección de la línea de drenaje. Durante la revisión se detectó que un tramo de tubería fue arrastrado por la corriente de agua, por lo que será necesaria la reposición e instalación de un tubo nuevo para restablecer el funcionamiento de la red. Asimismo, se determinó la necesidad de construir un encofrado de protección a base de piedra y cemento, con el fin de reforzar la instalación y proteger la tubería contra futuras afectaciones ocasionadas por el flujo de agua. 2. Se realizaron trabajos de liberación de la línea de drenaje en la comunidad de Plan de Guadalupe, retirando la obstrucción existente para restablecer el flujo adecuado de las aguas residuales y garantizar el correcto funcionamiento de la		1. El Saúz del Terrero 2. Plan de Guadalupe	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLegó la transformación! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 23 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendió reporte de drenaje tapado en Calle Himno Nacional. Se realizaron trabajos de sondeo y desazolve, logrando liberar la línea y restablecer el flujo con normalidad. Queda operando sin novedad. 2. Se atendió reporte de drenaje en Calle Díaz Ordaz. Se realizaron trabajos de sondeo, sin lograr su liberación por presentar taponamiento sólido / azolve compactado. Queda pendiente de segunda intervención		1. Calle Himno Nacional 2. Calle Díaz Ordaz	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 27 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendió reporte prioritario por drenaje tapado en la comunidad de San Juan de la Tapia. La línea presentaba taponamiento total, generando derrame de aguas residuales sobre la vía pública. Se realizaron trabajos de sondeo y desazolve de la red, logrando liberar la tubería y restablecer el flujo normal.		1. San Juan de la Tapia	
2. Se atendió reporte de drenaje en Calle Cristo Rey, logrando liberar la línea mediante trabajos de sondeo. La tubería quedó trabajando con normalidad y flujo libre.		2. Calle cristo Rey	
3. Se realizó revisión de línea de drenaje en el sector Arroyo del Peñasco. Se constató que la tubería se encuentra trabajando con normalidad y con flujo continuo. Los encharcamientos observados corresponden a escurrimientos naturales del arroyo.		3. Arroyo de el peñasco	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 28 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se verificó el funcionamiento de la línea de drenaje frente a las instalaciones de CONAFE, observando que la tubería se encuentra trabajando con normalidad, con flujo continuo y sin signos de taponamiento. Queda operando sin novedad		1. CONAFE	
2. Se llevó a cabo la instalación de 1 tubo de 8" en el cruce del arroyo en la comunidad de El Sauz del Terrero, con la finalidad de restablecer el paso del flujo y evitar la ruptura de la línea por el arrastre del arroyo. El trabajo quedó concluido y la línea operando con normalidad.		2. El sauz	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 29 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atiende reporte por obstruccion en la linea general de drenaje en la comunidada de charco blanco. Asimismo se introducen barillas para la desobstruccion de la linea, quedando completamente liberado		1. Avenida profesores	
2. Se atendio reporte por tuberia de cemento quebrada. Se realizo inspeccion y asi mismo se efectuo la reparacion correspondiente, quedando el tramo en condiciones de funcionamiento		2. Charco Blanco	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 1 de julio de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, MIGUEL, NAZARIO Y MARTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se iniciaron los trabajos de demolición en las áreas destinadas para la colocación de ventanas, retirando cuidadosamente el material existente para generar los baños conforme a las dimensiones requeridas. Posteriormente, se realizó la recolección y limpieza del escombro generado, dejando las áreas completamente preparadas y listas para la instalación de las ventanas. 2. Se continuó con el acarreo y suministro de materiales hacia la zona de trabajo para dar seguimiento a las actividades de colado programadas. Se ejecutó el entortado de la losa de techo en un área de 2.50 m x 2.00 m, equivalente a 5.00 m², aplicando un espesor promedio de 3 cm, con el fin de nivelar la superficie y proporcionar la pendiente requerida.		1. Casa del Día 2. Gimnasio de Box	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 2 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO Y MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se ejecutó el trabajo de entortado en la losa de techo en una superficie total de 15.15 m², aplicando un espesor uniforme de 3 cm. Previamente se realizó la limpieza del área para garantizar una adecuada adherencia del mortero. Para la elaboración de la mezcla se utilizaron 3 bultos de cemento y 0.5 m³ de arena. 2. Se llevaron a cabo trabajos de modificación e instalación de una puerta, realizando los ajustes necesarios en el vano para asegurar su correcta colocación, nivelación y funcionamiento. Como parte del mantenimiento preventivo del equipo utilizado en la obra, se realizó el engrasado del rotomartillo, con el fin de mantener su correcto		1. Gimnasio de Box 2. Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO

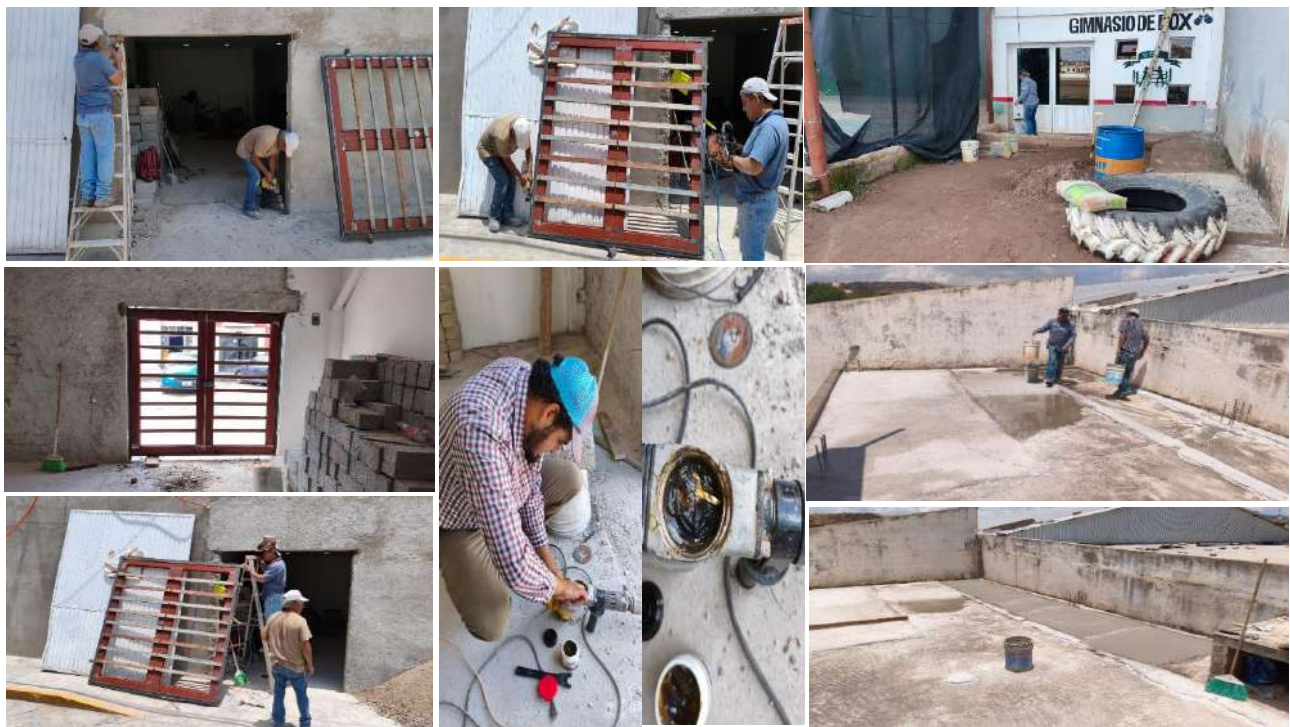

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

viernes, 3 de julio de 2026

CUADRILLA NAZARIO Y MIGUEL**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se llevaron a cabo trabajos de demolición consistentes en la apertura completa de un vano de ventana en el baño y la demolición del 50 % de un segundo vano, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 6 de julio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO, JOSE ANGEL Y SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con la construcción del muro para la bodega, ejecutando la colocación de 2.16 m ² de block pesado. Para la elaboración del muro se emplearon 1 bulto de mortero y 0.10 m ³ de arena. 2. Se concluye el desmantelamiento del barandal existente y se realiza el traslado del tabique al frente de trabajo. Posteriormente, se lleva a cabo la colocación de 1.68 m ² de tabique, utilizando 1 bulto de mortero y 0.20 m ³ de arena para su instalación.		1. Protección Civil 2. Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 7 de julio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO, JOSE ANGEL Y SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inician los trabajos de colocación de piso en el salón, realizando el trazo y escuadrado del área para garantizar la correcta alineación y nivelación del acabado. Asimismo, se efectúa el traslado de los materiales necesarios al frente de trabajo para dar continuidad a la ejecución de la obra. Logrando un avance de 12.50 m². 2. Se realizó la construcción del muro para la bodega, colocando un total de 32.40 m² de block pesado. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 2 bultos de mortero y 0.40 m³ de arena.		1. Tecnica 60 2. Protección Civil	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 8 de julio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, NAZARIO, JOSE ANGEL Y SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la colocación de 9.30 m² de piso. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 4 bultos de pegapiso. 2. Se realizó la colocación de 2.50 m² de block pesado y el colado de 3.00 m lineales de castillo. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 0.50 bultos de cemento, 0.50 bultos de mortero y 0.30 m³ de arena.		1. Tecnica 60 2. Protección Civil	
REPORTE FOTOGRAFICO			
       			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 9 de julio de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se dio continuidad a los trabajos de construcción de bardas perimetrales, avanzando conforme al programa de obra establecido. Asimismo, se prepararon los castillos para su posterior colocación y colado, con el fin de garantizar la continuidad de los trabajos de mampostería y el correcto desarrollo de la estructura de las bardas. 2. Durante la jornada se llevó a cabo el colado de una superficie de 49.68 m², utilizando 8.00 m³ de concreto mezclado con trompo, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Previamente se verificaron las condiciones de la base, niveles y cimbra para garantizar una correcta colocación del concreto. Posteriormente, el concreto fue distribuido, nivelado y acabado, procurando una compactación uniforme para asegurar la calidad del elemento colado.		1. Protección civil 2. Calle Zacatecas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 9 de julio de 2026

CUADRILLA SAMUEL, JOSE ANGEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la construcción de muro para bodega en el área de Protección Civil, mediante la colocación de 2.40 m² de block pesado y el colado de 3.00 metros lineales de castillo, utilizando los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.

UBICACIÓN

Proteccion civil

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 10 de julio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL Y JOSE ANGEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo la instalación de malla electrosoldada como parte de los trabajos de preparación para el colado de firme en la calle Zacatecas. 2. Se continuó con los trabajos de construcción de la bodega de Protección Civil, realizando la colocación de 3.00 m² de block como parte del avance de la obra. Para la ejecución de esta actividad se utilizó 1 bulto de mortero para el asentado del block.		1. Calle Zacatecas 2. Proteccion civil	
REPORTE FOTOGRAFICO			
    			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	sábado, 11 de julio de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, SAMUEL, TELLEZ, NAZARIO, ERNESTO, JAVIER Y VALENTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el colado de concreto hidráulico en la calle Zacatecas, utilizando un camión revolvedor (trompo) con capacidad de 8 m³. Durante la jornada se colaron 48.10 m² de superficie de concreto. Como parte del proceso de acabado, la superficie se dejó con terminado rallado para proporcionar mayor adherencia y seguridad. Finalmente, el concreto fue cubierto con hule para su protección y favorecer un adecuado proceso de curado.		1. calle Zacatecas	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 13 de julio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL Y JOSE ANGEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se da continuidad a los trabajos de construcción en el área de Protección Civil, realizando la colocación y preparación de los castillos para su colado. Asimismo, se lleva a cabo el armado de la cadena de cerramiento y el cimbrado de la misma, dejándola lista para la siguiente etapa del proceso constructivo. 2. Se continúa con los trabajos de colocación de piso, ejecutándose un total de 14.00 m² de piso cerámico. Para esta actividad se emplearon 10 bultos de adhesivo (pegapiso).		1. Protección civil 2. EST No. 60	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 14 de julio de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos de colocación de piso en la EST60, avanzando conforme a la programación establecida y siguiendo las especificaciones del proyecto para asegurar la correcta instalación y calidad de los acabados.		1. Tecnica 60	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 15 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, MIGUEL, JUAN MARCOS, SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos de rehabilitación en la obra. Durante la jornada se realizó el traslado de bloque pesado al área de trabajo para su posterior colocación. Se ejecutó la colocación de 3.00 m² de muro de tabique y el colado de un castillo lateral, conforme a las actividades programadas. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de la puerta de acceso. 2. Se realizó la excavación de un cimiento lateral y posteriormente se colocó plantilla de concreto en una longitud de 5.00 m lineales (ml), como preparación para los trabajos de cimentación.		1. Casa del Día 2. Protección civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 15 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, MIGUEL, JUAN MARCOS, SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la colocación de 3.00 m ² de piso y 6.00 metros lineales de zoclo, conforme a lo programado, empleando 2 bultos de pegapiso para la instalación de los materiales.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 16 de julio de 2026

CUADRILLA NAZARIO, SAMUEL, JOSE ANGEL, MIGUEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Durante la jornada se realizó la colocación de 3.00 m² de muro de tabique y el colado de un castillo lateral. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de dos ventanas en los baños, se continuó con la apertura del vano para una tercera ventana y se efectuó el enjarre de los detalles y acabados alrededor de las ventanas, 0.50 m³ de arena.
2. Durante la jornada se ejecutó la construcción de 1.00 m³ de cimiento de piedra bola y se realizó el colado de la dala de desplante, de acuerdo con lo establecido en el proyecto. Para la ejecución de estos trabajos se utilizó 1 bulto de cemento y 0.20 m³ de arena.

UBICACIÓN

1. Casa del día

2. Protección civil

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 17 de julio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE ANGEL, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la demolición de una ventana existente. Asimismo, se llevaron a cabo los trabajos de perfilado y preparación de los vanos de puertas y ventanas para su posterior acabado. Finalmente, se concluyó la construcción de la barda divisoria.		1. Casa del día	
2. Se realizó el colado de la dala de desplante con una longitud de 4.35 m. Para la elaboración del concreto se utilizaron los siguientes materiales: 2 bultos de cemento. 0.20 m³ de arena.		2. Proteccion civil	
3. Se realizó el emboquillado del piso, alcanzando un avance del 50 % del área programada.		3. EST #60	

REPORTE FOTOGRAFICO

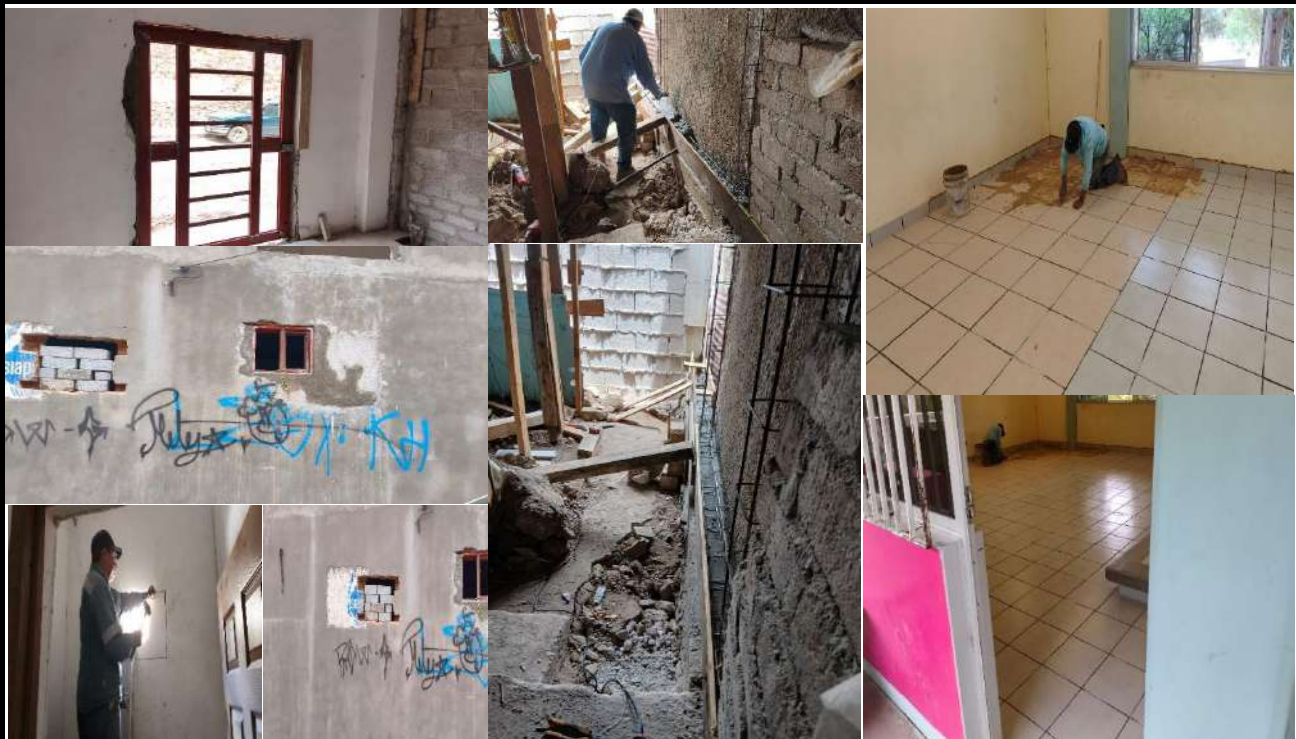

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 17 de julio de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE ANGEL, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se recibieron 25 piezas de piso cerámico de 1.20 × 0.60 m, las cuales serán destinadas para su instalación en la Casa del Día.		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 20 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, JAVIER, OSCAR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el repellado de dos bardas previamente construidas, con un avance de 12 m ² en la primera barda y 6 m ² en la segunda, para un total de 18 m ² de repellado. Asimismo, se inició el acabado con flota en una de las bardas. Se efectuó la limpieza y retiro de escombros generado durante los trabajos. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 3 bultos de mortero.		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 20 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, JAVIER, OSCAR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se recibió el suministro de 40 bultos de pegapiso y 6 m ² de piso cerámico, materiales que serán destinados a la ejecución de los trabajos programados en la obra de la Casa del Día.		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 21 de julio de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, JAVIER, OSCAR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades: Se ejecutó el flotado de enjarre en una superficie total de 14.28 m², dejando el acabado listo para las siguientes etapas del proceso. Se llevó a cabo la colocación de piso en un área de 11.00 m². Se realizó la aplicación de yeso en una superficie de 6.00 m².		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

miércoles, 22 de julio de 2026

CUADRILLA NAZARIO, JAVIER, OSCAR.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades:

Se llevó a cabo el floteado del enjarre en muros, dando acabado a una superficie total de 14 m², dejando el aplanado listo para las etapas posteriores de acabado.

Se realizó la colocación de piso en un área de 17 m², verificando la correcta alineación, nivelación y distribución de las piezas.

Se efectuó la colocación de yeso en una superficie de 6 m², obteniendo un acabado uniforme para la preparación de los trabajos finales.

UBICACIÓN

1. Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 23 de abril de 2026

CUADRILLA JAVIER, FGRANCISCO, NAZARIO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizó la colocación de 21.00 m² de piso cerámico, verificando su correcta nivelación y alineación.
2. Se efectuó la aplicación de 6.00 m² de yeso en muros interiores para su acabado.
3. Se llevó a cabo el retiro y traslado del tabique sobrante hacia la estación de almacenamiento, dejando el área de trabajo limpia y ordenada.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

viernes, 24 de julio de 2026

CUADRILLA**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó la colocación de 19 m² de piso, concluyendo al 100% los trabajos de instalación de piso en el área correspondiente.

Asimismo, se ejecutó la colocación de 14 m² de yeso en muros, de acuerdo con el avance programado.

Finalmente, se llevó a cabo el colado de la tapa del aljibe, dejando este elemento estructural concluido para su proceso de fraguado.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 27 de julio de 2026
CUADRILLA	SAMTIAGO, VICTOR, MARTIN, TELLEZ, FRANCISCO JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
En la Casa del Día se realizó la colocación de 36 metros lineales de zoclo y la aplicación de 14 m² de yeso. Asimismo, se efectuó el relleno en el área del elevador para dejarla preparada para el colado, se colocó y niveló la tapa de la cisterna, y se aplicó la boquilla en la totalidad del piso previamente instalado. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 1 bulto de cemento, 1 bulto de pegapiso y 4 bultos de yeso.		Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO

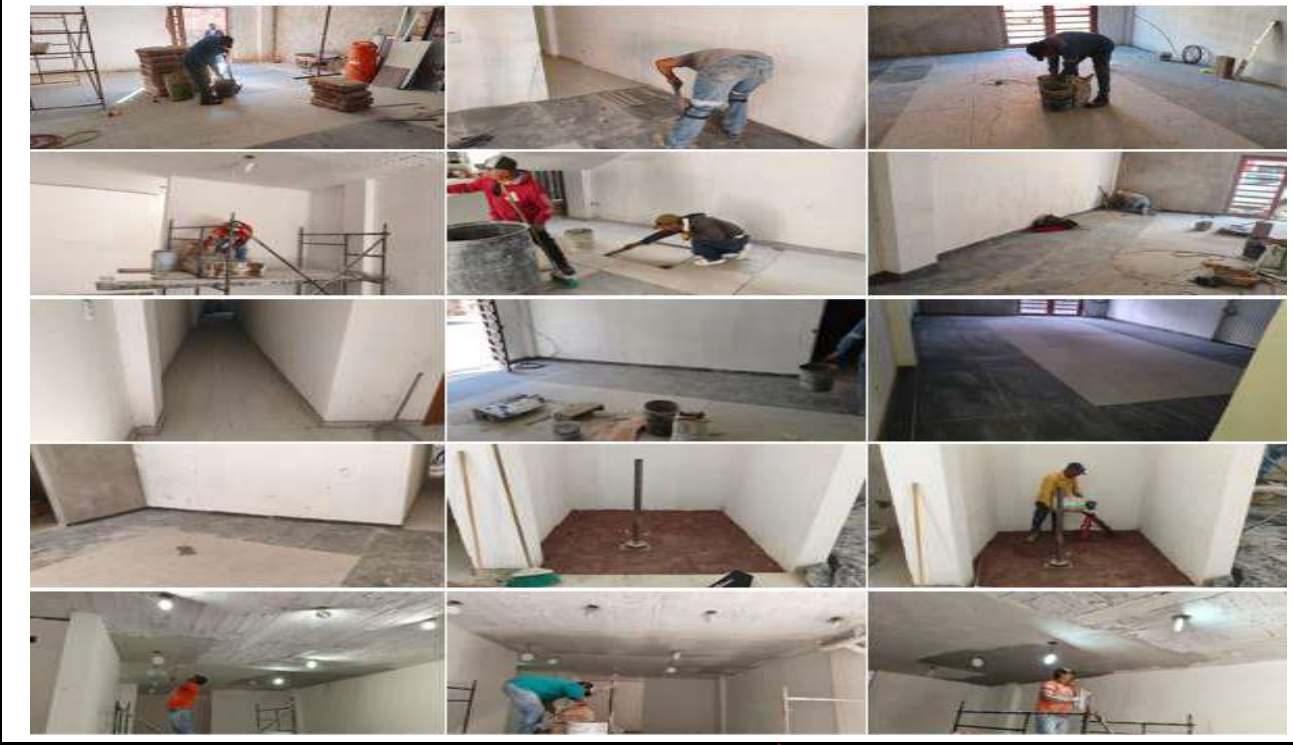

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

martes, 28 de julio de 2026

CUADRILLA SANTIAGO, FRANCISCO, JAVIER, VICTOR.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se concluye la colocación del zoclo en las áreas programadas.

Se finaliza la instalación de los muebles sanitarios, quedando todos los baños instalados.

Se realizan trabajos de perfilado en los baños para preparación de acabados.

Se perfilan dos ventanas y se instalan las ventanas restantes.

Se lleva a cabo la demolición de la banqueta para la construcción de la rampa de acceso.

Se continúa con los trabajos de aplicación de yeso, utilizando un total de 4 bultos de material.

Se realiza la limpieza general del área, retirando el material sobrante y dejando el piso limpio.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 29 de julio de 2026
CUADRILLA	OSCAR BRECEDA		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó el resguardo del material de piso sobrante, almacenándolo en la bodega chica de obra para su conservación y posterior utilización, manteniendo el área de trabajo ordenada y evitando el deterioro del material.		Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 30 de julio de 2026
CUADRILLA	SANTIAGO Y OSCAR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se finalizó el yeso en las áreas programadas. Quedan pendientes los baños. Ya se realizó la limpieza del escombro y, se acudieron a buscar por unas bases para continuar con enyesado en los baños.		Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

viernes, 31 de julio de 2026

CUADRILLA OSCAR, JAVIER, VICTOR Y SANTIAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se finalizaron los enjarres, quedando pendiente únicamente el enjarre grande.
Se finalizó el yeso; únicamente falta el área de la escalera.
Se realizaron los enjarres en los detalles del interior.
Material utilizado:
1 bulto de cemento.
2 bultos de mortero.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 1 de julio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, VICTOR MANUEL , FRANCISCO JAVIER Y FELIPE		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la entrega de materiales al personal del área de Drenajes para apoyar los trabajos en ejecución, consistentes en: 3 bultos de cemento. 1 tramo de tubo de 8 pulgadas de diámetro. 2. Se recibió un suministro de 300 bloques provenientes de Con Los Valles, los cuales fueron descargados y resguardados para su utilización en las obras programadas. 3. Se recibieron 2 piezas de Armex para su incorporación al almacén de materiales. 4. Se recibieron materiales destinados a los trabajos de construcción en Protección Civil, consistentes en: 4 varillas de acero de 3/8". Alambre recocado.		1. Proteccion civil	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 2 de julio de 2026
CUADRILLA	FELIPE Y FRANCISCO JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se avanzó con los trabajos de cimentación mediante el armado de cuatro parrillas para zapatas, utilizando 4 varillas de 3/8" y 2 piezas de Armex como parte del refuerzo. Posteriormente, se realizó el colado de las cuatro zapatas, con un espesor de 20 cm, verificando su correcta alineación, nivelación y recubrimiento del acero para garantizar la calidad de la cimentación. Para la elaboración del concreto se utilizaron los siguientes materiales:		1. Protección civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 3 de julio de 2026
CUADRILLA	MARTIN, FRANCISCO JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se concluyeron los trabajos de cimentación y posteriormente se realizó el cimbrado y colado de 11.80 m lineales de cadena. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 3 bultos de cemento, 0.60 m³ de arena, 0.60 m³ de grava y 2 piezas de Armex.		1. Proteccion civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 27 de julio de 2026

CUADRILLA SERGIO, ROBERTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se adquirió una broca para la perforación de barrenos en el bulevar El Minero.
2. Se realizaron barrenos para la colocación de varillas en el bulevar El Minero.
3. Se efectuó el corte de varillas conforme a las dimensiones requeridas para la obra.
4. Se cortaron tramos de tarima de 30 cm de ancho para el encofrado en el bulevar El Minero.

UBICACIÓN

El minero

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 28 de julio de 2026
CUADRILLA	SERGIO, ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de encofrado en el bulevar El Minero, concluyendo el encofrado del tramo programado e iniciando la colocación del primer tramo de malla electrosoldada. 2. Se entregan 4 bultos de cemento al personal encargado de los trabajos de drenaje para continuar con sus actividades. 3. Finalmente, se recogen dos puertas del Mercado Municipal y se trasladan a la estación para su resguardo e instalación posterior.		1. Boulevard el Minero	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 29 de julio de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, ROBERTO, FRANCISCO, JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos en el bulevar El Minero, donde se llevó a cabo el colado de la base. 2. En la Casa de Día se realizaron las siguientes actividades: *Perfilado de enjarres en ventanas y puertas. *Colado de firme. *Terminación de la rampa de acceso. *Demolición total del muro mediante rotomartillo.		1. Bulevar el Minero 2. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES LUGAR:		SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 29 de julio de 2026
CUADRILLA		TELLEZ, ROBERTO, FRANCISCO, JAVIER, MARTIN	
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. En la calle Zacatecas se realizó el colado de un cuadro de concreto con dimensiones de 8.00 m x 3.40 m y un espesor de 15 cm, para una superficie total de 27.20 m².		3. Calle Zacatecas	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 30 de julio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, FRANCISCO,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de demolición del muro en el área de Casa del Día, conforme al programa de obra. 2. Se realiza la limpieza y preparación de las puertas de acceso en Casa del Día para su conservación y/o trabajos posteriores. 3. Se efectúa la colocación de vitropiso sobre la tapa de la cisterna, asegurando su correcta instalación y acabado. 4. Se lleva a cabo la carga y retiro de escombros generado por las actividades de demolición y construcción, manteniendo el área de trabajo limpia. 5. Se traslada al soldador para realizar el rolado de varillas destinadas a la fabricación e instalación de protecciones para las ventanas en Casa del Día.		1. Casa del día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 31 de julio de 2026
CUADRILLA	SERGIO, ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se preparó el encofrado de la cadena de desplante. 2. Se coló la cadena de desplante. Material utilizado: 4 piezas de Armex. 2 bultos de cemento. 0.2 m³ de arena. 0.2 m³ de grava. 3. La cadena de desplante quedó lista para iniciar el desplante de bloques.		1. Proaño cuarto de pileta	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 1 de julio de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, OSCAR, SAMUEL, SERGIO HDZ Y JAVIER ZAMORA		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el desencofrado (desimbrado) del elemento colado el día anterior en las instalaciones del Tecnológico. Posteriormente, se llevó a cabo nuevamente el cimbrado del área, realizando los ajustes necesarios para dejarla correctamente alineada, nivelada y preparada para el siguiente colado. 2. En las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 60 se llevó a cabo el colado de un firme de 8.00 m de longitud por 2.00 m de ancho, cubriendo una superficie total de 16.00 m². Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 8 bultos de cemento.		1. Tecnologico	
REPORTE FOTOGRAFICO			
       			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN ! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 2 de julio de 2026
CUADRILLA	SERGIO HERNANDEZ, JAVIER ZAVALA		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el colado de una rampa con dimensiones de 8.00 m de longitud por 1.40 m de ancho, llevando a cabo previamente la preparación y nivelación del área. Posteriormente se efectuó el vaciado del concreto, su distribución y acabado, asegurando la pendiente y las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento y resistencia. 2. Se realizó el colado de un tramo de concreto con dimensiones de 7.00 m de longitud por 2.00 m de ancho. Previamente se verificó la preparación y nivelación de la superficie para garantizar un adecuado vaciado.		1. Tecnologico 1. Tecnica 60	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

viernes, 3 de julio de 2026

CUADRILLA TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, VICTOR MANUEL, DANIEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Instituto Tecnológico

Se continúa con los trabajos de construcción, llevando a cabo el colado de una sección de la rampa con dimensiones de 4.00 x 2.00 m.

2. Escuela Secundaria Técnica No. 60

Se continúa con los trabajos de construcción del aula, concluyendo el colado del firme. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 7 bultos de cemento, quedando terminado este concepto de obra.

UBICACIÓN

1. Instituto Tecnológico

2. Escuela Secundaria Técnica No. 60

7 BULTOS

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 6 de julio de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, VICTOR MANUEL, DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo la rehabilitación de caminos mediante trabajos de bacheo en el bulevar El Campesino. Durante la jornada se aplicaron 3 trocas de mezcla asfáltica, empleándose además 100 litros de chapopote y 50 litros de diésel para la ejecución de los trabajos.		1. Bulevar El Campesino	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 7 de julio de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, VICTOR MANUEL, DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de bacheo en el bulevar del Campesino, hasta la altura del vivero. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 4 viajes de asfalto, 40 litros de diésel y 40 litros de liga de solución. 2. En el Tecnológico se realizaron trabajos de preparación para el colado de una superficie de 7.00 m x 2.00 m, efectuando el habilitado de la cimbra y la nivelación del área. Asimismo, se llevó a cabo el acarreo de arena y grava provenientes del mismo Tecnológico.		1. Boulevard el Campesino 2. Tecnologico.	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 8 de julio de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, JUAN MARCOS, DANIEL, OSCAR, SERGIO, VICTOR, ERNESTO, JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a las comunidades de Zaragoza y Ahiladas, donde se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación del camino de acceso a dichas comunidades. Se realizaron trabajos de bacheo utilizando aproximadamente 2 toneladas de asfalto, 50 litros de diésel y 40 litros de emulsión. 2. Se realizó el colado de un firme de banqueteta con dimensiones de 7.00 m × 2.00 m, como parte de los trabajos de adecuación y mejora de las instalaciones.		1. Zaragoza y Ahiladas 2. Tecnologico	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 9 de julio de 2026
CUADRILLA	SERGIO, OSCAR, JUAN MARCOS, VICTOR MANUEL, ERNESTO, DANIEL Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Durante la jornada se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica sobre la carretera que conduce a la comunidad de Charco Blanco, con el propósito de rehabilitar las zonas deterioradas de la carpeta de rodamiento y mejorar las condiciones de circulación. Se emplearon 2.00 toneladas de mezcla asfáltica, 70 litros de diésel para la operación del equipo y la maquinaria, y 80 litros de liga asfáltica, aplicada previamente para favorecer la adherencia entre la superficie existente y la nueva mezcla.		1. Carretera que conduce a Charco Blanco	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 10 de julio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, OSCAR, VICTOR Y ERNESTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en la entrada de la comunidad de Zaragoza, atendiendo las áreas deterioradas de la superficie de rodamiento para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial. Como parte de los trabajos, se efectuó el tratamiento de hiladas para garantizar una adecuada unión entre el pavimento existente y la mezcla asfáltica aplicada. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 2 toneladas de mezcla asfáltica, 50 litros de diésel para la operación del equipo y 50 litros de liga asfáltica para asegurar la correcta adherencia del material.		1. Zaragoza y Ahiladas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 13 de julio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, VICTOR MANUEL, ERNESTO, JAVIER Y DANIEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos de bacheo en el tramo comprendido del Vivero a La Chagüita mediante la aplicación de mezcla asfáltica. Para la ejecución de la actividad se utilizaron 3.00 m³ de mezcla asfáltica, 40 litros de diésel y 40 litros de emulsión asfáltica (liga).			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 14 de julio de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, OSCAR, DANIEL Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo el bacheo de la carretera en el tramo comprendido del Vivero al restaurante El Chagüita. Asimismo, se iniciaron los trabajos de bacheo en el libramiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** PORFIRIO ROSALES**FECHA:**

miércoles, 15 de julio de 2026

CUADRILLA TELLEZ, DANIEL Y JAVIER**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se realizó el mantenimiento del área de carga y descarga de carnes en el Rastro Municipal. Como parte de los trabajos, se utilizó una camioneta de asfalto para el acondicionamiento y nivelación del área, con el fin de mejorar las condiciones de operación y tránsito.

2. Se realizaron trabajos de bacheo frente a Agua Brisa, debido a que la vialidad presentaba un hundimiento que afectaba la circulación vehicular y representaba un riesgo para los usuarios. Los trabajos consistieron en el relleno y rehabilitación del área afectada para restablecer condiciones adecuadas de tránsito y seguridad.

UBICACIÓN

1. Rastro Municipal

2. Frente Agua Brisa

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 17 de julio de 2026
CUADRILLA	DANIEL, TELLEZ, ISAAC		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se llevó a cabo el bacheo del tramo comprendido desde la salida a Chalchihuites hasta el Banco del Bienestar, con el propósito de mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento. Para la ejecución de estos trabajos se utilizaron 2 viajes de mezcla asfáltica.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: JORGE ROJERO CASTAÑON

FECHA:

martes, 7 de julio de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó recorrido de identificación de fallas en la carpeta asfáltica. Se observó desprendimiento de carpeta en orilla, baches aislados y desgaste superficial, Se ejecutó limpieza de baches, retiro de material suelto y se aplicó riego de liga. Se colocó mezcla asfáltica en baches de forma manual, se llevó a cabo nivelación y compactación final. Se realizó limpieza de obra y se liberó circulación.

UBICACIÓN

1. San Juan de la Tapia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	miércoles, 8 de julio de 2026
HORARIO	8:00 AM - 4:00 PM		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se iniciaron los trabajos de rehabilitación y bacheo en la comunidad de San Juan de la Tapia. Como parte de las actividades, se realizó el acarreo de mezcla asfáltica mediante un camión tipo volteo con capacidad de 7 m³, efectuando 1 viaje. Para el desarrollo de estas actividades, la unidad inició la jornada con 50 litros de diésel.		UBICACIÓN 1. San Juan de la Tapia	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: JORGE ROJERO CASTAÑÓN

FECHA:

viernes, 10 de julio de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa, por segundo día consecutivo, con los trabajos de rehabilitación y bacheo en el camino de la comunidad de San Juan de la Tapia. Durante la jornada se dio seguimiento a las labores de reparación de la carpeta asfáltica mediante la ejecución de bacheo en los tramos programados, conforme al avance establecido.

UBICACIÓN

1. San Juan de la Tapia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	lunes, 13 de julio de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de bacheo en el camino que conduce a la comunidad de San Juan de la Tapia. Durante la jornada se realizó un viaje de mezcla asfáltica (Asphaltyp) para la ejecución de los trabajos programados. Las labores de rehabilitación se llevan a cabo debido al deterioro que presenta la superficie de rodamiento, la cual se encuentra en malas condiciones, afectando la circulación y el tránsito seguro de la ciudadanía.		1. San Juan de la Tapia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	martes, 14 de julio de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continúa con los trabajos de bacheo y rehabilitación del camino que conduce a la comunidad de San Juan de la Tapia. Durante la jornada fue necesario realizar el relleno de las zonas más deterioradas con material de tierra, debido a que los baches presentan una profundidad considerable, lo que impide la aplicación directa de la mezcla asfáltica. Estas acciones tienen como finalidad proporcionar una base más estable para la rehabilitación del camino y mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios.		UBICACIÓN 1. San Juan de la Tapia	
REPORTE FOTOGRAFICO			
 			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	jueves, 16 de julio de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevaron a cabo trabajos de bacheo en la cabecera municipal de Sombrerete, sobre la salida hacia Chalchihuites. Como parte de las actividades, también se realizó la limpieza de las canaletas ubicadas en los costados de la carretera, con el propósito de mejorar el desalojo de aguas pluviales y conservar en mejores condiciones la vialidad. Para la ejecución de los trabajos fue necesario el acarreo y utilización de 2 viajes de tierra, empleada en el relleno y nivelación de las áreas intervenidas.		UBICACIÓN Carretera salida a Chalchihutes	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
			
			
			
