



ESTIMACIÓN: SUMEN FINIQUI HOJA 1 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2016-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
EJERCICIO: FISCAL 2021.

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.	1	LOTE	\$ 321,470.00	\$ 321,470.00	
		TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO		\$ 321,470.00		
						ESTIMACIÓN \$277,129.31 IVA 16% \$44,340.69 SUBTOTAL \$321,470.00 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO: \$ 96,441.00
AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 96,441.00
AMORTIZADO EN ESTA EST.: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR \$ -

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:

ESTIMADO A LA FECHA: \$ 321,470.00
ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00
SALDO POR ESTIMAR \$ -

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.

CONTRATISTA

CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 3 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021



OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EJERCICIO FISCAL 2021.

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-533	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA SUBURBANA CON FOCO LEDS DE 50 WATTS 120 VOLTS. INCLUYE: BRAZO DE 1.5 MTS. ABRAZADERA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.		POSTE 3					1	1.00		
			POSTE 4					1	1.00		
			POSTE 5					1	1.00		
			POSTE 7					1	1.00		
			POSTE 8					1	1.00		
			POSTE 12					1	1.00		
			POSTE 16					1	1.00		
			POSTE 18					1	1.00		
			POSTE 19					1	1.00		
			POSTE 21					1	1.00		
			POSTE 23					1	1.00		
			POSTE 34					1	1.00		
			POSTE 35					1	1.00		
			POSTE 36					1	1.00		
			POSTE 37					1	1.00		
			POSTE 39					1	1.00		
			POSTE 40					1	1.00		
			POSTE 41					1	1.00		
			POSTE 42					1	1.00		
			POSTE 43					1	1.00		
			POSTE 44					1	1.00		
			POSTE 45					1	1.00		
			POSTE 46					1	1.00		
			POSTE 47					1	1.00		
			POSTE 54					1	1.00		
			POSTE 56					1	1.00		
			POSTE 61					1	1.00		
			POSTE 64					1	1.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 4 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021



OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
			POSTE 65					1	1.00		
			POSTE 67					1	1.00		
			POSTE 68					1	1.00		
			POSTE 70					1	1.00		
			POSTE 73					1	1.00		
			POSTE 74					1	1.00		
			POSTE 75					1	1.00		
			POSTE 76					1	1.00		
			POSTE 80					1	1.00		
			POSTE 81					1	1.00		
			POSTE 82					1	1.00		
			POSTE 83					1	1.00		
			POSTE 87					1	1.00		
			POSTE 88					1	1.00		
			POSTE 90					1	1.00		
			POSTE 95					1	1.00		
			POSTE 96					1	1.00		
			POSTE 98					1	1.00		
			POSTE 99					1	1.00		
			POSTE 100					1	1.00		
			POSTE 101					1	1.00		
			POSTE 104					1	1.00		
			POSTE 105					1	1.00		
			POSTE 107					1	1.00		
			POSTE 111					1	1.00		
			POSTE 116					1	1.00		
			POSTE 124					1	1.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 5 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021



OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
			POSTE 126					1	1.00		
			POSTE 127					1	1.00		
			POSTE 143					1	1.00		
			POSTE 146					1	1.00		
			POSTE 147					1	1.00		
			POSTE 148					1	1.00		
			POSTE 156					1	1.00		
			POSTE 157						0.00		
			POSTE 158						0.00		
			POSTE 161						0.00		
			TOTAL						62.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: ESUMEN FINIQUIT HOJA 6 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021


RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
AYUNTAMIENTO 2018-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

CROQUIS DE OBRA

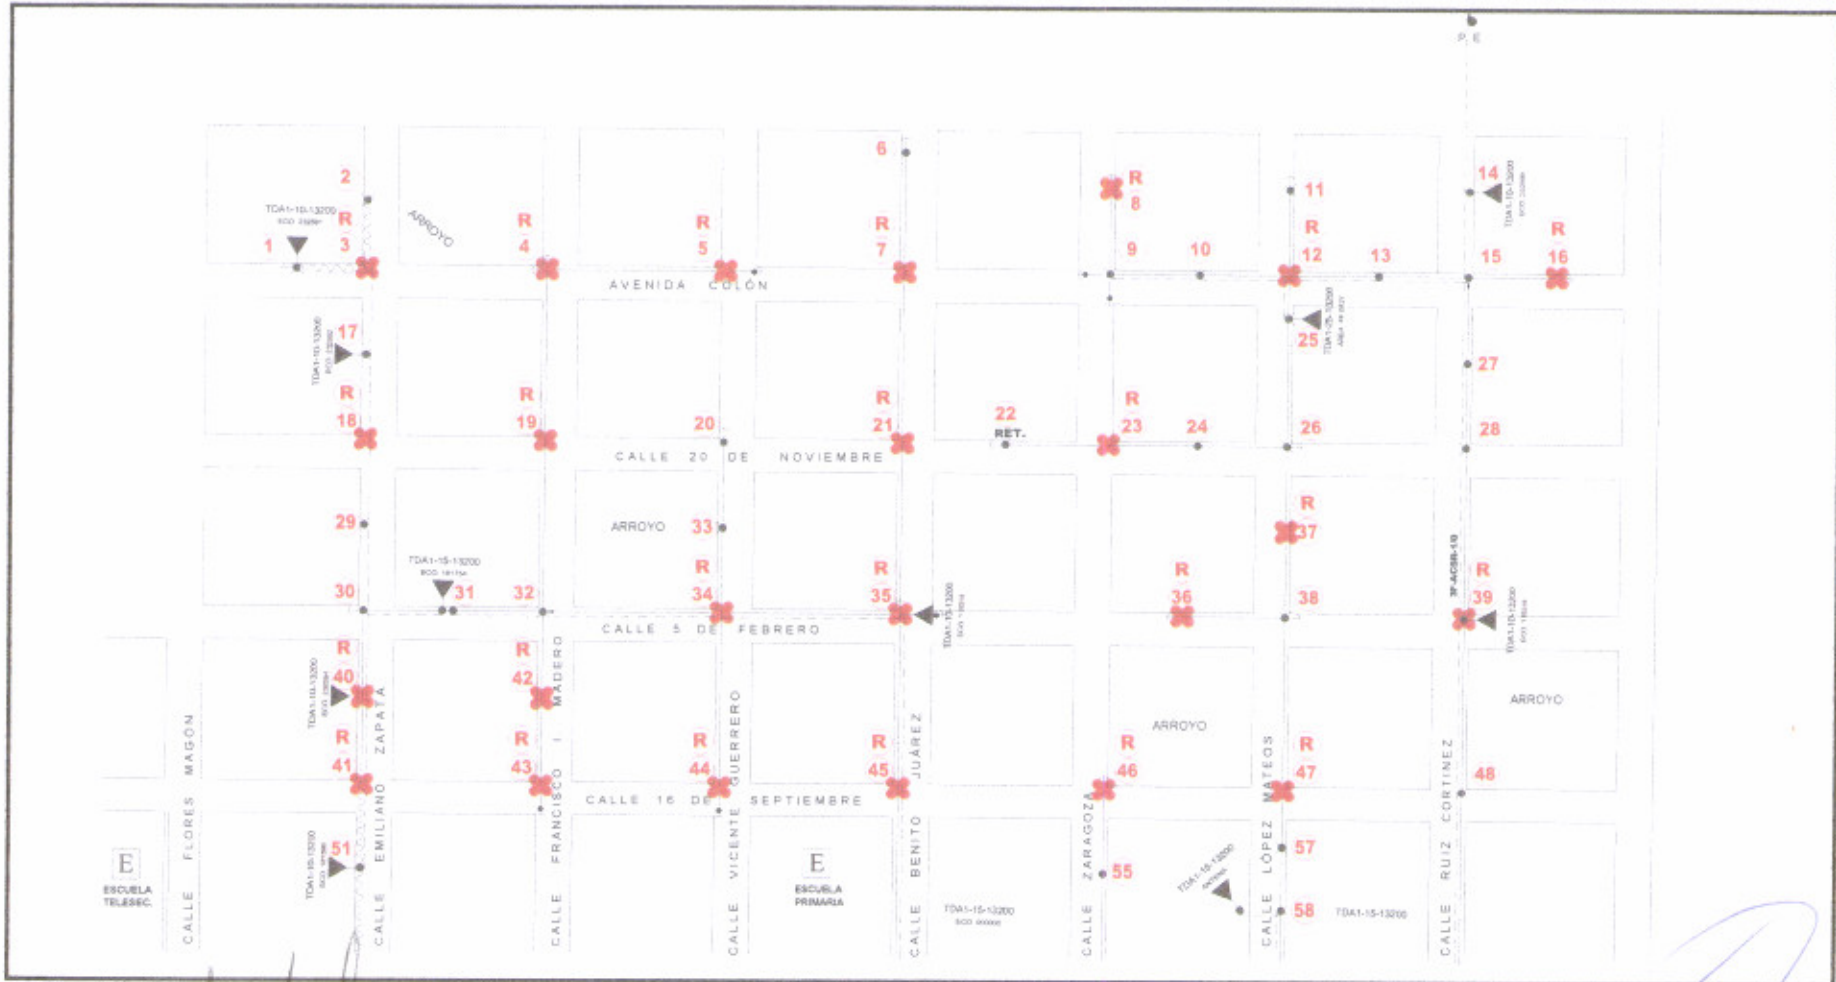

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: ESUMEN FINIQUIT HOJA 7 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DD5-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO




SOMBRETERE
MAYOR AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EJERCICIO FISCAL 2021.

CROQUIS DE OBRA

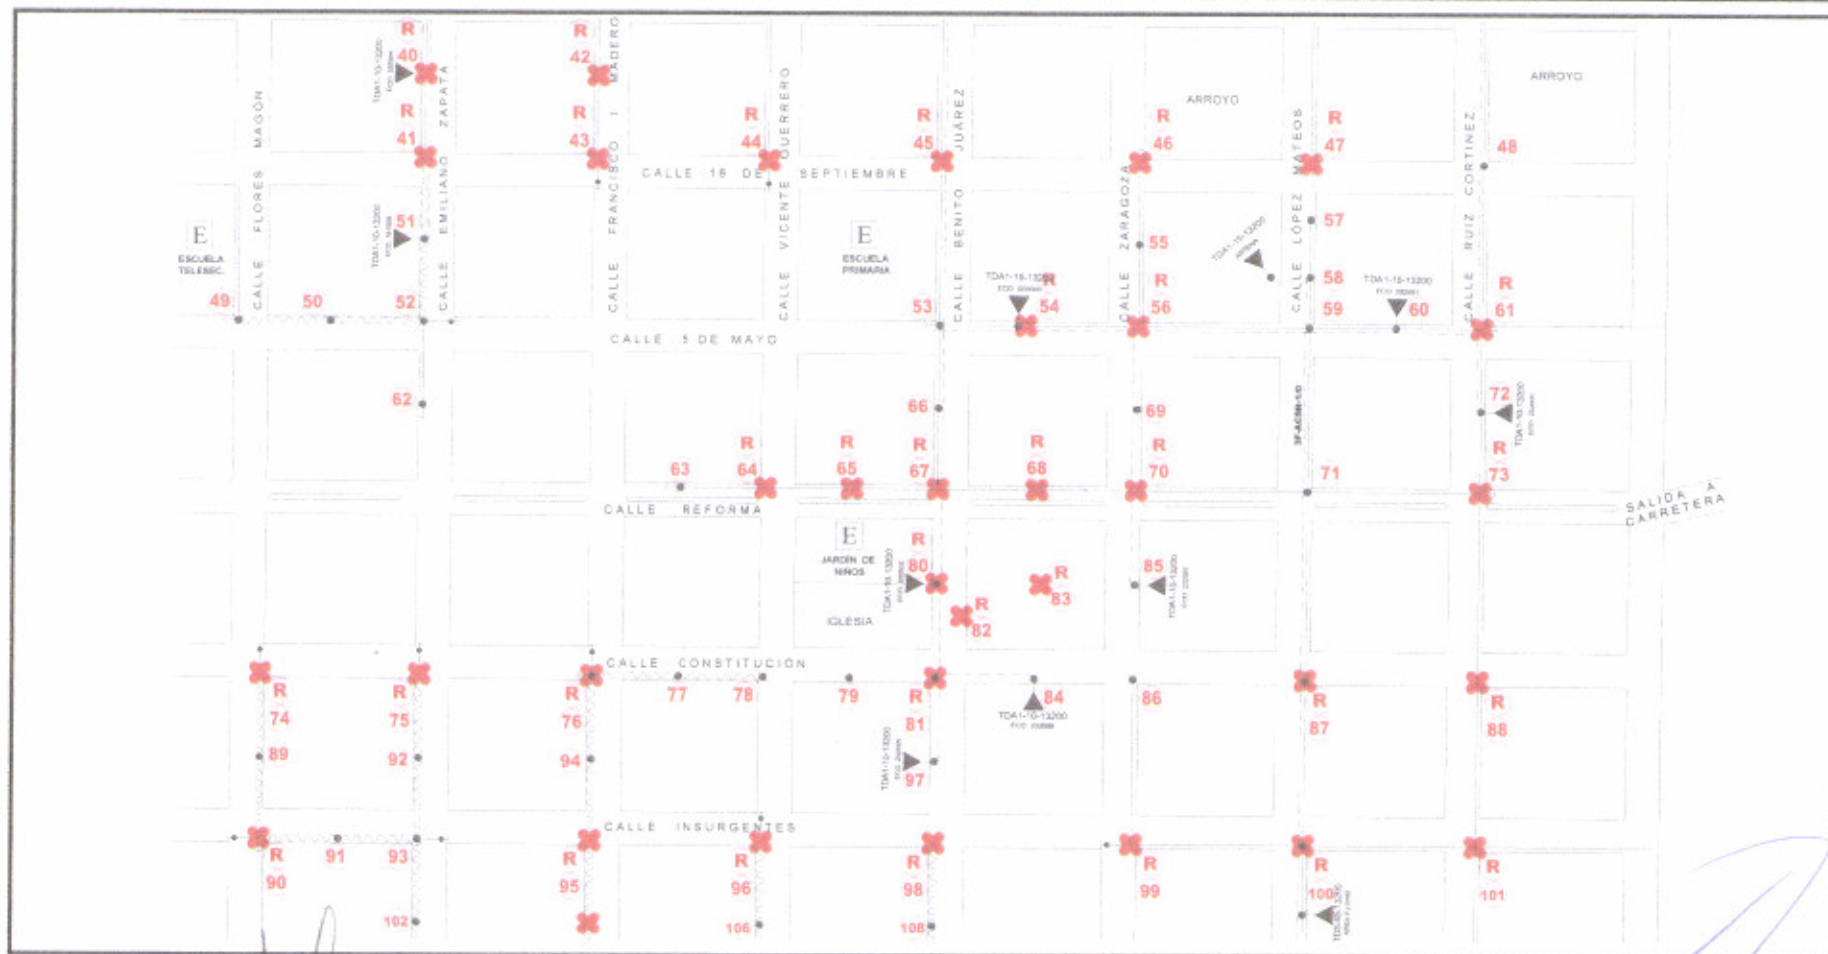

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: ESUMEN FINIQUIT HOJA 8 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CALLE DE LA CORREGIDORA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

CROQUIS DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 9 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
AYUNTAMIENTO 2018-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 10 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTOS CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
Fuerza y Coraje

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 11 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 12 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2018-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA



ESTIMACIÓN: RESUMEN FINIQUITO HOJA 13 DE 13
PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 2021
AL 12 DE ABRIL DE 2021
MONTO CONTRATADO: \$ 321,470.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-003
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO



SOMBRETERE
AYUNTAMIENTO 2018-2021

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ.
UBICACIÓN: BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL.
EJERCICIO FISCAL 2021.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. VÍCTOR CRUZ CRUZ.
CONTRATISTA
