



ESTIMACIÓN: UNO HOJA 1 DE 11
PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).
UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2023

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).	1	LOTE	\$0.00	\$ -	
		TOTAL	FINIQUITO		\$0.00	
						FINIQUITO \$0.00 IVA 16% \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 DEDUCCIONES: AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 TOTAL \$0.00 SUBTOTAL \$0.00 IVA 16% \$0.00 TOTAL \$0.00

ANTICIPO OTORGADO: \$131,585.47
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$131,585.47
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR \$ -

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:
ESTIMADO A LA FECHA: \$ 438,618.23
ESTA ESTIMACIÓN: \$ -
SALDO POR EJERCER \$ -

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BÉNÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA.
CORPORATIVO COMERCIAL REMATE S. DE R.L. DE C.V.

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
1	Extracción de equipo de bombeo existente tipo sumergible dañado para revisión general del daño	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
2	Instalación de equipo de bombeo en calidad de renta por un periodo máximo de 15 - 21 días	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
3	Renta de equipo de bombeo tipo sumergible por un periodo máximo de 15 días	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,793.10	\$ -	\$ 11,793.10
4	Bomba sumergible marca ALTAMIRA, con descarga por medio de válvula check de 1 1/4" de diámetro, Mod. KOR 1 2R75-56 (6") + MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELÉCTRIC, de 7.5 h.p., 2 f., 230 v., para elevar un caudal de 1.2 l.p.s., de agua limpia, fría, neutra, químicamente no agresiva, libre de arenas y gases, contra una Carga Dinámica Total de 230 mca.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 63,627.09	\$ -	\$ 63,627.09
5	Caja de control monofásica para 7.5 hp, monofásica, Franklin Electric.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,550.86	\$ -	\$ 11,550.86
6	Columna de bombeo en tubo de acero galvanizado de 1-1/2" de diámetro, con rosca y cople.	mts.	224.0000	224.0000	0.0000	224.0000	\$ 378.98	\$ -	\$ 84,892.14
7	Reducción galvanizada de niple de 1-1/4 a cople de 1-1/2"	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 990.22	\$ -	\$ 990.22
8	Cable sumergible calibre 3 X 6 awg., 1000 V	mts.	234.0000	234.0000	0.0000	234.0000	\$ 239.94	\$ -	\$ 56,145.88
9	Poliducto reforzado de 1" de diámetro para guía de sonda	mts.	234.0000	234.0000	0.0000	234.0000	\$ 12.50	\$ -	\$ 2,925.00
10	Brida de fierro fundido, roscable de 2" de diámetro	pza.	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	\$ 849.15	\$ -	\$ 1,698.29
11	Tornillo galvanizado de 5/8 x 3"	pza.	16.0000	16.0000	0.0000	16.0000	\$ 21.00	\$ -	\$ 336.00

SUMA HOJA No. 01

\$ - \$ 253,788.17

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS.
 DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BÉNTEZ HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA
 CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: UNO HOJA 3 DE 11
PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 438,638.23
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).
UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: 0
EJERCICIO FISCAL 2023

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
12	Tuerca Galvanizada de 5/8	pza.	16.0000	16.0000	0.0000	16.0000	\$ 12.43	\$ -	\$ 198.48
13	Empaque de neopreno para brida de 2"	pza.	4.0000	4.0000	0.0000	4.0000	\$ 97.19	\$ -	\$ 388.76
14	Medidor de flujo bridado de 2" de diámetro, con data logger.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 7,727.12	\$ -	\$ 7,727.12
15	Modificación al tren de descarga, incluye cortes, coples, niples, soldadura, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta puesta en marcha.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 7,327.59	\$ -	\$ 7,327.59
16	Válvula de compuerta de tipo volante vastago fijo de 2"	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 7,899.86	\$ -	\$ 7,899.86
17	Válvula check fierro fundido de 2"	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 7,759.48	\$ -	\$ 7,759.48
18	Equipo de cloración completo para un gasto de 2.5 lps, incluye tanque, bomba dosificadora, canalizaciones, conexiones, válvula check, herramienta, equipo y mano de obra.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 29,274.73	\$ -	\$ 29,274.73
19	Tapa sanitaria en placa de 1/4" de espesor para ademe de 10" de diámetro.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 2,262.03	\$ -	\$ 2,262.03
20	Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión para transformador monofásico de 10 kva, incluye, tubos, conectores, coples, mufas, tubo sapa, cable thw cal. 6, base de medición 5 terminales -100 amperes, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta puesta en marcha.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 14,394.93	\$ -	\$ 14,394.93
21	Extracción de equipo de bombeo existente tipo sumergible para remplazo de columna de bombeo nueva en acero galvanizado y bomba sumergible.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
22	Instalación de equipo de bombeo sumergible con columna de acero galvanizado nueva y bomba nueva.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
23	Letrero alusivo de obra a base de ptr de 2", de 3.0 mts de longitud x 2.4 mts de altura.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 15,086.21	\$ -	\$ 15,086.21
24	Murete para alojar equipos de medición, arrancador y equipo de cloración a base de block hueco, de 1.2 mts de longitud x 2 @ mts de alto x 0.75 mts de profundo, incluye puertas de acero para cubrir equipos, herramienta, equi y mano de obra.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 8,824.14	\$ -	\$ 8,824.14
25	Brocal de pozo fabricado en concreto fc: 250 kg/cm2, de 1.0 mt de largo x 1 @ de ancho x 0.3 mts de alto.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 3,362.07	\$ -	\$ 3,362.07

SUMA HOJA No. 02

\$ - \$ 124,332.99

FINIQUITO


\$

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BÉNTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FARRÍA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.


 CORPORATIVO COMERCIAL REMATE, S. DE R. L. DE C. V.	ESTIMACIÓN:	UNO	4 DE 11	FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).					
	PERIODO:	DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023			UBICACIÓN:	FELIPE ÁNGELES.					
	MONTO CONTRATADO:	\$	438,618.23		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.					
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008			PROGRAMA:	0					
FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2023				EJERCICIO FISCAL 2023						
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
1	Extracción de equipo de bombeo existente tipo sumergible dañado para revisión general del daño		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
2	Instalación de equipo de bombeo en calidad de renta por un periodo máximo de 15 - 21 días		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
3	Renta de equipo de bombeo tipo sumergible por un periodo máximo de 15 días		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
4	Bomba sumergible marca ALTAMIRA, con descarga por medio de válvula check de 1-1/4" de diámetro, Mod KOR 12R75-56 (6") + MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELÉCTRIC, de 7.5 h.p., 2 f., 230 v., para elevar un caudal de 12 l.p.s. de agua limpia, fría, neutra, químicamente no agresiva, libre de arenas y gases, contra una Carga Dinámica Total de 230 mca		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		LOTE
5	Caja de control monofásica para 7.5 hp, monofásica, Franklin Electric		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
6	Columna de bombeo en tubo de acero galvanizado de 1-1/2" de diámetro, con rosca y cople		POZO					244		244	LOTE
								TOTAL	244.00		LOTE
7	Reducción galvanizada de niple de 1-1/4 a cople de 1-1/2"		POZO					100		1	METRO
								TOTAL	1.00		METRO
8	Cable sumergible calibre 3 X 6 awg, 1000 V		POZO					234.00		234	METRO
								TOTAL	234.00		METRO
9	Polducto reforzado de 1" de diámetro para guía de sonda		POZO					234		234	LOTE
								TOTAL	234.00		LOTE
10	Brida de hierro fundido, roscable de 2" de diámetro		POZO					2		2	LOTE
								TOTAL	2.00		LOTE



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.



LIC. NANCY ANGELICA MÁRQUEZ FABRE,
CORPORATIVO COMERCIAL REMATE, S. DE R. L. DE C. V.



ESTIMACIÓN: UNO 5 DE 11
PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023
MONT0 CONTRATADO: \$ 438,618.23
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).

UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
11	Tornillo galvanizado de 5/8 x 3"		POZO					16		16	LOTE
								TOTAL	16.00		LOTE
	Tuerca Galvanizada de 5/8		POZO					16		16	
								TOTAL	16.00		0
	Empaque de neopreno para bnda de 2"		POZO					4		4	
								TOTAL	4.00		0
	Medidor de flujo bndado de 2" de diámetro, con data logger		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Modificación al tren de descarga, incluye cortes, coples, niples, soldadura, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta puesta en marcha		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Válvula de compuerta de tipo volante vástago fijo de 2"		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Válvula check fierro fundido de 2"		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Equipo de cloración completo para un gasto de 2.5 lps, incluye tanque, bomba dosificadora, canalizaciones, conexiones, válvula check, herramienta, equipo y mano de obra		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Tapa sanitaria en placa de 1/4" de espesor para ademe de 10" de diametro		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0
	Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión para transformador monofásico de 10 kva, incluye, tubos, conectores, coples, mufas, tubo sapa, cable 6 cal 6 base de medición 5 terminales - 100 amperes, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta puesta en marcha		POZO					1		1	
								TOTAL	1.00		0

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉNAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO BLANCO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARRQUEZ FARRER
CORPORATIVO COMERCIAL Rमार S. DE R.L. DE C.V.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ CARRERA
CORPORATIVO COMERCIAL REMAKE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: 7 DE 11

PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAS/MUN-23-AGUA-008

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).


UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023

CROQUIS DE OBRA

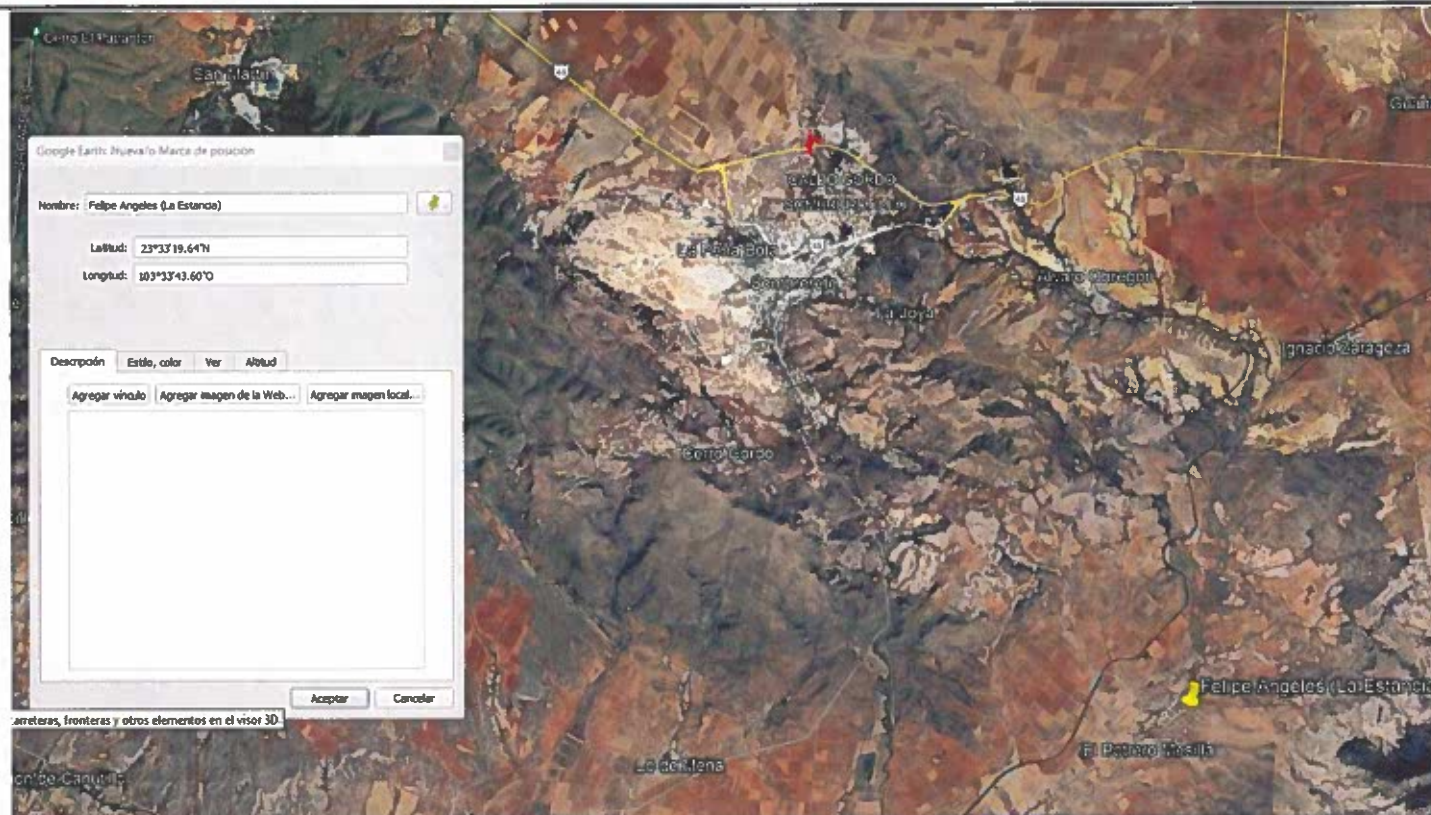

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ PABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: UNO

8 DE 11

PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).

UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ FABELA.
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: UNO 9 DE 11

PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).


UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: 0


EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

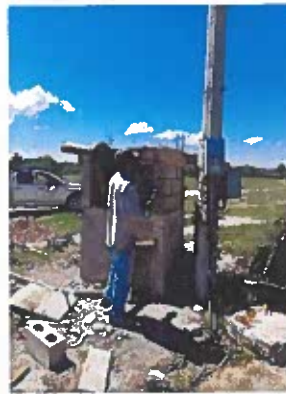


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA.
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: UNO 10 DE 11

PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).

UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: 0


REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA.
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: UNO 11 DE 11

PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 438,618.23

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FASIMUN-23-AGUA-008

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2023

FINIQUITO

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA).

UBICACIÓN: FELIPE ÁNGELES.

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: 0

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA.
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.
