SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 16

PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 12 DE AGOSTO DE 2021

MONTO CONTRATADO: $ 145,945.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,

UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO: FISCAL 2021

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON, EJIDO INDEPENDENCIA, SOMBRERETE, ZACATECAS	1	LOTE	$ 145,945.00	$ 145,945.00
				TOTAL RESUMEN DE FINIQUITO	$ 145,945.00

OBSERVACIONES

ESTIMACION	$125,814.66
IVA 16%	$20,130.34
SUBTOTAL	$145,945.00

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO	$0.00
TOTAL	$0.00

SUBTOTAL	$0.00
IVA 16%	$0.00
TOTAL	$0.00

ANTICIPO OTORGADO:	$	43,783.50
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	$	43,783.50
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:

ESTIMADO A LA FECHA:	$	145,945.00
ESTA ESTIMACIÓN:		$0.00
SALDO POR ESTIMAR	$	-

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 2 DE 16	
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO:	FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	12,390.00	-	12,390.00
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	760.00	-	3,040.00
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	300.00	-	1,200.00
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	16.00	16.00	-	16.00	130.00	-	2,080.00
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	18.00	18.00	-	18.00	350.00	-	6,300.00
04-ELECT-023	SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	3.00	3.00	-	3.00	700.00	-	2,100.00
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	800.00	-	800.00
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	600.00	-	1,200.00
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	300.00	-	300.00
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	350.00	-	350.00
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	490.00	-	490.00
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	135.00	-	135.00

SUMA HOJA No. 1	-	30,385.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 16
PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021
AL 12 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 145,945.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 3/8:INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	25.00	25.00	-	25.00	100.00	-	2,500.00
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,400.00	-	1,400.00
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	4.00	4.00	-	4.00	135.00	-	540.00
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	26.00	26.00	-	26.00	130.00	-	3,380.00
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	24.00	24.00	-	24.00	135.00	-	3,240.00
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	125.00	125.00	-	125.00	260.00	-	32,500.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	150.00	150.00	-	150.00	50.00	-	7,500.00
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	1.00	1.00	-	1.00	350.00	-	350.00
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	1,200.00	-	1,200.00
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	kg	5.00	5.00	-	5.00	750.00	-	3,750.00
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	600.00	-	1,200.00
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	16,950.00	-	33,900.00
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	2.00	2.00	-	2.00	850.00	-	1,700.00
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	10.00	10.00	-	10.00	80.00	-	800.00
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	pza	1.00	1.00	-	1.00	7,600.00	-	7,600.00

SUMA HOJA No. 2 - 101,560.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 16
PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021
AL 12 DE AGOSTO DE 2021
PERIODO: $ 145,945.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO: FISCAL 2021

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PRESUPUESTADO	HASTA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO		DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO	pza	1.00	1.00	-	1.00	3,500.00	-	3,500.00
04-ELECT-297	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pza	1.00	1.00	-	1.00	10,500.00	-	10,500.00

SUMA HOJA No. 3	-	14,000.00
RESUMEN DE FINIQUITO	$ -	145,945.00

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	H[illegible] DE	16
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUIT[illegible]

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL		1.00		pza
04-ELECT-019	SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					4.00	4.00		
							TOTAL		4.00		pza
04-ELECT-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					4.00	4.00		
							TOTAL		4.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 6 DE	16
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					16.00	16.00		
							TOTAL			16.00	pza
04-ELECT-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					18.00	18.00		
							TOTAL			18.00	pza
04-ELECT-023	SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					3.00	3.00		
							TOTAL			3.00	pza
04-ELECT-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL			1.00	pza
04-ELECT-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2.00	2.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 7 DE	16
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
							TOTAL		2.00		pza
04-ELECT-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL		1.00		pza
04-ELECT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL		1.00		pza
04-ELECT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL		1.00		pza
04-ELECT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL		1.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 16
PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2021
AL 12 DE AGOSTO DE 2021
MONTO CONTRATADO: $ 145,945.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009
FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN: EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 3/8:INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1		25.00				25.00		
							TOTAL			25.00	ml
04-ELECT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL			1.00	pza
04-ELECT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					4.00	4.00		
							TOTAL			4.00	pza
04-ELECT-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					26.00	26.00		
							TOTAL			26.00	pza
04-ELECT-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					24.00	24.00		

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021	ESTIMACIÓN: FINIQUITO	HOJA 9 DE 16	RESUMEN DE FINIQUITO	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
	PERIODO: DEL	02 DE AGOSTO DE 2021		UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
	MONTO CONTRATADO: $	145,945.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009			
	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2021		EJERCICIO	FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
							TOTAL			24.00	pza
04-ELECT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1		125.00				125.00		
							TOTAL			125.00	ml
04-ELECT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1		150.00				150.00		
							TOTAL			150.00	ml

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 10 DE	16	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021		UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009			
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021		EJERCICIO	FISCAL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1						1.00		
								TOTAL		1.00	kg
04-ELECT-043	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1						5.00		
								TOTAL		5.00	pza
04-ELECT-045	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					2.00	2.00		
								TOTAL		2.00	kg

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 11 DE	16
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-046	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1					2.00	2.00		
							TOTAL			2.00	pza
04-ELECT-050	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1					2.00	2.00		
							TOTAL			2.00	pza
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1					2.00	2.00		
							TOTAL			2.00	pza
04-ELECT-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. Y EQUIPO		POSTE 1					10.00	10.00		
							TOTAL			10.00	pza
04-ELECT-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
							TOTAL			1.00	pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 12 DE	16	OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021		UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009				
FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2021			EJERCICIO	FISCAL 2021

RESUMEN DE FINIQUITO

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLÚMEN EJECUTADO		UNIDAD
		CALLE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-056	PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO		POSTE 1		460.00			1.00	1.00		
						TOTAL			1.00		pza
04-ELECT-297	LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO		POSTE 1					1.00	1.00		
						TOTAL			1.00		pza

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 13 DE [redacted] 16	
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:		$ 145,945.00	
No. DE COTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO [redacted]

SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA

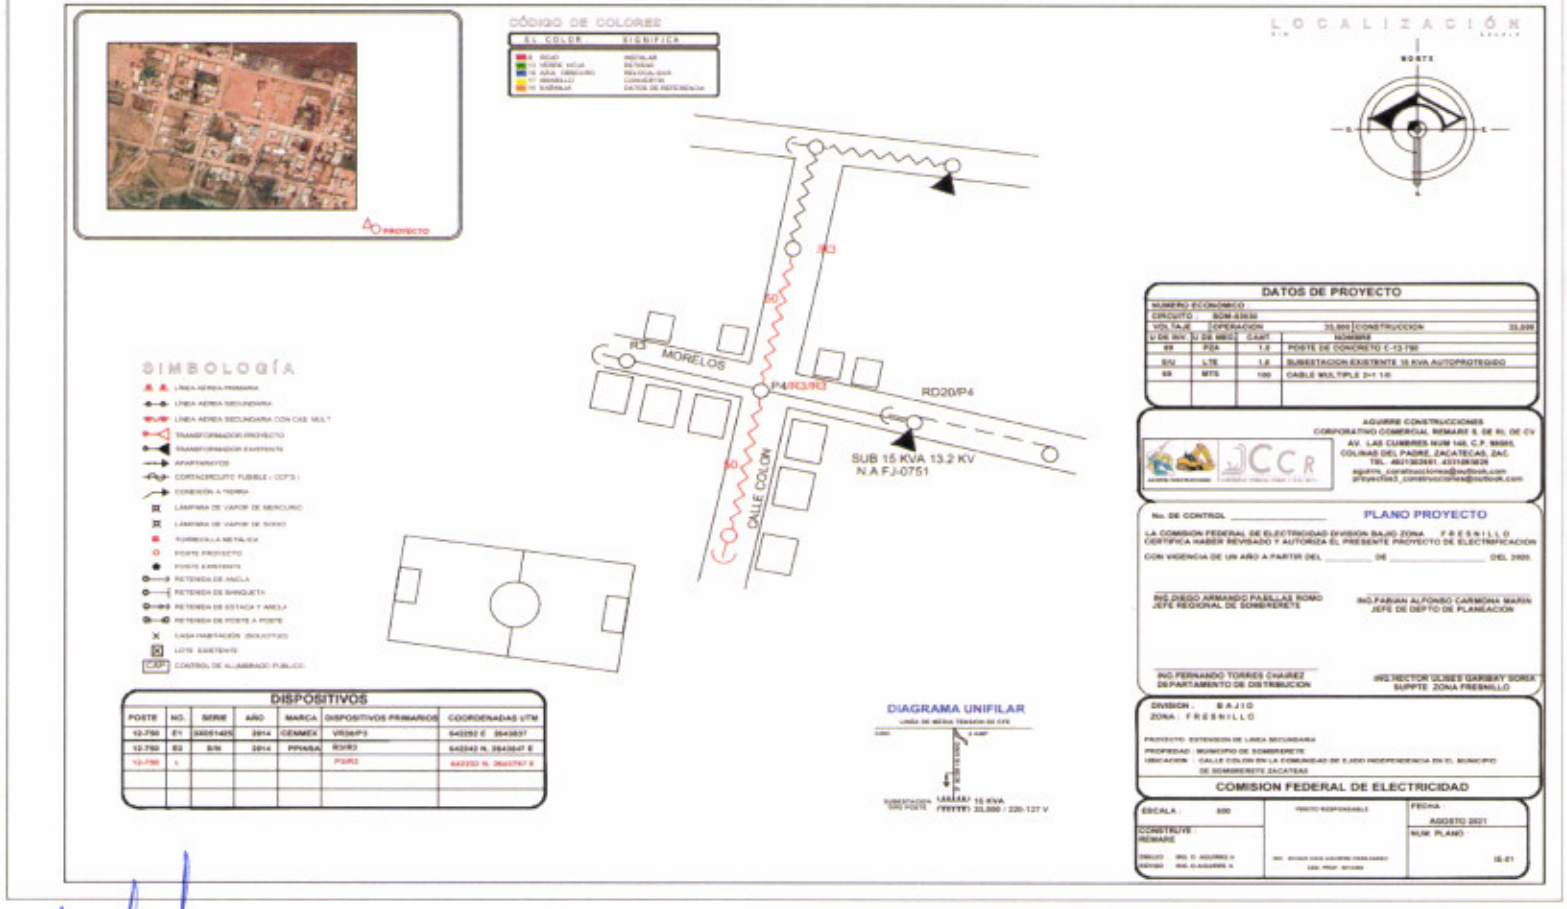

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 14	16
PERIODO:	DEL	02 DE AGOSTO DE 2021	
	AL	12 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO CONTRATADO:	$	145,945.00	
No. DE CONTRATO:		MSO-DDS-FISM-21-ELECT-009	
FECHA:		13 DE AGOSTO DE 2021	

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON,
UBICACIÓN:	EJIDO INDEPENDENCIA
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO	FISCAL 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

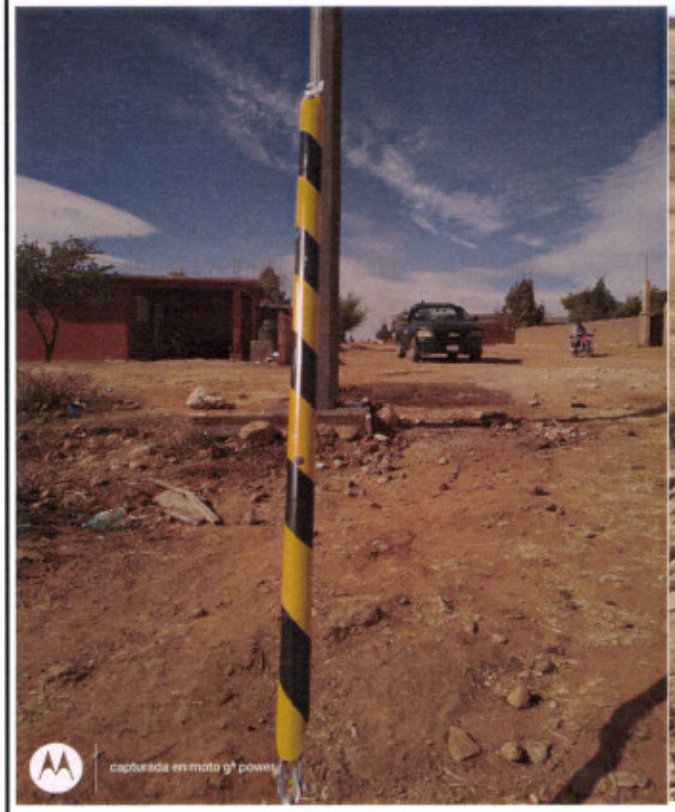

ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
CONTRATISTA
